AFFICHÉ
LE 22/12/2025

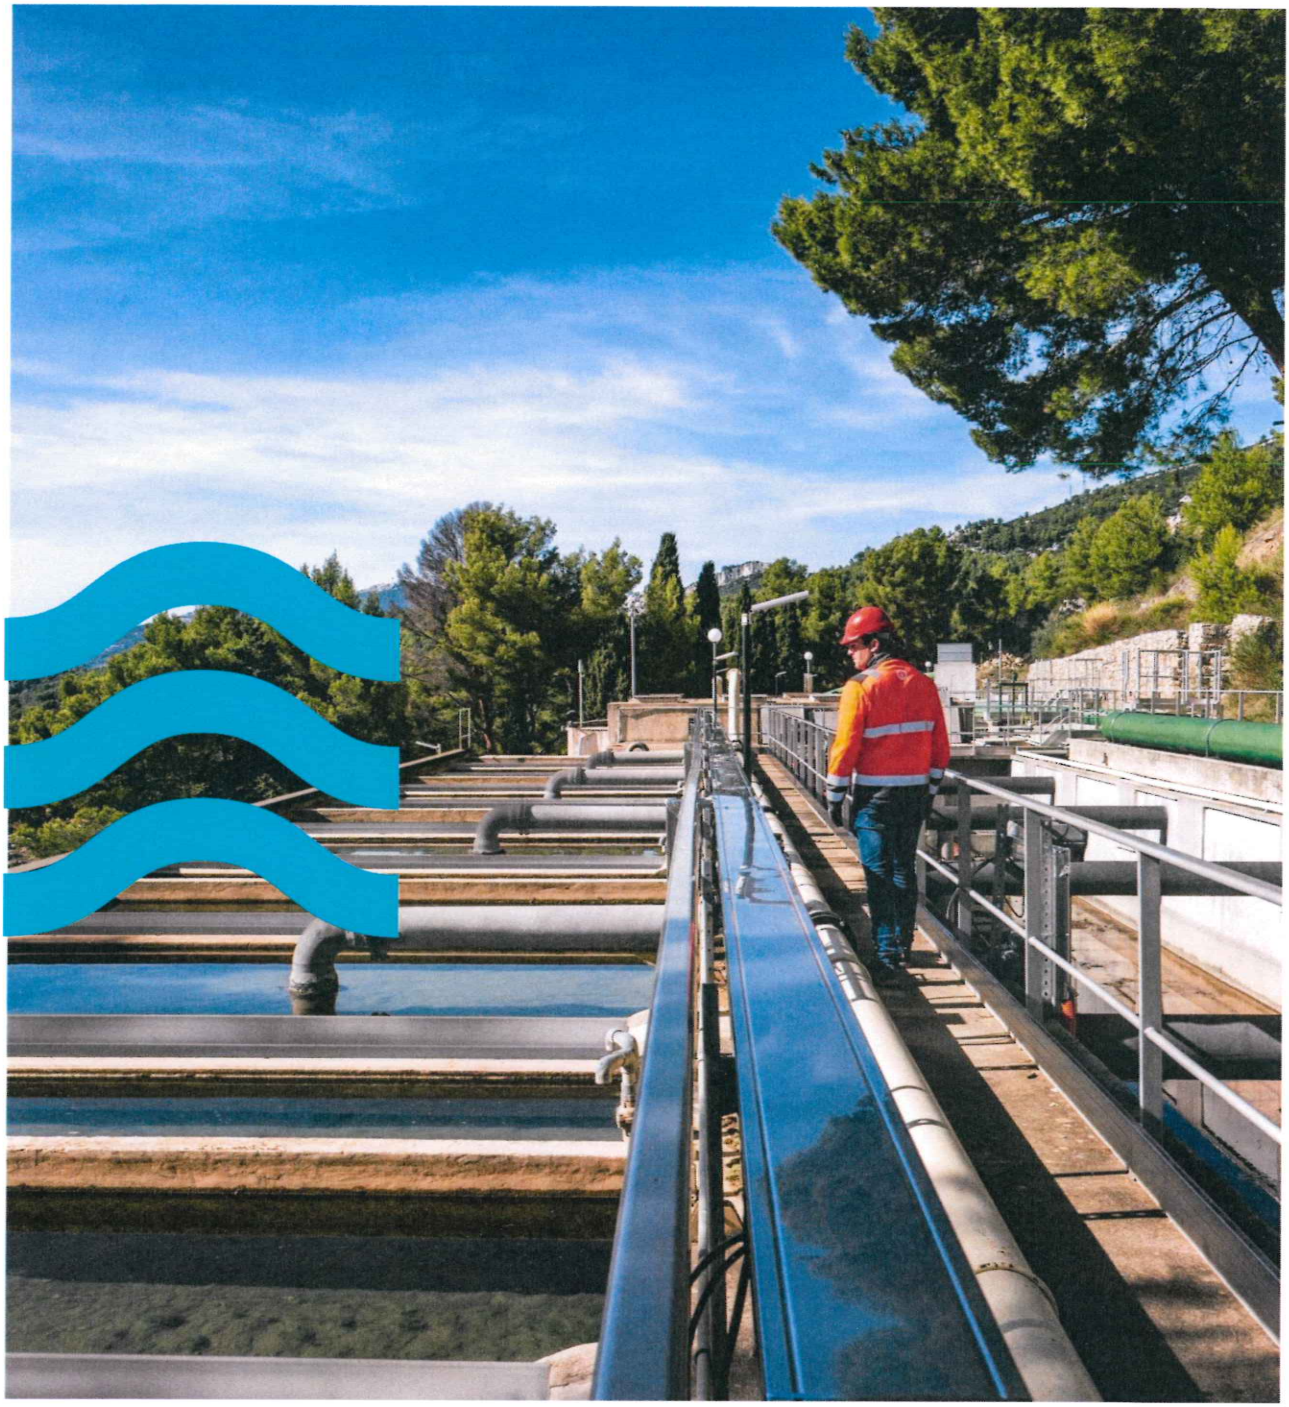

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE // 2024

SYNDICAT MIXTE POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'OUEST BRIARD – Commune d'Ozoir-la-Ferrière

Ressourcer le monde VEOLIA

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

AVANT-PROPOS

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2024

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire de votre service d'eau et d'assainissement pour l'année 2024. A travers ses différentes composantes techniques, économiques et environnementales, vous pourrez apprécier la performance de votre service et l'engagement de notre Groupe sur votre territoire.

L'année 2024 a été marquée par de nouvelles manifestations du dérèglement climatique, tant sur la quantité que sur la qualité. En particulier, les inondations et la pluviométrie record ont placé l'eau au cœur de l'actualité. Dans la lignée du plan Eau et des baisses des volumes d'eau consommés en 2023, nous avons observé au cours de l'année 2024 la poursuite de cette tendance baissière. Notre objectif partagé est de garantir la sécurité des volumes disponibles tout en préservant l'équilibre économique du service à des conditions acceptables par tous. La préservation de la ressource en eau, l'évolution de notre modèle pour adapter les services d'eau et d'assainissement et embarquer l'ensemble des parties prenantes sont au cœur de nos enjeux.

En 2024, la qualité de l'eau a été une priorité majeure. Nous avons lancé dès novembre 2023 une campagne de détection massive des 20 PFAS, en anticipation de l'obligation des autorités sanitaires, campagne qui s'est terminée en juin 2024. Sous votre autorité, notre priorité est de protéger la santé des usagers en les informant d'une part sur la qualité de leur eau, et d'autre part sur les mesures correctives que vous mettez en œuvre.

Notre préoccupation concerne également la qualité des rejets dans l'environnement. Les femmes et les hommes de Veolia Eau France sont à vos côtés pour assurer la conformité de nos systèmes d'assainissement, et agir proactivement pour minimiser les impacts sur l'environnement et la biodiversité. Nous abordons avec rigueur ce sujet conformément au cadre ambitieux défini dans la nouvelle directive européenne Eaux résiduaires urbaines (DERU2).

S'adapter à la raréfaction des ressources en eau, et promouvoir la performance des systèmes d'eau et d'assainissement sont au cœur de la réforme des redevances des Agences de l'eau. Nos équipes sont engagées à vos côtés pour répondre à ces défis en améliorant le rendement de réseau et en assurant la performance opérationnelle des systèmes d'assainissement. Dès 2024, nos équipes se sont organisées pour vous accompagner afin de mieux mettre en œuvre cette réforme structurante.

Au regard de l'urgence climatique, des besoins d'adaptation du service et pour le développement de votre territoire, nous souhaitons plus que jamais construire avec vous l'avenir de l'eau. Cette adaptation passera par des solutions telles que la réutilisation des eaux usées, l'autonomie dans la production électrique via l'usage de panneaux photovoltaïques, ou l'accompagnement vers la résilience des territoires face aux événements climatiques. Moins gaspiller l'eau par l'amélioration du rendement de réseau, maîtriser les consommations grâce au télérelevé et à la sobriété, et mieux l'utiliser, par exemple en la réutilisant davantage, nous paraissent être des axes essentiels d'une gestion durable de la ressource.

Notre rapport 2024 reflète notre engagement continu pour la sécurité de nos équipes, l'excellence opérationnelle en ligne avec les engagements pris dans notre contrat, la durabilité environnementale, et votre satisfaction et celle des abonnés. Nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous saurons construire l'avenir de l'eau sur votre territoire.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOMMAIRE

1. Présentation du contrat et du service 5
1.1. Un dispositif à votre service 6
1.2. Données du contrat 7
1.3. Les chiffres clés du service 7
1.4. Principaux indicateurs réglementaires 8
2. L'essentiel de votre service 11
2.1. Focus sur les principaux engagements contractuels 12
2.2. Faits marquants du contrat en 2024 13
2.3. Évolutions réglementaires de 2024 et à venir 17
2.4. Incontournables pour 2025 20
3. Bilan et perspectives du service 23
3.1. Bilan hydraulique 25
3.2. Bilan qualité de l'eau 29
3.3. Bilan énergie 31
3.4. Gestion de votre patrimoine 34
3.5. A l'écoute des consommateurs 35
3.6. Résilience du territoire 38
4. Rapport financier du service 46
4.1. Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation 47
4.2. Situation des biens 50
4.3. Les investissements et le renouvellement 51
4.4. Les engagements à incidence financière 61
4.5. Annexes financières 64
5. Donnees detaillees 72
5.1. Le prix du service public de l'eau 73
5.2. Vision pluriannuelle des volumes 75
5.3. Indice de protection de la ressource 82
5.4. Qualité de l'eau 83
5.5. Energie et réactifs 87
5.6. Inventaire des installations et réseaux 89
5.7. Réseaux 90
5.8. Gestion des installations 93
5.9. Opérations de renouvellement, de maintenance et travaux réalisés 95
5.10. Les consommateurs de votre service 97
6. Annexes 99
6.1. Le synoptique du réseau 100
6.2. Attestation d'assurance 102
6.3. Détail des textes réglementaires 103
6.4. Listes d'interventions 112
6.5. Certificats ISO 115
6.6. Glossaire 118
6.7. Autres annexes 123

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les Responsables de traitement des données doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou agrégées.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

1. Présentation du contrat et du service

ARD – Commune
REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

1.1. UN DISPOSITIF À VOTRE SERVICE

VOTRE LIEU D'ACCUEIL

SITES D'ACCUEIL

Du lundi au vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

TORCY	NOISIEL
	Uniquement sur rendez-vous
18, rue de Paris	9, rue de la Mare Blanche
77200 Torcy	77186 Noisiel

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER

ENGAGEMENT

Pour toutes les démarches en lien avec vos abonnements aux services d'eau, vous pouvez nous contacter via plusieurs canaux mis à disposition.

NOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE :

- www.service.eau.veolia.fr
- sur votre smartphone via nos applications iOS et Android.

NOTRE CENTRE SERVICE CLIENT, DONT LES COORDONNÉES FIGURENT SUR TOUTE FACTURE

VOS URGENCES 7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24

ENGAGEMENT

Pour toute fuite, incident concernant la qualité de l'eau ou fait anormal touchant le réseau, un branchement, une installation de stockage ou de production d'eau, nous intervenons jour et nuit.

L'exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

1.2. DONNÉES DU CONTRAT

- Délégataire — Société Française de Distribution d'Eau
- Périmètre du service — OZOIR LA FERRIERE
- Numéro du contrat — V7200
- Nature du contrat — Affermage
- Date de début du contrat — 01/07/2010
- Date de fin du contrat — 31/12/2025

AVENANTS AU CONTRAT

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
1	19/10/2013	Intégration au périmètre du contrat d'affermage du lotissement du Clos de la Vigne + traitement des surconsommations (Warsmann)
2	01/01/2023	Intégration compteur du clos de la vigne + abrogation/remplacement de l'article 6.5 alinéa 3 concernant la sécurisation et l'amélioration du rendement technique de réseau + mise en place d'une solution d'éco-pâturage sur la zone du réservoir d'Ozoir la Ferrière + mise à disposition de chèques eau + modification du tarif de base du délégataire + abrogation/remplacement de l'article 8.5 concernant la formule du K et sa fréquence d'actualisation + abrogation/remplacement du paragraphe 5 de l'article 7.2.1.1 concernant les travaux de renouvellement + prolongation du contrat d'affermage de 6 mois jusqu'au 31/12/2025

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

1.3. Les chiffres clés du service

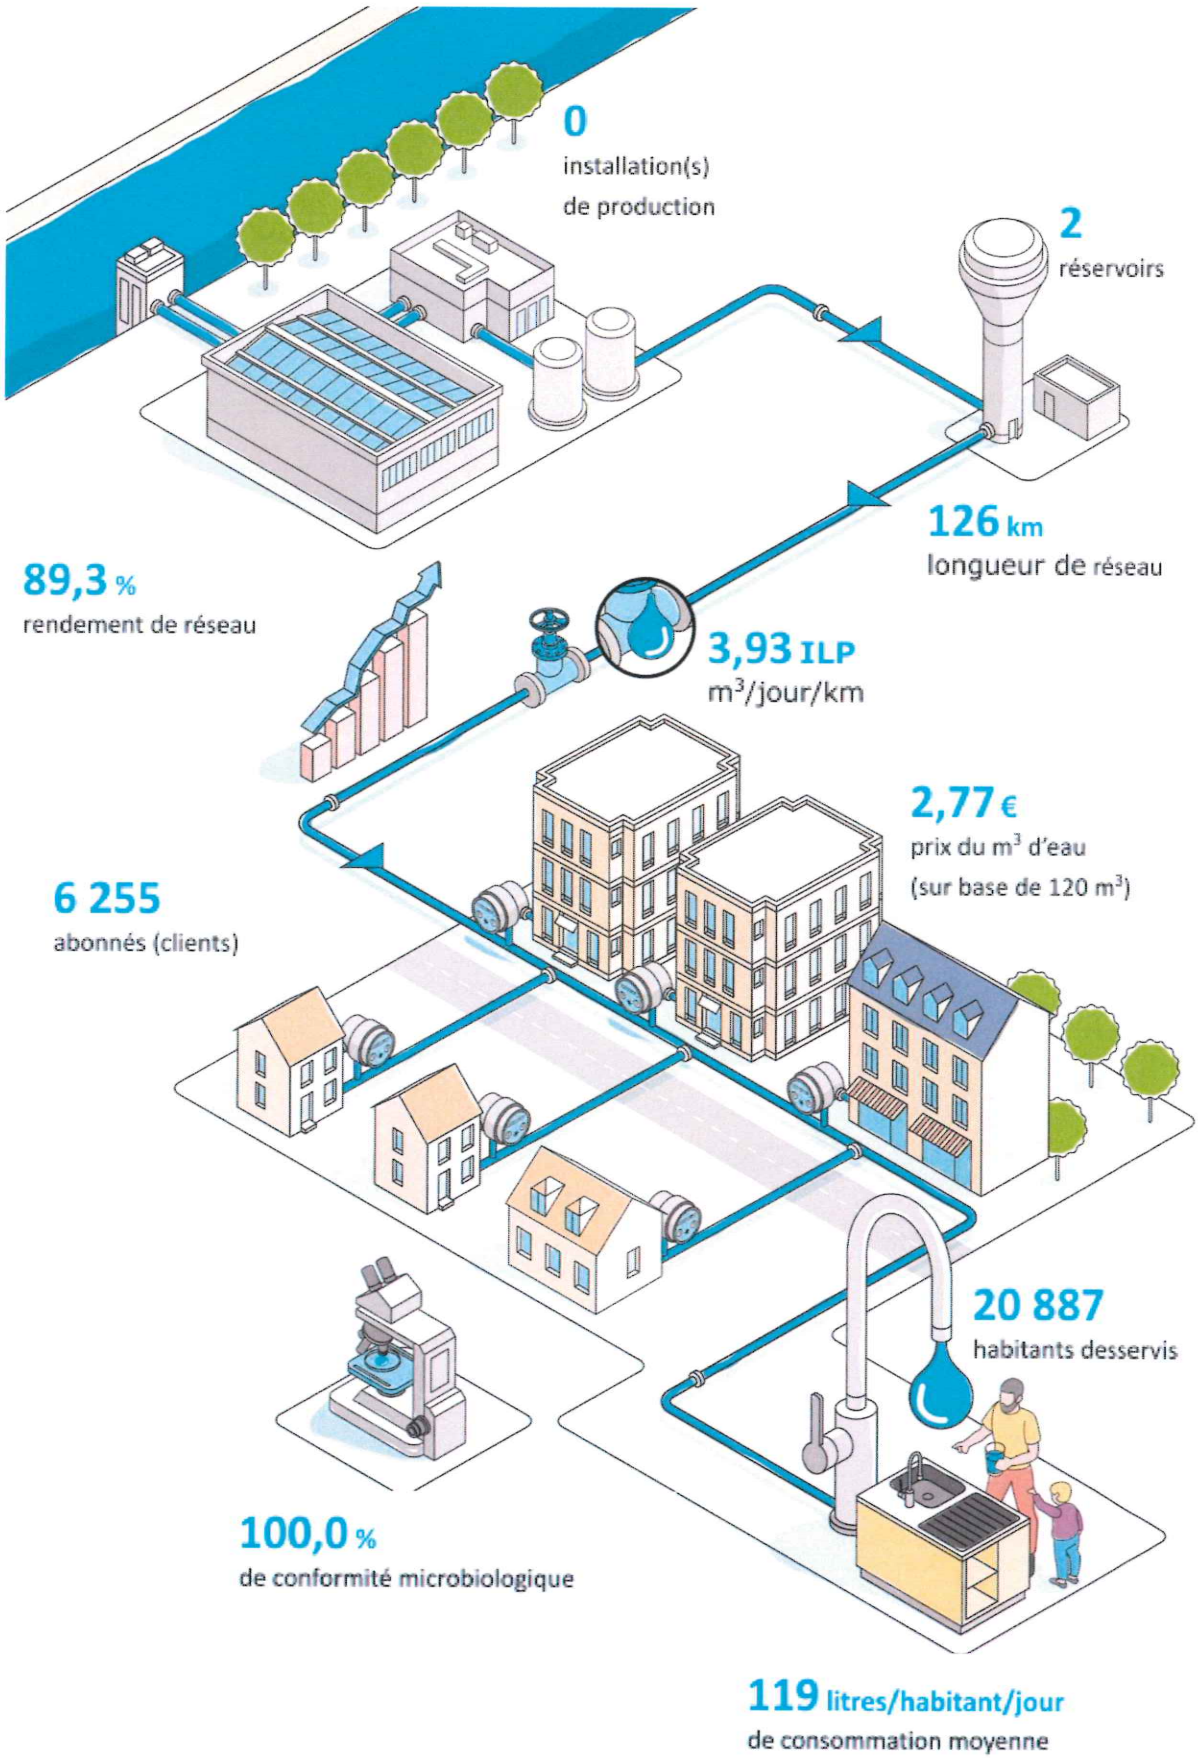

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

1.4. PRINCIPAUX INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES

	2020	2021	2022	2023	2024
D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis (u)	20 500	20 383	20 726	20 921	20 887
D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (€\m³)	2,58	2,56	2,65	2,92	3,00
D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service (jours)	1	1	1	1	1
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (ND)	118	118	118	118	118
P104.3 - Rendement du réseau de distribution (%)	89,1	87,3	92,7	90,7	89,3
P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j)	4,08	4,66	2,73	3,37	3,93
P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)	3,80	4,38	2,45	3,09	3,65
P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	1,04	0,54	0,50	0,52	0,55
P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	100	100	100	100	100
P109.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (€)	482,57	565,44	722,01	942,65	474,02
P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (u./1000 ab.)	1,47	0,81	0,96	2,72	1,28
P152.1 - Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P153.2 - Durée d'extinction de la dette de la collectivité (%)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	1,04	1,68	1,38	0,97	2,56
P155.1 - Taux de réclamations (u./1000 ab.)	0,65	1,13	0,80	1,28	0,80

(*) Données collectivités

	2020	2021	2022	2023	2024
Qualité d'eau					
VP.126 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques (u)	36	38	38	36	38
VP.127 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non conformes (u)	0	0	0	0	0
VP.128 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques (u)	6	6	6	6	6
VP.129 - Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non conformes	0	0	0	0	0
Réseau					
VP.077 - Linéaire de réseau hors branchements (m)	89 401	88 957	89 890	90 125	89 182
VP.059 - Volume produit (m³)	0	0	0	0	0

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

	2020	2021	2022	2023	2024
VP.060 - Volume importé (m³)	1 136 392	1 122 262	1 106 563	1 090 482	1 115 228
VP.061 - Volume exporté (m³)	21 719	5 980	18 669	17 386	13 402
VP.062 - Volume prélevé (m³)			0	0	0
VP.220 - Volume de service du réseau (m³)	3 486	3 288	3 302	3 449	3 470
VP.221 - Volume consommé sans comptage (m³)	5 700	5 700	5 700	5 729	5 729
ICGPR - Plan des réseaux					
VP.141 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours de l'année (quel que soit le financeur) (m)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux (ND)	10	10	10	10	10
VP.237 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux (ND)	5	5	5	5	5
ICGPR - Inventaire des réseaux					
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (ND)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
ICGPR - Autres éléments de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux					
VP.242 - Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes (ND)	10	10	10	10	10
VP.243 - Inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants (ND)	10	10	10	10	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (ND)	10	10	10	10	10
VP.245 - Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique (ND)	10	10	10	10	10
VP.246 - Inventaire secteurs de recherche de pertes eau (ND)	10	10	10	10	10
VP.247 - Localisation des autres interventions (ND)	10	10	10	10	10
VP.248 - Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (ND)	10	10	10	10	10
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux (ND)	5	5	5	5	5

	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnés					
VP.056 - Nombre d'abonnés (u)	6 142	6 190	6 226	6 240	6 255
VP.020 - Nombre d'interruptions de service non programmées (u)	9	5	6	17	8
VP.003 - Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur (u)	4	7	5	8	5
Financier					
DC.195 - Montant financier (HT) des travaux engagés (€)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (€)	482,57	565,44	722,01	942,65	474,02
VP.182 - Encours total de la dette	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
VP.183 - Epargne brute annuelle	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

	2020	2021	2022	2023	2024
VP.268 - Montant restant impayés au 31/12/N sur les factures émises au titre de l'année N-1 (€)	17 107	32 119	26 586	18 728	54 735
VP.185 - Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 31/12/N (€)	1 640 684	1 917 119	1 928 595	1 924 627	2 135 852

(*) Données collectivités

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

2. L'ESSENTIEL DE VOTRE SERVICE

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

2.1. Focus sur les principaux engagements contractuels

En tant que délégataire du service, Société Française de Distribution d'Eau assume des engagements d'échanges d'eau avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous).

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
achat	SFDE	Achat d'eau - Annet
vente	SYND INTER COM ADDUC EAU CHEVRY FEROLLES	Convention de vente d'eau en Gros - SIAEP de Chevry-Cossigny, Férolles-Attilly

2.2. Faits marquants du contrat en 2024

Lettre de l'eau

En 2024, la 1ère lettre de l'eau du SMAEP de l'Ouest Briard a été distribuée aux abonnés d'Ozoir-la-Ferrière avec la facture d'eau du 2ème semestre. Cette lettre sensibilise les abonnés sur l'existence du Fonds de Solidarité Locale Eau, sur la démarche et les contacts pour en bénéficier.

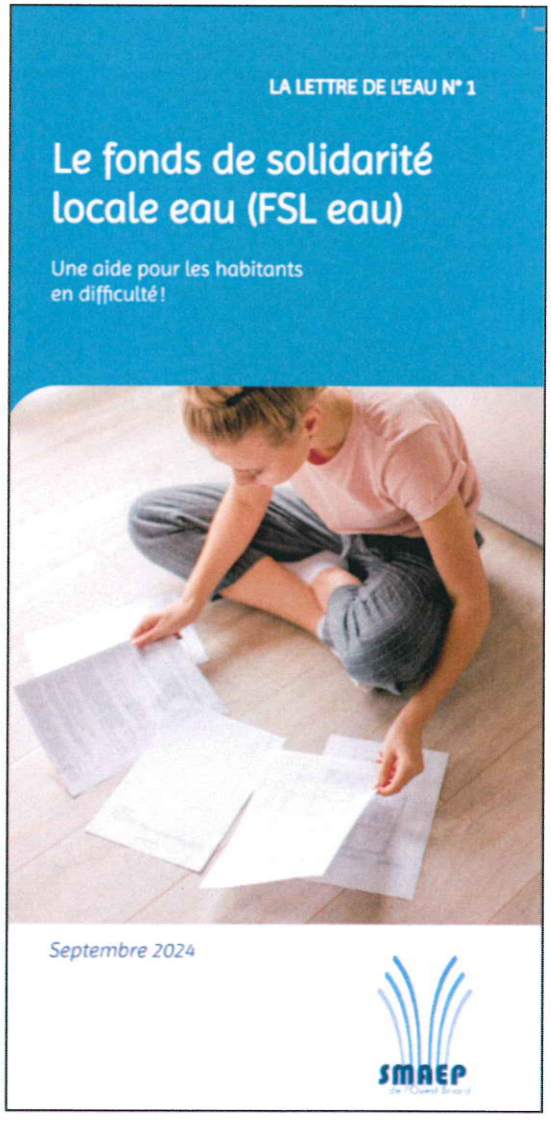

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Participation aux journées du développement Durable

Le mardi 15 octobre 2024, Veolia a participé aux Journées du Développement Durable organisées par la commune.

Ainsi un stand a été mis à disposition avec 3 agents le vendredi pour la journée dédiée aux scolaires.

Trois présentations et activités ont été proposées sur ce stand avec :

- des explications et expériences sur la production et la distribution de l'eau potable
- des explications sur la biodiversité et le rôle des pollinisateurs
- la fabrication d'une bougie en cire remise à chaque participant

Chantier Albert LEPETIT Phases II et III

Le renouvellement de la canalisation de la rue Albert Lepetit a été démarré en 2023. Elle s'est poursuivie, et terminée, sur 2024 avec la réalisation des phases II et III. Au final ce sont près de 680 mL de canalisation qui ont été renouvelés

Phase II 230 mL DN150 + 10 branchements	**Phase III** 210 mL DN150 + 11 branchements
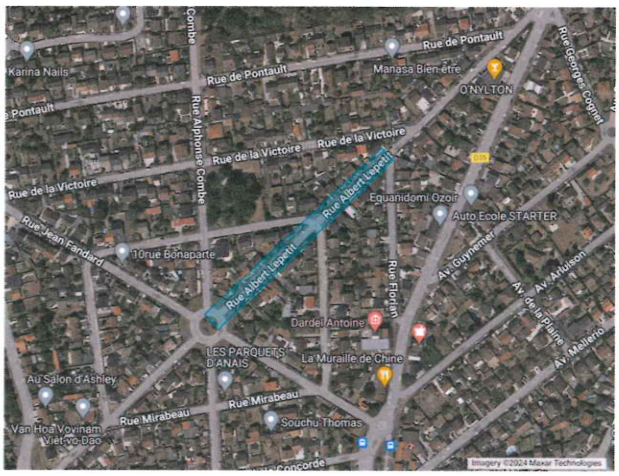	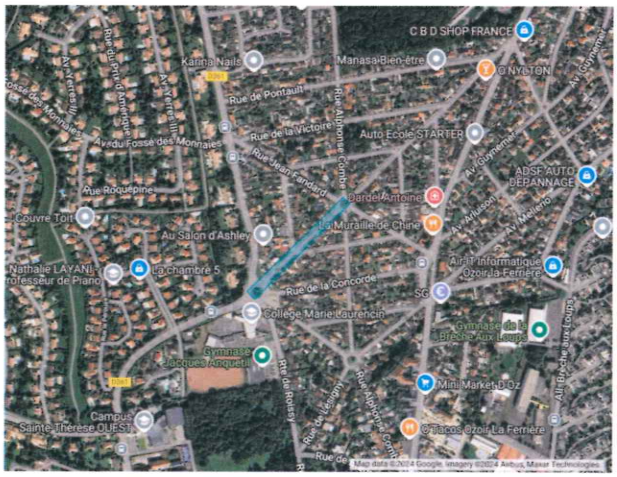

Vanne + clapet au réservoir de la Gare

Suite au blocage du clapet au réservoir de la Gare, ce dernier n'était plus en capacité de distribuer. Lors du constat du blocage, le clapet a été ouvert et son battant retiré le temps de procéder à son renouvellement. Compte tenu du chantier, et afin de repartir sur un patrimoine 100% fonctionnel, la vanne de distribution collée au clapet a été renouvelée également.

Le chantier s'est déroulé juste en amont du lavage du réservoir, le 10/06/2024.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Vanne et clapet de distribution

Té 3 Vannes d'alimentation du réservoir de la Gare

Les vannes d'alimentation du réservoir n'étaient plus étanches en fermeture. De ce fait, lors des lavages de l'ouvrage, un arrêt d'eau étendu était nécessaire, ce qui causait des désagréments aux abonnés. C'est pourquoi il a été décidé de renouveler les 3 vannes du Té-vanne d'alimentation du réservoir. Ce chantier a été réalisé en mai 2024

Prélocalisateurs à poste fixe pour une recherche de fuites en continu

En 2024 a été initié le plan de pose de 150 prélocalisateurs à poste fixe sur le réseau de la ville, hors Domaine Poirier où les canalisations sont majoritairement en PVC. La première problématique consistait dans la détermination de la solution technique à mettre en œuvre pour permettre une couverture uniforme de la ville en termes de moyen de communication.

Actuellement, la couverture LoRaWan de la ville n'est pas uniforme et ne permet pas de disposer d'un mode de communication unique pour l'ensemble du parc.

La solution retenue : des capteurs hybrides, spécifiquement créés par Sewerin pour Veolia, capables de communiquer via la réseau LoRaWan et via le réseau de télérelevé des compteurs des abonnés.

Le déploiement du parc a débuté fin 2024 et il devrait être finalisé au premier semestre 2025.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

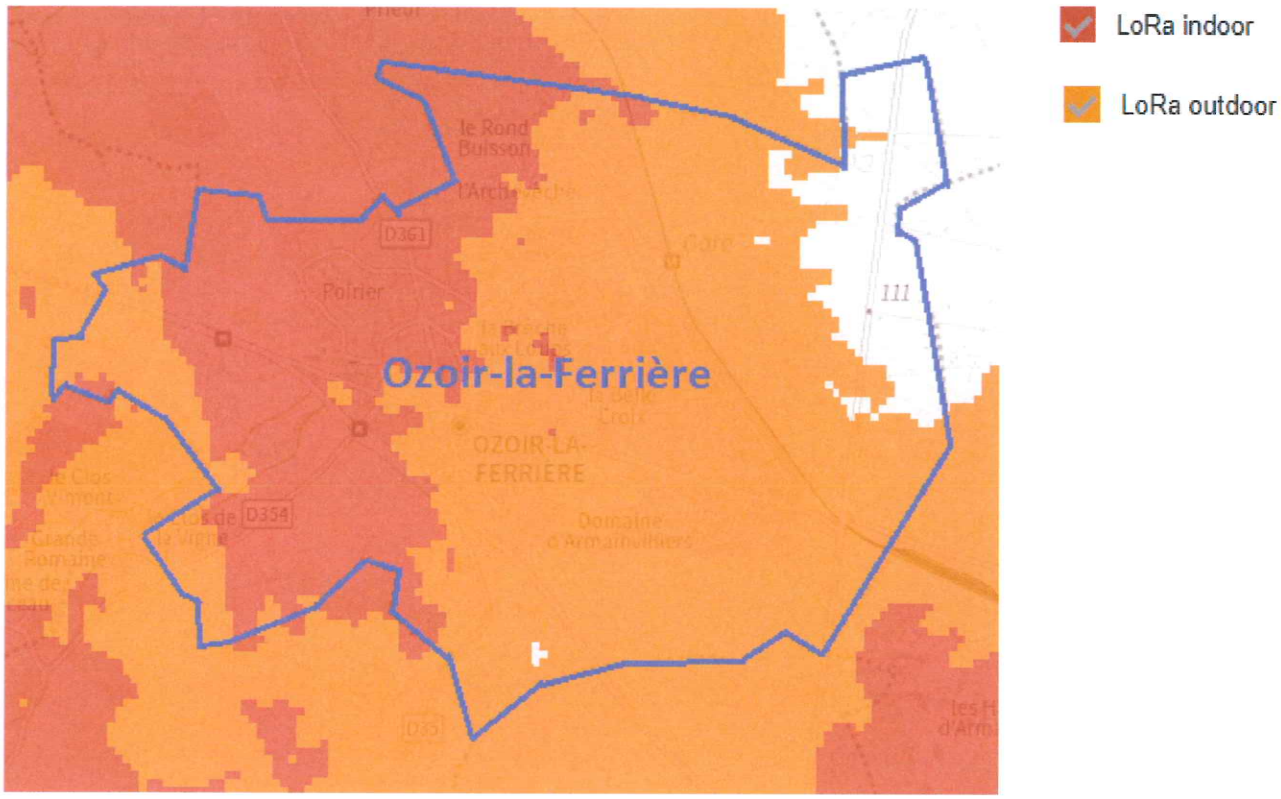

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

2.3. Évolutions réglementaires de 2024 et à venir

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l'année vous est proposée, accompagnée des impacts susceptibles d'être significatifs pour votre service.

L'année 2024 a été marquée par la publication de textes législatifs et réglementaires particulièrement structurants, à court et moyen termes, pour les services d'eau. Vos interlocuteurs se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur leurs conséquences particulières pour votre service, notamment, les résultats d'analyses de qualité d'eau réalisées en 2024 sur votre service.

La réforme des redevances des agences de l'eau

Cette réforme structurante a été adoptée dans la loi de finances de l'année 2024. Elle est effective à compter de l'année 2025 pour l'entrée en vigueur des douzièmes programmes des agences de l'eau (2025 - 2030). Plusieurs textes d'application ont été publiés en 2024 pour préciser ses modalités et son calendrier d'application.

Cette réforme supprime certaines redevances existantes : pollution non-domestique et modernisation des réseaux de collecte (usage domestique et non-domestique). De même, cette réforme acte la fin de la prime pour performance épuratoire et le doublement possible de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau pour cause de maîtrise insuffisante des pertes en eau sur le réseau d'eau (doublement dit « Grenelle », encadré par un décret de janvier 2012).

Dans le même temps, ces différentes suppressions s'accompagnent de nouvelles redevances :

- une redevance pour consommation d'eau potable dont devront s'acquitter les abonnés au service ;
- deux redevances auxquelles seront assujetties directement les autorités organisatrices des services publics d'eau et d'assainissement portant sur la performance des services.

Ces deux dernières redevances seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration) et l'efficacité du système d'assainissement.

Les services, en tant qu'autorité organisatrice peuvent dès l'année 2025, et après délibération en 2024, reporter la contrepartie de ces deux redevances, assises sur la performance, sur une ligne spécifique de la facture des abonnés au service à travers un mécanisme de contre-valeur. Pour l'année 2025, cette contre-valeur correspond au taux fixé par l'agence de l'eau multiplié par le coefficient de modulation par défaut de l'année 2025 (0,2 pour l'eau, 0,3 pour l'assainissement).

Les modulations sur performance indiquées plus haut deviendront pleinement effectives en 2026, sur la base des performances constatées au terme de l'année 2024.

Le décret 2024-787 du 9 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024) portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau précise les dispositions essentielles de la réforme. Ce décret est complété par quatre arrêtés, à savoir :

- l'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024) modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- l'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 9 juillet 2024) relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ;
- l'arrêté du 5 juillet (JO du 7 juillet 2024) relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 2 octobre 2024 (JO du 30 octobre 2024) modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées).

Enfin, cette réforme structurante des redevances s'accompagne d'une refonte des indicateurs de performance du Système d'Information des Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA) qui était supposée aboutir durant l'année 2024.

Le repérage de l'amiante avant travaux

L'arrêté du 4 juin 2024 (JO du 30 juin 2024) est venu préciser les modalités de réalisation du repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.

Cet arrêté qui couvre les enrobés routiers et les réseaux entrera pleinement en application le 1er juillet 2026 afin de permettre au préalable la mise en œuvre des formations des opérateurs en charge de réaliser ces opérations de repérage, selon la norme NF X 46-102 de novembre 2020.

Les dispositions de cet arrêté précisent que le donneur d'ordre des travaux est tenu d'adresser au propriétaire de l'ouvrage une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.

L'arrêté précise également les conditions d'exemption de ce repérage : situation d'urgence ou lorsque les informations provenant des documents de traçabilité sont antérieurement connues.

Résilience des services et cybersécurité

Un projet de loi a débuté son parcours législatif au parlement à l'automne 2024. Ce projet inclut la transposition de deux directives européennes, à savoir, la directive européenne 2022/2557 du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques et la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 (dite NIS2 pour Network and Information Security). Ces deux directives modifient le champ des secteurs d'activité ou la taille des sites considérés comme entités critiques ou essentielles en y incluant notamment les services d'eau et d'assainissement.

Enfin, un rapport de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI), publié fin novembre 2024, a pointé les risques particuliers qui pèsent sur les acteurs de l'eau et de l'assainissement en France, en recensant au moins 31 « compromissions » dans ce secteur depuis 2021.

Cette loi en cours d'adoption est donc susceptible d'impacts significatifs (financiers et/ou organisationnels) pour votre service.

Qualité de l'eau

La directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) est désormais pleinement entrée en vigueur.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

La directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 actualise celle de 1998. Elle « revalorise l'eau du robinet ». Cette directive a été transposée en droit français à la toute fin de l'année 2022 à travers une ordonnance, deux décrets et une quinzaine d'arrêtés.

Ces textes législatifs et réglementaires ont été complétés par une note d'information de la Direction Générale de la Santé (DGS) aux ARS (note d'information n° DGS/EA4/2023/61 du 14 avril 2023, publiée le 28 avril 2023).

Cette note d'information réaffirme les points fondamentaux du cadre réglementaire promulgué fin décembre 2022 et pour partie effectif depuis le 1er janvier 2023, notamment :

- elle renforce, dès le 1er janvier 2023, les normes de qualité exigées pour l'eau potable sur de nouveaux polluants, avec une obligation de résultats sur sept nouveaux paramètres qui couvrent différentes familles de substances (sous-produits de désinfection, perturbateurs endocriniens, l'uranium) et notamment la somme de 20 substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées « PFAS ») à laquelle est associée une limite de qualité de 0,1 microgramme/L ;
- elle confirme que la vérification permanente de la qualité de l'eau relève de la responsabilité du service public d'eau, au travers la mise en œuvre d'un plan de surveillance conforme aux exigences de qualité en vigueur et aux vulnérabilités identifiées. Le contrôle sanitaire officiel opéré par les ARS présente un caractère strictement ponctuel et en aucun cas permanent. Ainsi, sur les sept nouveaux paramètres mentionnés plus haut, le contrôle sanitaire réalisé par les ARS sera opérationnel au plus tard le 1er janvier 2026 ;
- elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) élaborés sous la responsabilité de la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE). Cette approche passe par une meilleure maîtrise du patrimoine des services d'eau et la compréhension de leur vulnérabilité, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance mentionné plus haut.

Ce nouvel enjeu de gestion préventive des risques et les dispositions qui s'y rattachent ont été rappelés dans un courrier du Directeur Général de la Santé, daté du 30 janvier 2024 adressé à l'Association des Maires de France, à Intercommunalités de France, à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et à la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E).
Ce courrier réaffirme les échéances de juillet 2027 puis de janvier 2029 pour que les services d'eau élaborent, mettent en œuvre, évaluent et mettent à jour leur PGSSE, d'abord sur la ressource en eau puis sur la production et la distribution (seconde échéance citée).

Ce rappel survient alors **que les sujets des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées « PFAS ») et des métabolites de pesticide ont jalonné l'année 2024** : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel et, voire même, médiatique.

Ces deux sujets sont susceptibles d'évolutions majeures au cours de l'année 2025.

PFAS (ET AUTRES PARAMÈTRES NOUVELLEMENT RÉGLEMENTÉS)

Sur le plan réglementaire, l'instruction DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024 (BO Santé du 29 mars 2024), est venue préciser les modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cette instruction de la DGS à destination des ARS et des Préfets précise les recommandations de gestion des situations locales de non conformités pour les PFAS dans les EDCH en réaffirmant l'obligation d'une information transparente des populations concernées (conformément à l'article R1321-30 du Code de la Santé Publique). Elle rappelle les incertitudes scientifiques concernant cette famille de substances et dresse l'état d'avancement des expertises sanitaires en cours, dont la campagne exploratoire de l'Anses sur les PFAS dans les eaux brutes et les eaux distribuées. Pour les PFAS,

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

cette campagne exploratoire porte sur 34 composés, incluant les 20 composés dont la somme est soumise à une limite de qualité depuis le 1er janvier 2023 et des PFAS à chaîne dite « courte », aujourd'hui non réglementés en France, dont l'acide trifluoroacétique (communément nommé TFA).

Sur le plan européen, une communication de la Commission (C/2024/4910) publiée au JOUE du 7 août 2024 est venue préciser les lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et poly-fluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine.

MÉTABOLITES DE PESTICIDES : DES CRITÈRES DE GESTION TOUJOURS EN ÉVOLUTION

L'année 2024 a été marquée par la publication de trois avis de l'Anses :

- dans deux avis publiés début mai 2024, l'Anses a confirmé le caractère pertinent du métabolite R417888 du chlorothalonil et a classé comme non-pertinent le métabolite R411811 du même chlorothalonil. Le métabolite R471811 se trouve dès lors affecté d'une norme sanitaire, considérée comme une valeur indicative, de 0,9 µg/L (et non plus une limite de qualité de 0,1 µg/L comme c'est encore le cas pour le métabolite R417888). A noter que la précédente campagne exploratoire menée par l'Anses, sous l'égide de la DGS, sur les polluants émergents susceptibles d'être présents dans les ressources en eau et les EDCH et publiée en avril 2023 avait montré la détection très fréquente du métabolite Chlorothalonil R471811 dans les eaux brutes et distribuées ;
- dans un avis publié début août 2024, l'Anses fixe les valeurs sanitaires maximales de la desphényl-chloridazone et de la méthyldesphényl-chloridazone, deux métabolites de la chloridazone confirmés comme pertinents dans deux avis de 2023 de l'Anses. Ces valeurs sanitaires maximales sont respectivement de 11 µg/L et 110 µg/L. S'agissant de deux métabolites pertinents, ils sont tous deux soumis à une limite de qualité de 0,1 µg/L qui fixe la conformité de l'eau à atteindre, le cas échéant, après une période dérogatoire de trois ans, renouvelable une fois.

Fin novembre 2024, la publication d'un rapport mené par trois inspections ministérielles (IGEDD, CGAAER et IGAS) sur la gestion des aires d'alimentation des captages a dressé un constat sévère sur la fréquence de détection des pesticides et de leurs métabolites dans les ressources en eau en proposant différentes dispositions pour la reconquête de leur qualité dont l'harmonisation européenne du classement de la pertinence / non-pertinence des métabolites de pesticide. Cette disposition a été initiée en 2024 par la Commission avec l'appui scientifique de l'OMS dont les travaux sont attendus en 2025.

Enfin, dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la qualité des EDCH, il est prévu qu'un arrêté interministériel vienne préciser la définition des captages sensibles aux pollutions diffuses d'origine agricole ou industrielle. Pour les captages qui seront considérés comme sensibles, les services en charge de la production de l'eau devront assumer de facto la compétence de préservation de la ressource en eau et bénéficieront pour cela du soutien des autorités publiques (préfets) afin de mettre en œuvre des plans d'actions adaptés. La publication de ce texte réglementaire très attendu par de nombreux services d'eau est susceptible de survenir durant l'année 2025.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

2.4. INCONTOURNABLES POUR 2025

2.4.1. PROPOSITIONS ET AMÉLIORATIONS ATTENDUES

ANTICIPER L'IMPACT DE LA RÉFORME DES REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU

La réforme des redevances des agences de l'eau qui entre en vigueur en 2025 se traduit par la mise en place d'une redevance de performance des réseaux d'eau potable à laquelle la collectivité est assujettie, et dont le montant pourra être largement minoré (jusqu'à 80%) en fonction de la performance de vos réseaux.
L'introduction du critère de performance sera progressive :

- pour la redevance 2025 qui fera l'objet d'une déclaration et d'un paiement en 2026, le coefficient de modulation a été fixé forfaitairement par voie réglementaire à 0,2;
- à partir de la redevance 2026 qui sera déclarée et payée en 2027, le coefficient de modulation réel sera pris en compte, sur la base des données techniques 2024.

La performance prise en compte dans le calcul de la redevance porte sur deux domaines principaux : la performance du réseau (réduction des pertes) et la connaissance du patrimoine.

Dans ce cadre, certains tronçons sont assez dégradés et génèrent régulièrement des fuites qui peuvent pénaliser la bonne distribution de l'eau aux usagers. Il est nécessaire de procéder à certains renouvellements avec des niveaux de priorités.

Commune	Voie	Nb de fuites 1998-2024
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE ARLUISON	17
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE BERTHELOT	15
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE DE LA CLAIRIÈRE	13
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE DE LA MARE A LA CHAISE	13
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	14
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE DU GENERAL LECLERC	18
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE GOUNOD	16
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE LE NOTRE	16
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE MASSENET	15
OZOIR LA FERRIERE	AVENUE SAINT EXUPERY	15
OZOIR LA FERRIERE	**RÉSIDENCE VINCENNES**	**25**
OZOIR LA FERRIERE	RUE ALPHONSE COMBE	16
OZOIR LA FERRIERE	RUE DE LA VICTOIRE	13

Nous nous rapprocherons de vos services afin d'étudier les projets, travaux, ou prestations qui vous permettront dans la durée de sécuriser le meilleur niveau de performance permettant de minorer le montant de la redevance à laquelle vous serez assujettis.

OPTIMISATION DU RENOUVELLEMENT DE VOS INSTALLATIONS

Veolia a développé une méthode d'analyse de risque sur le patrimoine électro-mécanique qui permet d'identifier les équipements les plus exposés aux risques et de dimensionner des programmes de renouvellement pertinents et objectifs [cf paragraphe 3.4.2. Méthode d'établissement des plans de renouvellement par analyse critique]. En application de cette méthodologie, nous pourrons vous proposer une évolution de nos programmes de renouvellement.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

RÉVISION DU CONTRAT

La mutabilité contractuelle **est un principe clé des concessions de service public.**
Des modifications peuvent lui être apportées dans les conditions de l'article L. 3135-2 du CCP. Celles-ci n'ont pas toutes la même importance mais permettent l'adaptation du contrat aux évolutions nouvelles.
C'est à cette fin que le contrat prévoit des clauses de révision.

- soit pour tenir compte de l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs,
- soit d'une nouvelle réglementation ayant une incidence sur l'exploitation
- soit au bout d'un certain temps

La révision a donc pour objet **de recaler le contrat dans son équilibre**.
Les clauses de révision ont de leurs côtés pour objet de restituer un processus de discussion pouvant conduire à une négociation.
Parmi les nombreuses évolutions réglementaires ayant un impact sur les conditions d'exploitation, il est possible de citer les évolutions réglementaires suivantes :

✔ L'instruction CVM
✔ L'obligation d'hygiénisation des boues toujours en vigueur du fait de la crise COVID
✔ Le diagnostic permanent issu de l'arrêté modificatif du 21 juillet 2020
✔ Le PGSSE en eau potable
✔ L'analyse des risques et défaillances
✔ Décret socle commun pour la valorisation des boues
✔ Révision de la note technique RSDE
✔ L'instruction DGS/EA4/2020/177 en date du 18 décembre 2020 relative aux métabolites de pesticides
✔ Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
✔ Mise en conformité des machines tournantes afin de respecter les règles et réglementations de sécurité telles que définies par le décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008.
✔ La Directive Européenne 2006/42/CE
✔ L'article R4312-1 du code du travail qui fixe les obligations techniques, détaillées dans son annexe 1
✔ La circulaire n°2010-01 de la DGT
✔ Mise en conformité des silos à boues vis à vis du risque ATEX et notamment l'approche en termes de zonage ATEX telle que définie dans l'Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive, en s'appuyant sur la norme NF EN 60079-10-1
✔ Mise en sécurité des aires de dépotage des produits chimiques et leur stockage, afin d'assurer la sécurité des intervenants, ainsi que la protection de l'environnement, en application notamment des articles R.4224-14, R.4412-5 à R.4412-10, R.4412-17, et l'arrêté du 12/10/2011 (ICPE).
✔ Amiante, décret du 09 mai 2017 qui modifie le code du travail (R.4412-97 à R.4412-97-6) qui fixe l'obligation de repérage amiante avant travaux avec la mise en application notamment des normes :
✔ NF X46-020 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis
✔ NF X46-102 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
✔ NF X46-100 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d'une activité

Le détail des évolutions réglementaires sont par ailleurs détaillées dans les annexes des rapports annuels que nous vous remettons.
Pour tenir compte de ces évolutions, il nous paraît nécessaire d'ouvrir prochainement les discussions pour vérifier l'incidence sur le contrat en cours et recaler si nécessaire le contrat qui nous lie.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

LES PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE

Type d'installation	Localisation	Fonctionnement	Commentaires
INFRASTRUCTURE	Réservoir de La Gare	RÉSERVOIR	La foudre qui a frappé le réservoir de la Gare en juillet 2018 a été à l'origine de la panne simultanée du concentrateur (pour le télérelevé des compteurs) et de l'analyseur de résiduel de chlore. Le renforcement de la défense paratonnerre de l'ouvrage est préconisé.
INFRASTRUCTURE		RÉSEAU AEP	L'amélioration durable du rendement de réseau passe par la mise en place d'une sectorisation du réseau AEP pour optimiser les campagnes de recherches de fuites.
SÉCURITÉ	Kennedy	CHLORATION	Ce site est pourvu d'une chloration et se trouve à proximité du quartier Anne FRANK. Surveillance des bouteilles par détecteurs de fuite de chlore.

2.4.2. FOCUS SUR LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

La sécurité de nos personnels, des riverains et d'éventuels visiteurs des installations est une absolue nécessité pour votre service d'eau.
Le groupe Veolia dispose d'une culture Sécurité forte, animée et organisée autour de Standards Sécurité, qui nous permettent de hiérarchiser les axes de travail.
Notre politique de prévention nous amène donc à régulièrement réévaluer le niveau de sécurité des installations que vous nous avez confiées, vérifier leur adéquation à la réglementation, et prendre en compte les retours d'expérience que nous avons sur d'autres installations. Cette politique permet de répondre à toute intervention possible de l'Inspection du Travail qui mettrait en évidence le caractère accidentogène de vos installations, et en chercherait alors la responsabilité.

La sécurisation des installations signalées non conformes suite à des audits, contrôles réglementaires ou par nos équipes d'interventions ou managers peut nécessiter des remises à niveau qui relèvent de votre responsabilité de Maître d'Ouvrage.

Par ailleurs, des évolutions réglementaires récentes renforcent les exigences de sécurité concernant les travaux sur les matériaux contenant de l'amiante (enrobés, canalisations), avec un impact sur les coûts de nos interventions. Nous nous rapprocherons de vos services pour vous présenter une mise à jour de nos bordereaux pour la prise en compte de ces impacts.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3. Bilan et perspectives du service

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Ce chapitre vous présente une synthèse du bilan de l'activité de l'année 2024 et des perspectives de votre contrat. L'ensemble des données chiffrées et factuelles pour évaluer la qualité et la performance du service rendu sont disponibles en partie 5 – Données détaillées.

3.1. BILAN HYDRAULIQUE

3.1.1. EVOLUTION DES VOLUMES VENDUS

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu selon le décret (m3)	**1 002 918**	**976 616**	**1 022 729**	**985 355**	**992 747**	**0,8%**
Sous-total volume vendu aux abonnés du service	**981 199**	**970 636**	**1 004 060**	**967 969**	**979 345**	**1,2%**
domestiques ou assimilés	966 153	952 384	986 255	951 775	962 960	1,2%
non domestiques	15 046	18 252	17 805	16 194	16 385	1,2%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	**21 719**	**5 980**	**18 669**	**17 386**	**13 402**	**-22,9%**

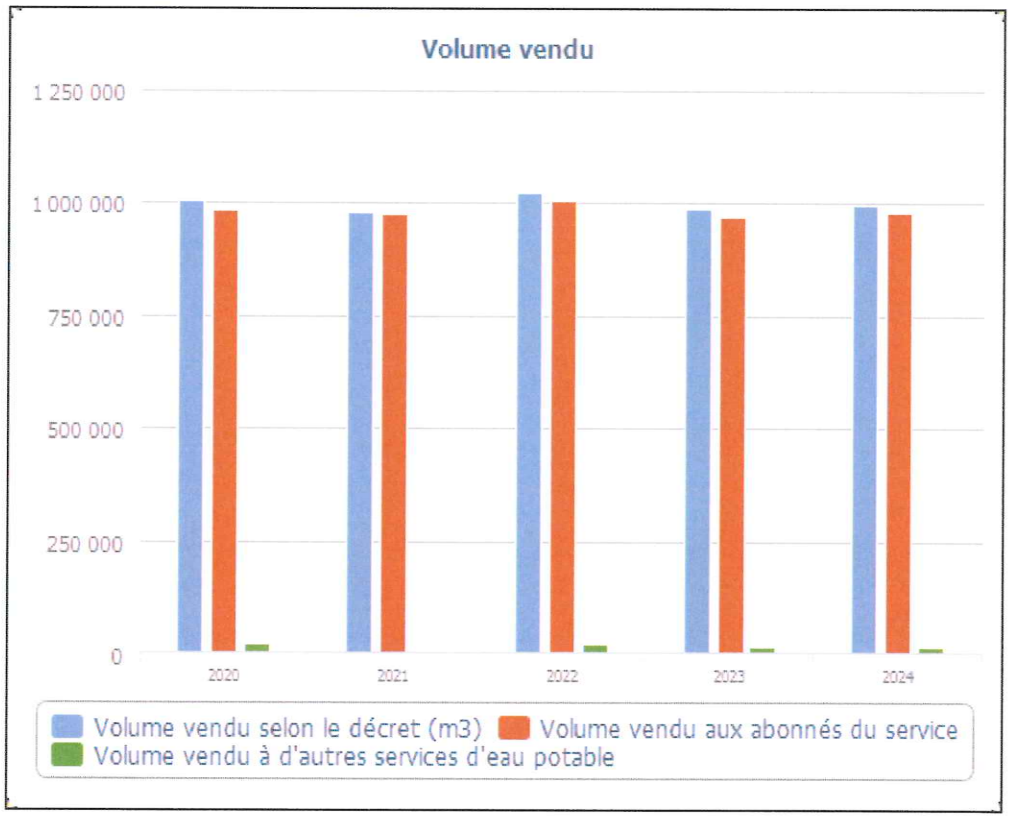

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.1.2. PERFORMANCE DU RÉSEAU

RENDEMENT RÉSEAU

Synthèse des flux de volumes

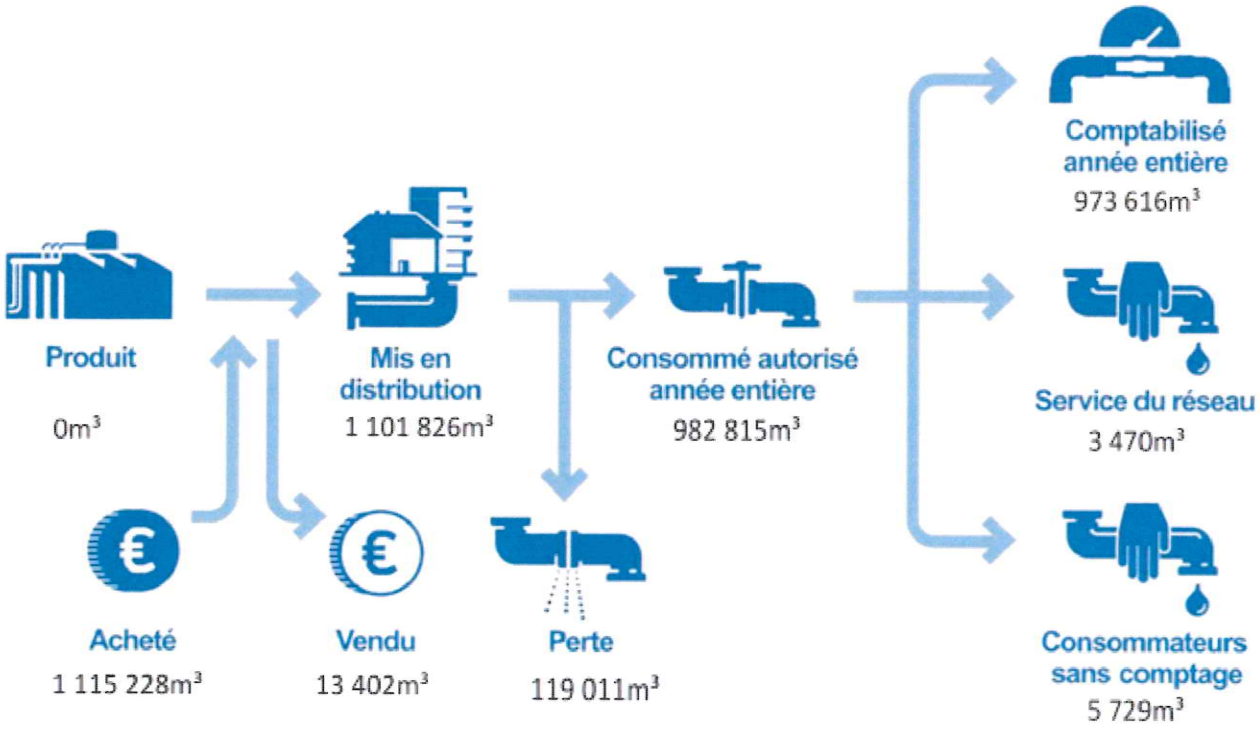

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Rendement du réseau de distribution (%) (A+B)/(C+D)	**89,1 %**	**87,3 %**	**92,7 %**	**90,7 %**	**89,3 %**	**-1,5%**
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . A	990 385	973 924	1 007 362	971 418	982 815	1,2%
Volume vendu à d'autres services (m3) . .. . . . B	21 719	5 980	18 669	17 386	13 402	-22,9%
Volume produit (m3) C	0	0	0	0	0	0%
Volume acheté à d'autres services (m3) . .. . . D	1 136 392	1 122 262	1 106 563	1 090 482	1 115 228	2,3%

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le tableau

(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services)

Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

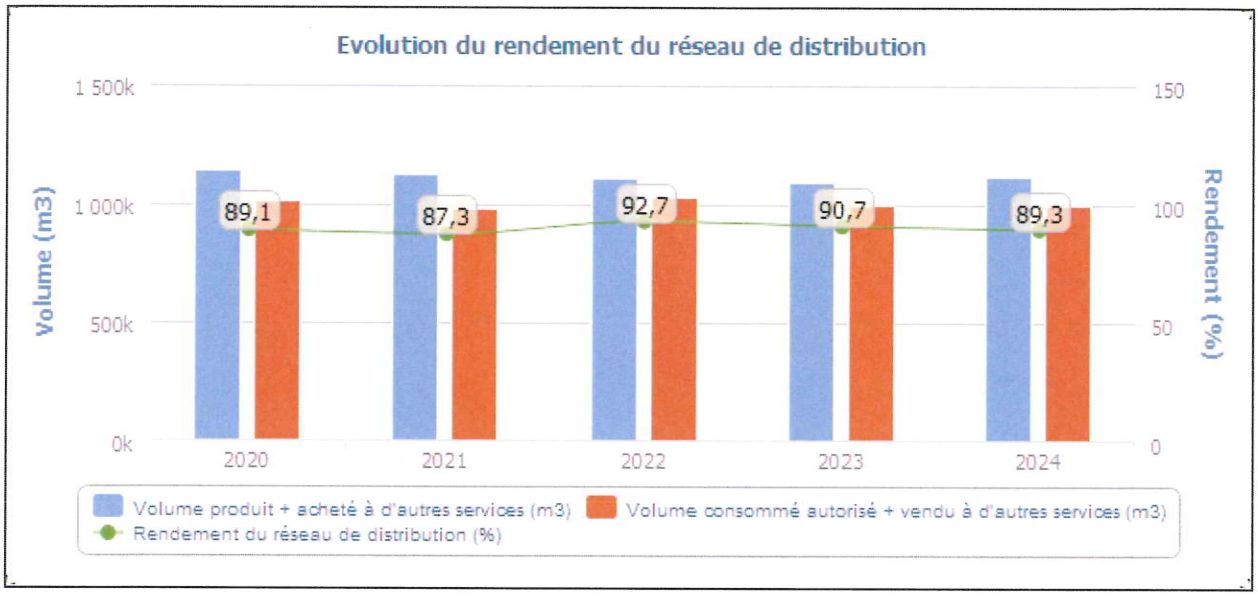

3.1.3. SUJETS À ENGAGER PENDANT LE CONTRAT

La préservation de la ressource en eau passe par la bonne performance de vos réseaux, qui est désormais un critère incitatif dans le calcul des nouvelles redevances performance des réseaux d'eau potable introduites en 2025 et auxquelles les collectivités sont assujetties.

Veolia vous propose des solutions adaptées pour mieux répondre à ces défis, que ce soit notamment dans le domaine du comptage des eaux actuellement non comptées, ou dans l'équipement des réseaux de solutions de surveillance (capteurs de fuite ou de phénomènes transitoires) ou de réduction de la pression.

L'optimisation du montant de la redevance de performance des réseaux d'eau potable à laquelle vous serez assujettis à partir de 2025 passera notamment par un comptage des eaux actuellement non comptées.

Comptage des eaux utilisées pour les chantiers : Mobil'Eau

Ce dispositif innovant de comptage mobile, mis au point en exclusivité par Veolia, permet la régularisation d'un approvisionnement temporaire en eau (chantiers...).

Mobil'eau permet de :

- comptabiliser et enregistrer la consommation d'eau ;
- transmettre quotidiennement les données ;
- utiliser les données pour la facturation ou le service.

Les entreprises récupèrent les mallettes directement dans nos locaux avant le démarrage de leur chantier, et les restituent en fin de chantier. A chaque fois qu'ils croisent une entreprise de travaux, les techniciens communiquent sur Mobil'eau pour mieux faire connaître le dispositif.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

La surveillance des volumes Incendie : Apilink

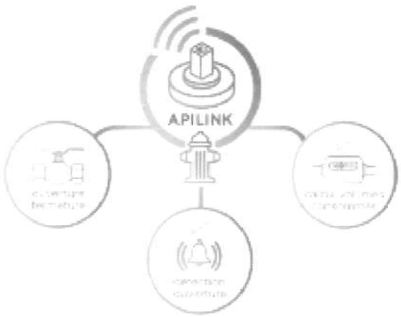

Les poteaux incendie du territoire présentent un double risque pour le service :

- la **non-comptabilisation des volumes utilisés** : en effet, ils ne disposent pas de systèmes de comptage, bien qu'étant sous pression d'eau permanente et alimentés par le réseau d'eau public ;
- des **impacts potentiellement sévères sur les réseaux en cas d'utilisation illicite** par des personnes non compétentes :
  - fragilisation des canalisations par la génération de phénomènes transitoires, notamment lors des opérations de fermetures brusques des poteaux ;
  - pollution des réseaux : les poteaux incendie n'ont pas de clapet anti-retour ;
  - dégradation de la qualité de l'eau, les survitesses engendrées par les tirages favorisant le décrochage et la mise en suspension de particules en réseau.

Ces dispositifs de surveillance connectés détectent l'ouverture et la fermeture des poteaux, et calculent les volumes consommés.
Grâce à APILINK, la collectivité bénéficie d'une meilleure connaissance du patrimoine et des comportements.

SURVEILLANCE DES RÉSEAUX POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE ET LE PATRIMOINE

Pilotage par la réduction de la pression de distribution

La modulation des pressions constitue un moyen d'action imparable pour protéger les réseaux.
L'enjeu est de maintenir la pression la plus basse possible dans le temps sans jamais impacter l'usager.
Plus le pilotage est fin, plus les économies réalisées sont importantes, grâce à la baisse des fuites.
En réduisant la pression interne des canalisations, la durée de vie du patrimoine est très nettement augmentée.

De nouveaux capteurs pour détecter les phénomènes transitoires

Les phénomènes transitoires de pression sont des phénomènes de très courte durée mais de forte intensité. Provoqués par les systèmes de pompage des usines ou par certains équipements de process industriels, ils sur-sollicitent le réseau et à long terme accentuent sa fragilité.

Pour le service, le système d'alimentation et les industriels représentent un risque particulier. Les **loggers Syrinix Pipeminder** identifient ces phénomènes et permettent de déclencher les actions correctives au plus vite. La campagne d'identification se déroule en 2 étapes :

- **Étape 1 :** durant les premiers mois, réalisation d'une campagne de mesure itinérante pour évaluer le nombre de phénomènes présents à l'échelle du territoire, leur localisation et leur intensité. Cette campagne a deux objectifs :
  - Préconiser le renouvellement ou l'ajustement éventuel d'équipements ciblés ;
  - Valider le choix des régulateurs de pression qui feront l'objet d'un suivi permanent de la pression.
- **Étape 2 :** les appareils sont ensuite installés à demeure sur les points qui sont apparus comme les plus sensibles, tout en pouvant rester mobilisés pour d'autres mesures ponctuelles.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

L'identification et la correction immédiate des phénomènes transitoires garantit la limitation des sinistres et la préservation de son patrimoine.

Mieux détecter les fuites

Pour améliorer la performance du réseau, il est essentiel de réduire au maximum le délai entre l'apparition et la détection des fuites. Pour ce faire, Veolia vous propose un nouveau type de compteurs à ultrasons innovants **Kamstrup**. Ils détectent les fuites sur le branchement en amont du compteur.

Cette solution révolutionnaire offre une mise sous surveillance des branchements optimisant ainsi le programme de renouvellement.

Avec la capacité de détecter les fuites sur les branchements dès leur apparition, la politique de renouvellement devient plus fine et plus crédible.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.2. Bilan qualité de l'eau

La transposition, fin 2022, de la nouvelle directive européenne sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a renforcé la responsabilité des collectivités, notamment dans la gestion préventive des risques. Ceci se traduit par l'obligation de réaliser un PGSSE et de mettre en œuvre une surveillance de la qualité de l'eau depuis la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Par ailleurs, quelques seuils réglementaires ont été modifiés et de nouveaux paramètres ont été ajoutés (dont les paramètres de vigilance et les PFAS) qui intégreront le programme d'analyses réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire en 2026.

C'est dans cet esprit que nous vous avons incité, dès 2023, à mesurer de nouveaux paramètres sujets à caution, pour lesquels des laboratoires proposent des analyses COFRAC, tels que des métabolites de pesticides (chlorothalonil R471811 et R417888) et les nouveaux paramètres réglementés (somme de 20 PFAS, chlorates, somme de 5 acides haloacétiques, 17-bêta-estradiol, bisphénol A, uranium). Ceci, en complément des analyses déjà réalisées dans le cadre du contrôle réglementaire exercé par l'Agence Régionale de Santé et de la surveillance réalisée par l'exploitant.

Focus CVM : A ces campagnes d'analyses peuvent s'ajouter la recherche ponctuelle de chlorure de vinyle monomère (CVM), un composé cancérigène, contenu dans les parois de certaines canalisations en PVC produites avant 1980. Cette recherche, dont la responsabilité a été transférée à la collectivité dans l'instruction de la Direction Générale de la santé DGS/EA4/2020/67, intervient sur les canalisations ayant été identifiées comme "à risque" lors de l'étape de repérage selon les critères de cette instruction.

Vous trouverez ci-dessous, un bilan synthétique de la qualité de l'eau de votre commune évaluée au regard des seuils réglementaires de qualité :

- **limites de qualité :** paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme sur la santé du consommateur ;
- **références de qualité :** valeurs cibles établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais, néanmoins, implique aussi la mise en œuvre d'actions correctives ;
- **valeur de vigilance :** substances qui pourraient poser un risque pour la santé selon une liste établie sur le plan européen ;
- **valeur indicative :** seuils d'action établis pour permettre la gestion de substances présentes dans l'eau, ils ne concernent, à ce jour, que des métabolites de pesticides ayant été déclarés non pertinents.

Des résultats plus détaillés sont proposés en partie 5 "Données détaillées – Qualité de l'eau".

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Tableau synthétique de la conformité des prélèvements

Limite de qualité	Contrôle Sanitaire		Surveillance du Délégataire		Contrôle sanitaire et surveillance du délégataire	
	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes
Microbiologique	38	38	99	99	137	137
Physico-chimie	6	6	0	0	6	6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Tableau de conformité des paramètres analytiques

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références
Paramètres soumis à Limite de Qualité				
Microbiologique	76	76	198	198
Physico-chimique	30	30		
Paramètres soumis à Référence de Qualité				
Microbiologique	152	152	396	393
Physico-chimique	420	420	396	395

Le métabolite du chlorothalonil, R471811, a changé de statut en début d'année 2024, il a été déclaré non pertinent par l'autorité sanitaire. A ce titre, il n'est donc plus considéré comme une limite de qualité mais comme une valeur indicative. Dans les tableaux précédents, sa conformité a été évaluée par rapport au seuil de 0,9 µg/L (valeur indicative) pour l'ensemble de l'année.

VERS UN RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DE L'EAU

En tant que personne responsable de la production et distribution de l'eau (PRPDE il vous revient de procéder au plus vite à la remise en conformité de la qualité de l'eau potable auprès de la population.

Les solutions de réduction de la pollution à la source sont, de toute évidence, les plus pertinentes à long terme, nous les mettons déjà en œuvre sur plusieurs territoires en France. Nous sommes à votre disposition pour vous en parler pour un déploiement sur votre territoire, cependant, ces solutions de réduction à la source sont inefficaces sur le court-moyen terme.

Afin de vous accompagner pour instaurer le retour à la conformité dans les plus brefs délais, nous vous proposons d'étudier au plus vite la capacité de traitement de ces paramètres non conformes au travers d'une étude Diabolo®. Cette étude vous permettra de trouver le meilleur compromis technico-économique pour éliminer ces composés de votre ressource en prenant en compte ses caractéristiques propres. Un résultat personnalisé peut ainsi être proposé dans les 2 mois.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.3. Bilan énergie

3.3.1. Consommation d'énergie à l'échelle du service

	2022	2023	2024	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	**7 447**	**8 053**	**9 130**	**13,4%**
Autres installations eau	6 331	7 047	7 433	5,5%
Réservoir ou château d'eau	1 116	1 006	1 697	68,7%

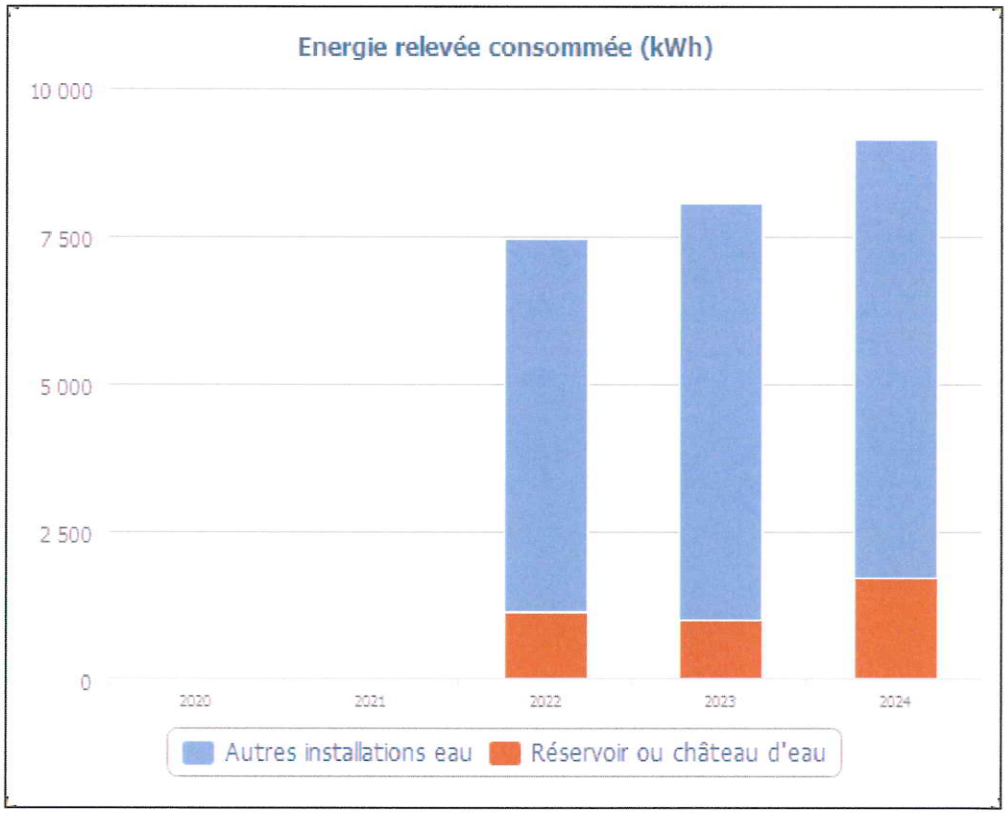

3.3.2. Sujets à engager pendant le contrat

L'amélioration du bilan énergétique du service passe soit par la réduction des consommations, soit par la production locale d'énergie.

Réduire ses consommations énergétiques

Veolia Eau France est certifiée ISO 50 001 pour son système de management de l'énergie.
Dans ce cadre, un plan d'actions national 2024-2027 fixe des objectifs de gains énergétiques en fonction de différents leviers actionnables.
Ainsi, après étude de chacun de ces leviers, des actions sont menées si elles s'avèrent utiles et favorables à l'environnement. Cela peut concerner le renouvellement de pompes ou des optimisations de pilotage des installations.
Les actions menées pour l'amélioration du rendement de réseau permettant également de réduire les consommations énergétiques.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Au-delà des actions classiques d'optimisation énergétique, le marché de l'électricité est de plus en plus dynamique et volatile.

Votre contrat bénéficie de tarifs négociés par nos services, de notre expertise sur la flexibilité électrique, de l'intégration de l'IA dans le pilotage contractuel.

PRODUIRE DES ÉNERGIES LOCALES POUR MAITRISER SES COÛTS D'ÉNERGIE ET RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE

Comme pour la réduction des consommations énergétiques, Veolia Eau France est votre partenaire pour saisir les opportunités de production d'énergies renouvelables et locales.

La mise en place d'une centrale solaire, c'est une énergie :

- compétitive sans subvention partout en France ;
- locale, bas carbone et décentralisée ;
- qui réduit le risque d'exposition au marché de gros et rend le service plus résilient et indépendant des énergies fossiles.

C'est un projet concret et exemplaire qui s'inscrit dans les ambitions de transition énergétique portées dans le PCAET.

Une centrale solaire couplée à un fonctionnement sur les heures solaires (8h - 18h) permet de produire jusqu'à 25% de la consommation des sites. Veolia vous accompagne sur l'ensemble de cette chaîne de valeur.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.4. Gestion de votre patrimoine

3.4.1. Bilan

Évolution du périmètre du contrat

Il n'y a pas eu de variations de périmètre recensées sur le contrat en 2024.

Principales interventions / opérations de renouvellement effectuées

Les principales opérations de renouvellement portent sur le réseau de distribution avec pas moins de 639 mL de canalisation renouvelées en 2 opérations : Albert Lepetit (DN150) et Gustave Pereire (DN300).

En complément, il est à noter les travaux qui concernent le réservoir de la Gare avec le renouvellement de :

- La vanne DN300 angle Beaudelet Nordling,
- Le Té-vanne en DN300 d'alimentation du réservoir
- L'ensemble vanne + le clapet DN300 de distribution

3.4.2. Sujets à engager pendant le contrat

Réforme des redevances

Le montant de la redevance de performance des réseaux d'eau potable à laquelle vous serez assujettis à partir de 2025 prend également en compte un indicateur de gestion patrimoniale.

Les paramètres pris en compte dans le calcul de cet indicateur concernent tant :

- la connaissance du patrimoine et sa mise à jour (existence de plan de réseau mis à jour régulièrement, connaissance des matériaux, diamètres et dates de pose notamment, présence d'information sur les fuites dans le SIG) ;
- que la mise en place et la réalisation de plans d'actions de recherche de fuites et de renouvellement de canalisations.

Nous sommes à votre disposition pour étudier les solutions les mieux adaptées afin d'optimiser l'impact de cet indicateur sur la redevance de performance des réseaux d'eau potable.

Méthode d'établissement des plans de renouvellement par analyse critique

L'évolution du contexte et des enjeux (contractuels, énergétiques, financiers, etc.) et un besoin partagé d'initier une démarche transparente et co-construite dans la gestion patrimoniale des installations d'eau potable que nous opérons, nous incitent à élaborer ou à ajuster les plans de renouvellement sur la base d'éléments objectifs, documentés et partagés.

Ainsi, nous proposons de déployer des analyses de risques afin de disposer d'éléments objectifs d'arbitrage et d'évolutions des pratiques de maintenance et renouvellement.
Ces analyses de risques, menées avec les équipes opérationnelles, proposent d'estimer pour chaque équipement : l'impact d'une défaillance (gravité) et l'état (vétusté, performance, obsolescence).

Nous disposons alors d'une matrice d'exposition des risques (cf. schéma ci-après) pour votre contrat qui propose une stratégie de maintenance et de renouvellement selon 4 niveaux.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Les bénéfices pour votre collectivité :

- meilleure maîtrise des risques ;
- justification objective et transparente des choix de renouvellement ;
- maîtrise des dépenses de renouvellement ;
- partage et codécision dans les arbitrages de gestion patrimoniale.

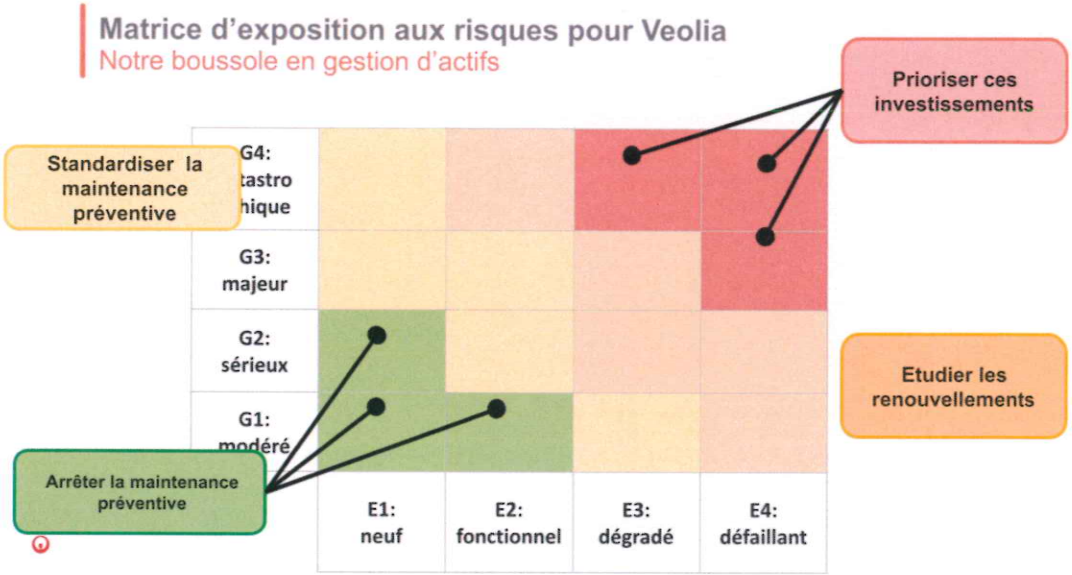

ABANDON DES TECHNOLOGIES RTC, 2G ET 3G

Les installations d'eau de tous types utilisent des équipements destinés à communiquer et partager des informations sur le fonctionnement des ouvrages et alerter en cas de dysfonctionnement. Ces données transitent sur des réseaux téléphoniques filaires de type RTC ou des réseaux sans fil.
A la résiliation automatique des services RTC, 2G et 3G les informations des ouvrages d'eau potable concernés par ces réseaux ne pourront plus parvenir aux délégataires et collectivités. Plus aucune alerte ne parviendra pour prévenir d'un manque d'eau par exemple.

L'abandon des technologies cuivre (RTC), 2G et 3G nécessite un remplacement par les équipes Veolia des équipements concernés afin de les basculer sur les nouveaux supports de communication (4G/5G).

A date, l'extinction des services 2G interviendra dès la fin 2025, tandis que la 3G prendra fin en 2028.
La fin des lignes RTC est programmée par zones géographiques, avec des échéances échelonnées jusqu'à 2030.

Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous présenter le plan d'actions de remplacement des équipements concernés ainsi que le devis associé.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.5. A L'ÉCOUTE DES CONSOMMATEURS

3.5.1. L'ANCRAGE LOCAL DE NOS CENTRES DE RELATION CLIENT

L'engagement de Veolia en faveur d'un service consommateurs de proximité et de grande qualité, s'appuyant sur la densité de son ancrage territorial, a permis à Veolia de devenir le premier opérateur de services d'eau et d'assainissement à obtenir l'attestation "Relation Client 100% France".
Veolia dispose de **11 centres de Relation Client implantés en France et répartis sur le territoire** : Liévin, Vaulx en Velin, Toulouse, Le Mans, Caen, Metz, Maxéville, Blagnac, Lyon, Montpellier, Saint Maurice.

3.5.2. VOLUMÉTRIE ET NATURE DES CONTACTS AVEC NOS ABONNÉS

CANAUX DE COMMUNICATION UTILISÉS PAR LES CONSOMMATEURS

Canal du contact	Nombre de demandes*
Téléphone	2 690
Internet	1 389
Courrier	128
Visite en Agence	83

*Nombre de demandes rattachées à un abonnement

OBJET DES DEMANDES DES CONSOMMATEURS

Motif de la demande	Nombre de demandes traitées*
Abonnement et Résiliation	990
Facture et Paiement	1 732
Qualité de l'eau	12
Intervention	1 194
Branchement	72
Service et divers	290

*Nombre de demandes rattachées à un abonnement

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

CONSOMMATEURS ABONNÉS DU SERVICE

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre total d'abonnés (clients)	**6 142**	**6 190**	**6 226**	**6 240**	**6 255**	**0,2%**
domestiques ou assimilés	6 201	6 186	6 222	6 236	6 243	0,1%
non domestiques	4	4	4	4	12	200,0%

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	95	111	123	87	81	-6,9%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	332	328	385	328	294	-10,4%
Taux de clients mensualisés	43,3 %	44,8 %	46,5 %	48,3 %	50,5 %	4,6%
Taux de clients prélevés hors mensualisation	23,1 %	22,1 %	21,8 %	21,7 %	21,1 %	-2,8%
Taux de mutation	5,5 %	5,4 %	6,3 %	5,3 %	4,8 %	-9,4%

3.5.3. SATISFACTION DES CONSOMMATEURS

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le jugement qu'ils portent sur ces services.
Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d'appréciation de nos prestations.

Le tableau ci-dessous présente les taux de satisfaction à l'échelle nationale.

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Satisfaction globale	87	73	76	79	78	-1
La continuité de service	94	92	93	91	90	-1
La qualité de l'eau distribuée	79	72	77	74	73	-1
Le niveau de prix facturé	59	53	51	52	53	+1
La qualité du service client offert aux abonnés	82	71	73	72	72	0
Le traitement des nouveaux abonnements	87	72	75	75	76	+1
L'information délivrée aux abonnés	71	72	68	68	70	+2

ENGAGEMENTS DE SERVICE

Nos 8 engagements témoignent de notre mobilisation quotidienne pour la qualité de l'eau et de celle de tous les services qu'attendent les consommateurs. Qu'il s'agisse d'intervenir quand ils ont besoin de nous, de les aider à gérer leurs budgets eau, de les accompagner dans l'adaptation à la transition écologique ou de mettre à leur disposition tous les canaux d'échanges dont ils souhaitent disposer.

Ces engagements sont détaillés sur le site internet eau.veolia.fr.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.5.4. Mise en place des compteurs télérelevés

Grâce aux compteurs télérelevés déployés sur votre territoire, les consommateurs ont désormais la possibilité de suivre très régulièrement leur consommation. Ils reçoivent des alertes en cas de fuites, leur permettant de faire des économies et, in fine, de participer directement et concrètement à la préservation de la ressource.

Nombre de fuites détectées et stoppées suite à l'envoi d'une communication client	396
M³ économisés	3 578

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.6. Résilience du territoire

3.6.1. Sécurité et gestion de crise

La cybersécurité de vos installations

La cybersécurité est, depuis plusieurs années déjà, un enjeu pour les entreprises et organisations. En effet, la transformation numérique, la multiplication des objets connectés, et l'interconnexion des réseaux avec de nombreux partenaires augmentent l'exposition des systèmes aux risques cyber.
Par ailleurs, l'évolution réglementaire avec la transposition de la Directive Européenne NIS2 en droit français va renforcer les obligations de sécurisation sur les installations d'eau et d'assainissement.

Nous vous proposons de commencer le projet de sécurisation de vos installations par un **premier diagnostic**, étape indispensable qui permettra d'établir une liste d'actions à lancer, classées en plusieurs niveaux de priorité.

Ce diagnostic nous permettra de vous présenter :

- une évaluation du niveau de maturité de cybersécurité de vos installations ;
- la définition du plan d'action de sécurisation spécifique à votre périmètre, afin de **garantir la continuité de service en cas d'attaque** ;
- et une évaluation des coûts nécessaires à la mise en place des actions de sécurisation et à la mise en conformité réglementaire.

Évaluer et gérer les risques : le PGSSE

Le Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE), rendu obligatoire par la réglementation d'ici 2027, impose d'évaluer les risques inhérents au service de distribution d'eau potable afin de mieux les anticiper pour mieux les gérer.
Outre les risques d'exploitation courants, il doit intégrer les risques externes (accident, intrusion, malveillance…), les risques futurs (baisse des ressources, évolution des volumes…) ainsi que tous les risques associés au changement climatique (sécheresse, précipitations, tempête, hausse du niveau des mers…).

Fort de notre expérience dans tous ces domaines et en tant que partenaire de la réflexion globale de l'État dans le cadre du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, nous pouvons vous accompagner dans la réalisation et le suivi de cette démarche.
Celle-ci doit être engagée dès 2025 pour prendre le temps de mener à bien toutes les études et réflexions utiles nécessaires à son élaboration sereine.

La première étape consiste à l'élaboration d'une étude de danger exhaustive afin d'élaborer le programme de suivi analytique de la qualité de l'eau.
En tant que PRPDE (Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau), la collectivité doit mener à bien cette étude au plus vite pour une présentation à l'ARS chaque début d'année. Nous nous engagerons à vos côtés pour la réalisation de cette étude et l'élaboration du programme de suivi.

Pour information, près de 20% des services d'eau potable de France ont d'ores et déjà engagé ces études (et à fin 2023, plus de 50% sur les métropoles, agglomérations et gros syndicats d'eau) ce qui leur permet de pleinement bénéficier des subventions disponibles, et d'être mieux accompagnés pour construire leur plan. Le rapprochement de la date d'échéance va mettre en tension le marché des bureaux d'étude et sans doute faire augmenter les tarifs de réalisation de ces études obligatoires.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.6.2. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'OUTIL RESILI'EAU, LA SCORE CARD RÉSILIENCE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

Pour faire face aux changements climatiques, 2 volets indissociables se présentent :

- l'**atténuation** : énergies renouvelables, économie de réactifs, valorisation des déchets, boues, mobilité durable, etc ;
- l'**adaptation** : les services d'eau vont devoir s'adapter à ce changement climatique à court et moyen terme.

Dans le cadre de l'adaptation, le Plan Eau du gouvernement a lancé 53 mesures.

L'outil Resili'Eau répond à la mesure 52 visant à mettre à disposition des collectivités territoriales un outil d'accompagnement à la prise de décision pour prendre la trajectoire d'adaptation des services d'eaux au changement climatique. C'est un outil simple, pédagogique, facile de mise en œuvre qui a été co-construit par Cerema et Veolia.

Il permet une évaluation du niveau de résilience des services d'eau et d'assainissement et identifie les actions à consolider ou réorienter dans le cadre d'une trajectoire de progrès. L'outil permet de faire une analyse 360° des services, en tenant compte des projections climatiques et des projets de territoires, et il permet de définir des solutions d'adaptation des plus opérationnelles aux plus innovantes, organisationnelles ou techniques. L'utilisation de cet outil se fait en proche partenariat avec la collectivité.

L'outil est porté par Cerema et Veolia et est apprécié des Agences de l'Eau.

Les bénéfices pour votre collectivité :

- analyse de situation à date dans une vision 360° (ressources et milieux, systèmes, organisation, crises, stratégie) ;
- identification des actions sans regret à poursuivre et des vulnérabilités à réduire ;
- accompagnement au plan d'actions en fonction du niveau de résilience des services par thématique ;
- aide au confortement de la prise de décision ;
- valorisation des actions engagées auprès des agences de l'eau, des habitants, des services.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Surveillance de la Ressource en Eau : Hubgrade Ressource

La tension sur la ressource en eau est de plus en plus prégnante chaque année sur les territoires. Outre les actions qui peuvent être menées sur la sobriété des usages, la surveillance des ressources en eau afin **d'anticiper les décisions à prendre** est devenue un enjeu capital.
C'est ce que permet Hubgrade Ressource.

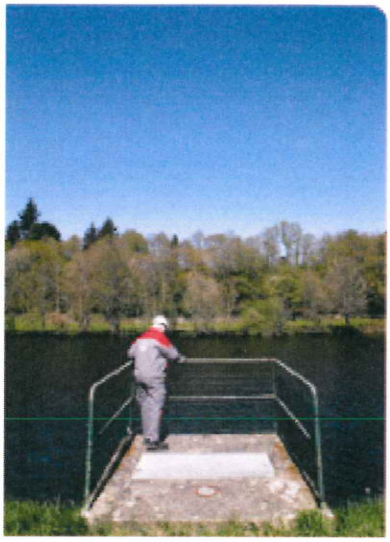

Hubgrade Ressource c'est pour vous :

- plus de connaissance par une vue globale et détaillée de l'évolution de chaque ressource en eau ;
- plus de sérénité au quotidien sur l'état réel de la situation à l'aide d'outils simples et compréhensibles pour des non-experts ;
- plus d'anticipation sur une éventuelle situation de crise grâce à la prédiction de la situation jusqu'à 6 mois à l'avance grâce à PrediNappes, notre solution unique co-conçue avec le BRGM.

Sécuriser la production et la distribution d'eau grâce aux Unités Mobiles de Traitement

L'évolution rapide de la situation sur de nombreux sujets de quantité ou de qualité de l'eau nécessite parfois **des interventions rapides** au détriment d'une réflexion approfondie.
Pour éviter cette situation de stress, Veolia dispose d'**Unités Mobiles de Traitement** pour répondre à ces différentes problématiques.

Ainsi ces équipements peuvent utilement permettre :

- de pérenniser l'alimentation en eau et la résilience du territoire ;
- une action rapide à mettre en place en cas de crise ;
- une optimisation des investissements en toute sérénité.

Nous mettons ces équipements à votre disposition si nécessaire afin de faciliter une éventuelle gestion de crise ou une prise de décision en toute sérénité.

Sobriété des usages

Afin de faire face aux conséquences du dérèglement climatique, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du Plan Eau de mars 2023, une série de mesures visant un objectif global de réduction de 10% des prélèvements d'eau dans le milieu naturel pour les prochaines années afin de préserver les ressources. Cet objectif général est décliné dans les programmes d'adaptation de chaque Agence de Bassin et vise en particulier les prélèvements réalisés pour produire l'eau potable.

Parmi les différentes mesures annoncées figure notamment l'incitation à des économies d'eau et à la sobriété pour l'ensemble des catégories de consommateurs, qui viendra renforcer la **baisse structurelle des volumes d'eau consommés.** Il est donc nécessaire de définir la trajectoire que souhaite prendre votre collectivité pour l'accompagner et y faire face.

L'incitation et l'accompagnement à la baisse des volumes de consommation peuvent s'établir sur différents axes de travail, sans se limiter aux actions réalisées pour limiter les fuites sur le réseau de distribution :

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- l'amélioration de la connaissance des consommations avec la remontée de données télé relevées et la mise à disposition des données de l'observatoire des usages établi par Veolia ;
- la création de **supports de sensibilisation** à destination de l'ensemble des parties prenantes s'appuyant sur les sciences comportementales ;
- la réalisation d'**audits de consommation en eau** pour les grands équipements et bâtiments industriels du territoire et la mise en place de **conventions de sobriété hydrique** ;
- l'accompagnement à l'**équipement en dispositifs hydro-économes** auprès des consommateurs domestiques et bâtiments publics ;
- le développement d'une **ingénierie tarifaire** qui permet de responsabiliser les plus grands consommateurs du territoire.

Sur ce dernier point, il faut aussi anticiper les impacts de la baisse des consommations sur l'équilibre économique du service de l'eau potable (et pour la partie assainissement). **La baisse des volumes engendre une baisse des recettes, ce qui nécessite des ajustements tarifaires, à la fois incitatifs à la baisse des consommations mais aussi préservant une solidarité tarifaire avec les ménages les moins aisés.**

A cet effet, l'observatoire des usages travaille à l'analyse des données de consommation des territoires en général et du **vôtre en particulier**. Les données sont analysées **pour différents segments de consommateurs** (particuliers, habitat collectif, industriels, collectivités).

Veolia est en capacité de vous fournir une analyse historique fine sur plusieurs années ainsi qu'une vision prospective à moyen et long terme. En effet, à travers les expertises en data science et en prospective, des modèles de prédiction, permettant de projeter l'évolution des consommations à horizon annuel mais également à l'horizon de la durée du contrat, ont été élaborés. Grâce à la prise en compte de paramètres tels que la météorologie, la croissance démographique, l'attractivité économique, une appréciation fine des consommations par segments d'usagers est facilitée.
Ces données peuvent ensuite être mises en regard de celles issues d'une projection de l'état de la ressource en eau sur votre territoire.

Plusieurs territoires, de petites collectivités rurales à de grandes métropoles urbaines, ont fait de la sobriété l'un des axes forts de leur service d'eau !
Nous pouvons venir vous en présenter les retours d'expérience et étudier les propositions qui seraient adaptées à votre collectivité.

La Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) pour développer des eaux alternatives

La REUT BOX est une solution innovante de Veolia pour répondre au stress hydrique lié au dérèglement climatique. Il s'agit de pouvoir rapidement proposer une eau de substitution à l'eau potable sur des usages ciblés et d'alléger ainsi la pression sur les ressources naturelles.
La REUT BOX permet de traiter les eaux usées en sortie de station d'épuration (uniquement installée sur des STEP au rejet conforme).

Voici ses principales caractéristiques :

- elle est composée d'une filtration sur média, d'une désinfection UV et d'une chloration avant stockage ;
- elle est intégralement automatisée avec un minimum de besoins d'exploitation ;

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- elle a un faible encombrement au sol sur site, proposée soit en skid pour intégration dans des locaux existants, soit en container de 20 pieds.

C'est une solution modulaire, standardisée et évolutive qui permet de s'adapter aux besoins des usages internes comme externes.
Depuis 2022, plusieurs dizaines de collectivités, petites ou grandes, ont engagé la mise en place de REUT BOX pour des usages variés comme :

- substitution de l'eau potable sur une station d'épuration urbaine pour ses usages internes ou pour l'hydrocurage des réseaux d'assainissement ;
- nettoyage de voiries ;
- arrosage de stades, hippodromes, espaces verts et golfs ;
- irrigation de cultures (vignes, oliviers, maraichages, etc.) ;
- protection incendie, réserves en eau, ;
- complément d'eau de chaudière, d'eau de process, d'eau de refroidissement pour les industriels implantés sur votre territoire.

La mise en place de ces dispositifs, désormais largement subventionnés par les agences de l'eau, passe par un processus d'autorisations administratives que le plan Eau du gouvernement tend à simplifier.

Anticiper les phénomènes météorologiques importants

L'expertise d'exploitation des installations par Veolia, combinée aux années d'expériences de PREDICT dans l'anticipation et l'assistance au cours d'événements hydrométéorologiques permettent de s'organiser préventivement face à des phénomènes à risques pouvant être dommageables pour l'exploitation des infrastructures du territoire.
L'équipe d'experts PREDICT fournit des recommandations précises et adaptées aux besoins des exploitants Veolia pour l'activation des différents niveaux d'alerte avec des mesures de protection et de sauvegarde spécifiques, validés au préalable avec vos services.

Les bénéfices pour votre collectivité :

- assurer la sécurité des habitants et maintenir la continuité de la circulation routière ;
- garantir la sécurité des opérateurs Veolia en leur fournissant les informations nécessaires pour décider si une sortie d'astreinte est sécurisée ou non ;
- protéger votre patrimoine et les équipements essentiels qui servent à l'exploitation ;
- sécuriser les réseaux et les infrastructures vitales ;
- assurer la continuité du service par l'anticipation et l'organisation préventive ;
- assurer le retour progressif à la normale.

Adapter les infrastructures aux aléas climatiques

Déjà une réalité sur le territoire, le changement climatique va avoir dans la durée des répercussions profondes sur le service d'eau potable. Vagues de chaleur, sécheresses, tempêtes et fortes pluies vont en effet se succéder plus fréquemment et plus intensément qu'auparavant, avec des conséquences très concrètes :

- modification de la structure des sols, entraînant une dégradation des canalisations et des bâtis ;
- rupture de télécommunications ou d'alimentation électrique des installations ;
- échauffement des équipements électriques et électromécaniques, pouvant entraîner des départs de feux ou des casses plus fréquentes ;

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- raréfaction et dégradation de la qualité de la ressource en eau potable, avec une concentration accrue des polluants dans l'eau ;
- augmentation des besoins de rafraîchissement des populations, avec éventuel risque accru de street pooling ;
- etc.

Il est donc nécessaire de **mettre à jour le schéma directeur du service** pour évaluer les actions à engager à court, moyen et long terme. Cette mise à jour viendra notamment répondre aux mesures 9 et 10 du Plan Eau du Gouvernement, relatives à la déclinaison au niveau de chaque territoire :

- d'un plan d'adaptation au changement climatique ;
- de scénarios prospectifs sur les prélèvements en lien avec les SAGE et PTGE.

Face aux aléas climatiques, de nombreuses solutions et petits travaux sont bénéfiques pour renforcer la résilience des infrastructures du service, installations comme réseaux :

- **protection des automates programmables industriels et autres instruments électroniques sensibles** contre les fortes chaleurs, avec des solutions de monitoring et de rafraîchissement des locaux existants ;
- **protection des infrastructures implantées en lisière ou dans des forêts** à risque d'incendie avec la mise en place de réseaux d'humidification utilisant des eaux recyclées (REUT) ou création de réserves pour les pompiers ;
- **déploiement de solutions pour sécuriser l'approvisionnement en électricité** des installations les plus sensibles : solutions de sobriété énergétique (re-lamping par LED, pose de variateurs de vitesse CEE…), production autonome d'électricité (production solaire, groupes électrogènes…) ;
- **création d'îlots de fraîcheur et déploiement de solutions d'accès à l'eau** dans l'espace public ou les lieux d'habitat précaire ;
- **protection des canalisations contre le retrait gonflement des argiles**, avec des solutions de monitoring et des renouvellements ciblés avec des matériaux adaptés ;
- **protection des installations contre les inondations**, via des solutions de protection physique du bâti, la mise en sécurité des équipements critiques, l'installation de capteurs de niveau d'eau en extérieur, etc. En particulier, une solution de sécurisation physique existe pour les bâtiments les plus sensibles : il s'agit d'une solution technique de protection du bâti, installée autour de l'infrastructure à protéger, qui agit comme une barrière de protection permanente. Son activation est automatique et passive (sans électricité). Ce dispositif préventif dispose d'un atout supplémentaire majeur : il est totalement invisible une fois installé. Innovant et efficace, ce dispositif anti-inondation est adaptable à tous types de constructions en zone à risques. Cette barrière isole de l'eau l'infrastructure pendant toute la durée du sinistre. Déclenché automatiquement lors d'une inondation, il peut aussi inclure un dispositif manuel d'activation en option. Performant en zone inondable, il s'adapte à différents types d'aléa d'inondation : le ruissellement pluvial urbain, les débordements de cours d'eau, les inondations et les submersions marines. C'est un système réutilisable de protection des inondations ;
- **tropicalisation des armoires électriques et des automates**.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

NOS PROPOSITIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

Face au déclin du vivant, qui est essentiel à la régulation du climat, à la santé et à l'accès à des ressources de qualité, le service d'eau a un vrai rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité du territoire.
En raison des importantes surfaces d'espaces verts incluses dans le périmètre du contrat, et dans un souci d'exemplarité du service public, Veolia vous propose d'engager des actions ciblées à l'efficacité éprouvée :

- **réalisation d'un Audit Biodiversité par un tiers expert** pour mieux connaître votre patrimoine naturel, le relier à la trame verte et bleue plus globale du territoire, et in fine cibler les actions à mener pour avoir un effet levier maximal sur la biodiversité et communiquer auprès de vos administrés ;
- **élaboration d'un plan de gestion différenciée des espaces verts**, qui garantit un entretien respectueux de la biodiversité, tout en tenant compte des différents usages des sites ;
- **déploiement du suivi automatisé de la santé des écosystèmes des sites avec LEKO :** fruit d'une collaboration entre Veolia et le Muséum National d'Histoire Naturelle, LEKO est un service qui permet d'écouter la biodiversité autour d'un point donné pour en déduire l'état de santé des écosystèmes. Il s'appuie pour ce faire sur des groupes bio-indicateurs que sont les chauves-souris, les sauterelles et les oiseaux. Grâce à un capteur acoustique qui fonctionne en permanence, les données générées permettent de comparer, dans le temps ou l'espace, l'évolution des communautés de ces espèces bio-indicatrices, et ainsi :
  - d'évaluer les impacts d'aménagements programmés, de changements des modalités de gestion des espaces verts, de changement des systèmes d'éclairage… ;
  - de cataloguer une partie du patrimoine biodiversité, pour permettre notamment la prise en compte des espèces les plus menacées.

  Un affichage web permet de suivre dans le temps de valoriser les résultats obtenus. Les données collectées sont versées à l'inventaire national du patrimoine naturel ;
- **mise en œuvre d'aménagements techniques légers pour la faune ou de projets de végétalisation**, sur la base des résultats de l'Audit biodiversité : nichoirs à oiseaux, gîtes à chauves-souris, chandelles à pollinisateurs, passages pour la petite faune, espaces de renaturation, plantation de haies… ;
- **prise en compte du risque de pollution lumineuse** générée par le service d'eau, grâce à une cartographie des éclairages extérieurs des sites permettant de cibler les sites et les actions les plus pertinents dans un double souci de préservation de la biodiversité et d'économies d'énergie !

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

3.6.3. Volet social

Diagnostic territorial d'accès à l'eau

Au 01 janvier 2025 chaque collectivité doit avoir établi un diagnostic territorial d'accès à l'eau recensant toutes les personnes qui n'ont pas aujourd'hui un accès direct à l'eau potable public afin de proposer un plan d'action pour y remédier.

Pour ce diagnostic qui comprend un volet technique (réseau de distribution, forage privatif, fontaine publique…) et un volet social (personnes non sédentaires, isolées ou de passage…), nous vous proposons de réaliser cette étude, avec les propositions de travaux associés.

Engagements sociaux spécifiques au contrat

Chèques Eau : Le Syndicat a fait doter le fonds de solidarité locale eau d'un montant annuel de 5 k€. Ce montant est alloué aux abonnés qui en font la demande auprès de leur CCAS et après validation par ces derniers du montant de l'aide à accorder. Ce fonds n'est pas utilisé à hauteur de sa dotation.

En 2024, 2 attributions de « chèques eau » ont été réalisées pour un montant total de 656.28 €.
Au 31/12/2024, le solde positif de ce fonds se montait à 10 275.78 €

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4.1. LE COMPTE ANNUEL DE RÉSULTAT DE L'EXPLOITATION DE LA DÉLÉGATION

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

4.1.1. LE CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et des charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières ». Les données ci-dessous sont en Euros.

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIB. DES EAUX — Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation
Année 2024
(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: V7200 - OZOIR EAU — Eau

LIBELLE	2023	2024	Ecart %
PRODUITS	**2 514 868**	**2 612 247**	**3,87 %**
Exploitation du service	1 712 320	1 768 629	
Collectivités et autres organismes publics	691 996	769 387	
Travaux attribués à titre exclusif	79 809	42 920	
Produits accessoires	30 743	31 311	
CHARGES	**2 671 131**	**2 937 492**	**9,97 %**
Personnel	349 140	357 976	
Energie électrique	1 297	502	
Achats d'eau	833 183	982 121	
Produits de traitement	0	897	
Analyses	1 264	4 606	
Sous-traitance, matièreset fournitures	214 696	192 989	
Impôts locaux et taxes	10 448	9 125	
Autres dépenses d'exploitation	152 232	161 130	
télécommunications, poste et telegestion	*13 319*	*11 525*	
engins et véhicules	*38 701*	*42 518*	
informatique	*43 724*	*49 163*	
assurances	*6 381*	*19 157*	
locaux	*38 584*	*34 135*	
autres	*11 524*	*4 634*	
Redevances contractuelles	2 949	3 272	
Contribution des services centraux et recherche	64 642	50 323	
Collectivités et autres organismes publics	691 996	769 387	
Charges relatives aux renouvellements	241 254	250 377	
pour garantie de continuité du service	*5 251*	*5 324*	
fonds contractuel (renouvellements)	*236 003*	*245 053*	
Charges relatives aux investissements	41 793	75 591	
programme contractuel (investissements)	*41 793*	*75 591*	
Charges relatives aux compteurs du domaine privé	48 192	56 156	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement	18 044	23 039	
RESULTAT AVANT IMPOT	**- 156 263**	**- 325 246**	**NS**
RESULTAT	**- 156 263**	**- 325 245**	**NS**

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 — 03/03/2025

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4.1.2. L'ÉTAT DÉTAILLÉ DES PRODUITS

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE :
Les données ci-dessous sont en Euros.

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIB. DES EAUX **Version Finale**

Etat détaillé des produits (1)
Année 2024

Collectivité: V7200 - OZOIR EAU **Eau**

LIBELLE	2023	2024	Ecart %
Recettes liées à la facturation du service	1 695 474	1 755 645	3,55 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*1 682 461*	*1 713 777*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*13 012*	*41 867*	
Autres recettes liées à l'exploitation du service	16 847	12 984	-22,93 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*16 847*	*12 984*	
Exploitation du service	**1 712 320**	**1 768 629**	**3,29 %**
Produits : part de la collectivité contractante	219 755	234 709	6,80 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*225 693*	*225 419*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 5 938*	*9 290*	
Droits de voirie	20 377	20 564	0,92 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*20 377*	*20 564*	
Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)	47 484	101 348	NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*49 859*	*84 233*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 2 374*	*17 114*	
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)	383 424	391 546	2,12 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*398 626*	*381 633*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 15 202*	*9 913*	
Redevance pour les Voies Navigables	20 956	21 220	1,26 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)	*21 698*	*20 696*	
dont variation de la part estimée sur consommations	*- 742*	*524*	
Collectivités et autres organismes publics	**691 996**	**769 387**	**11,18 %**
Produits des travaux attribués à titre exclusif	**79 809**	**42 920**	**-46,22 %**
Produits accessoires	**30 743**	**31 311**	**1,85 %**

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 03/03/25

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

La rubrique « Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » du CARE inclus dans le présent rapport annuel reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances dans le contexte réglementaire actuel.

L'amélioration des systèmes d'information et des processus de gestion de Veolia Eau permet de fournir maintenant une information complémentaire importante compte tenu des limites évoquées ci-dessus.

A ce jour, et en application du principe de prudence, les créances de plus d'un an à la clôture de l'exercice font l'objet d'une provision pour dépréciation dans les comptes sociaux de la Société. Cette provision (qui a pour seule vocation de constater « en temps réel » mais de manière estimative le coût des impayés) est reprise soit lorsque la créance est définitivement admise en irrécouvrable, soit si la créance est encaissée (la provision devenant alors sans objet).

Cette provision est calculée sur l'ensemble du stock de créances d'exploitation de plus d'un an de la Société, à hauteur de la part des produits qui lui revient (en excluant les produits facturés pour le compte des Collectivités et autres organismes) par application d'un taux moyen de produits propres uniforme pour toute la Société.

Cette provision comptable peut être déterminée sur les différents contrats de la Société en appliquant aux impayés de plus d'un an attachés à chaque contrat le taux moyen de produits propres ci-dessus.

Le chiffre ainsi obtenu pour 2024 pour le contrat ressort à **58 909 €**

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4.2. Situation des biens

4.2.1. Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

4.2.2. Inventaire des biens

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S'il y a lieu, l'inventaire distingue les biens propres du délégataire.

4.2.3. Situation des biens

La situation des biens est consultable dans la partie 5 "Données détaillées - Inventaire des installations et réseaux".

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte, ...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.
Ce compte rendu permet ainsi à la collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.
Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4.3. Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

4.3.1. Programme contractuel d'investissement

Les travaux neufs réalisés sur les installations

Installations électromécaniques	Montant en €	Réalisé dans l'exercice
MODÉLISATION		
6 MODULES APILINK	7 134.47	X
PRÉ LOCALISATEURS DE FUITE À POSTE FIXE		
PRÉ LOCALISATEURS DE FUITE À POSTE FIXE	113 432.81	X

4.3.2. Programme contractuel de renouvellement

Pas de programme contractuel de renouvellement

4.3.3. Les renouvellements réalisés

Les installations

Installations électromécaniques	Opération réalisée dans l'exercice	Mode de gestion
RÉSERVOIR DE LA GARE R. BEAUDELET 1500M3		
VANNE ET CLAPET DISTRIBUTION DN300	Renouvellement	Compte
VANNE DN300 AVEC BEAUDELET	Renouvellement	Compte

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

LES RÉSEAUX

Réseaux	Quantité renouvelée dans l'exercice	Mode de gestion
Réseau (lot)		
CANALISATION EAU DIA: 100- 149 MIL.: 4	32	Compte
CANALISATION EAU DIA: 150- 199 MIL.: 4	440	Compte
BRANCHEMENTS EAU DIA: 15- 20 MIL.: 4	21	Compte

Renouvellements réalisés par le délégataire :

Commune	Date de réalisation	Voie	Linéaire posé / Linéaire déposé	Diamètre
OZOIR-LA-FERRIERE	12/03/2024	Rue Albert Lepetit - Phase II	230	DN150
OZOIR-LA-FERRIERE	19/08/2024	Rue Albert Lepetit - Phase III	210	DN150

Renouvellements réalisés par la collectivité :
Pas de renouvellement réalisé par la Collectivité en 2024

LES BRANCHEMENTS

Commune	Date Intervention	Rue	Diamètre	Origine
OZOIR LA FERRIERE	27/08/2024	30 RUE DE LA CONCORDE	25	FUITE BRANCHEMENT PLOMB
OZOIR LA FERRIERE	19/08/2024	Rue Albert Lepetit	25	20 - Avec Rnvt Canalisation
OZOIR LA FERRIERE	12/03/2024	Rue Albert Lepetit	25	9 - Avec Rnvt Canalisation

4.3.4. LES AUTRES DÉPENSES DE RENOUVELLEMENT

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour la continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

DÉPENSES RELEVANT D'UN FONDS DE RENOUVELLEMENT

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU
CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -
FONDS DE RENOUVELLEMENT
(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
janv.-10	Dotation 2010			2116,50		2116,50
janv.-10	K		1,00000			
déc.-10	Pas de travaux sur l'exercice 2010				-	2116,50
	Solde Electromécanique					**2116,50**
janv.-10	Dotation 2010			50211,50		50211,50
janv.-10	K		1,00000			
déc.-10	Rue Mansard 5 branchements				11894,41	38317,09
	Solde Branchements hors plomb					**38317,09**
janv.-10	Dotation 2010			19435,50		19435,50
janv.-10	K		1,00000			
déc.-10	Pas de travaux sur l'exercice 2010				-	19435,50
	Solde Branchements plomb					**19435,50**
janv.-10	Dotation 2010			37500,00		37500,00
janv.-10	K		1,00000			
août-10	Rue Mansard 87 ml dn 60				92844,87	- 55344,87
août-10	Rue Berthelot 55 ml dn 60				54800,30	- 110145,17
	Solde Canalisations					**- 110145,17**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2010						**- 50276,08**
	Report du Solde					2116,50
janv.-11	Dotation 2011			4573,96		6690,46
janv.-11	K1+K2		1,080547			
janv.-11	Intérêts	0,38%		8,04		6698,50
	Pas de travaux sur l'exercice 2011				-	6698,50
	Solde Electromécanique					**6698,50**
	Report du Solde					38317,09
janv.-11	Dotation 2011			108511,77		146828,86
janv.-11	K1+K2		1,080547			
janv.-11	Intérêts	0,38%		145,60		146974,47
	Pas de travaux sur l'exercice 2011				-	146974,47
	Solde Branchements hors plomb					**146974,47**
	Report du Solde					19435,50
janv.-11	Dotation 2011			42001,94		61437,44
janv.-11	K1+K2		1,080547			
janv.-11	Intérêts	0,38%		73,85		61511,30
	Renouvellement 63 branchements plomb Ozoir				51132,02	10379,28
	Solde branchements plomb					**10379,28**
	Report du Solde					- 110145,17
janv.-11	Dotation 2011			81041,03		- 29104,15
janv.-11	K1+K2		1,080547			
janv.-11	Intérêts	0,38%			418,55	- 29522,70
déc.-11	Pas de travaux sur l'exercice 2011				-	- 29522,70
	Solde Canalisations					**- 29522,70**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2011						**134529,55**

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -

FONDS DE RENOUVELLEMENT

(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					6698,50
janv.-12	Dotation 2012			4627,45		11325,95
janv.-12	K1+K2		1,093184			
janv.-12	Intérêts	0,71%		47,56		11373,51
mars-12	Renouvellement Telegestion eau Chloration et comptage Kennedy				2062,25	9311,26
	Solde Electromécanique					**9311,26**
	Report du Solde					146974,47
janv.-12	Dotation 2012			109780,82		256755,28
janv.-12	K1+K2		1,093184			
janv.-12	Intérêts	0,71%		1043,52		257798,80
	Pas de travaux sur l'exercice 2012				-	257798,80
	Solde Branchements hors plomb					**257798,80**
	Report du Solde					10379,28
janv.-12	Dotation 2012			42493,16		52872,43
janv.-12	K1+K2		1,093184			
janv.-12	Intérêts	0,71%		73,69		52946,13
	Pas de travaux sur l'exercice 2012				-	52946,13
	Solde branchements plomb					**52946,13**
	Report du Solde					- 29522,70
janv.-12	Dotation 2012			81988,80		52466,11
janv.-12	K1+K2		1,093184			
janv.-12	Intérêts	0,71%			209,61	52256,50
	Pas de travaux sur l'exercice 2012				-	52256,50
	Solde Canalisations					**52256,50**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2012						**372312,68**
	Report du Solde					9311,26
janv.-13	Dotation 2013			4707,96		14019,21
janv.-13	K1+K2		1,112204			
janv.-13	Intérêts	0,04%		3,72		14022,94
	Pas de travaux sur l'exercice 2013				-	14022,94
	Solde Electromécanique					**14022,94**
	Report du Solde					257798,80
janv.-13	Dotation 2013			111690,86		369489,66
janv.-13	K1+K2		1,112204			
janv.-13	Intérêts	0,04%		103,12		369592,78
	Pas de travaux sur l'exercice 2013				-	369592,78
	Solde Branchements hors plomb					**369592,78**
	Report du Solde					52946,13
janv.-13	Dotation 2013			43232,48		96178,61
janv.-13	K1+K2		1,112204			
janv.-13	Intérêts	0,04%		21,18		96199,79
juin-13	Renouvellement 140 branchements plomb Ozoir				298949,74	- 202749,95
	Solde branchements plomb					**- 202749,95**
	Report du Solde					52256,50
janv.-13	Dotation 2013			83415,30		135671,80
janv.-13	K1+K2		1,112204			
janv.-13	Intérêts	0,04%		20,90		135692,70
	Pas de travaux sur l'exercice 2013				-	135692,70
	Solde Canalisations					**135692,70**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2013						**316550,47**

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -

FONDS DE RENOUVELLEMENT

(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					14022,94
janv.-14	Dotation 2014			4545,71		18568,65
janv.-14	K1+K2		1,073875			
janv.-14	Intérêts	0,04%		5,61		18574,26
	Pas de travaux sur l'exercice 2014				-	18574,26
	Solde Electromécanique					**18574,26**
	Report du Solde					369592,78
janv.-14	Dotation 2014			107841,75		477434,53
janv.-14	K1+K2		1,073875			
janv.-14	Intérêts	0,04%		147,84		477582,37
	Pas de travaux sur l'exercice 2014					477582,37
	Solde Branchements hors plomb					**477582,37**
	Report du Solde					- 202749,95
janv.-14	Dotation 2014			41742,60		- 161007,36
janv.-14	K1+K2		1,073875			
janv.-14	Intérêts	0,04%		81,10		- 160926,26
août-14	Renouvellement 243 branchements plomb Ozoir				495931,57	- 656857,83
	Solde branchements plomb					- **656857,83**
	Report du Solde					135692,70
janv.-14	Dotation 2014			80540,63		216233,32
janv.-14	K1+K2		1,073875			
janv.-14	Intérêts	0,04%		54,28		216287,60
	Pas de travaux sur l'exercice 2014				-	216287,60
	Solde Canalisations					**216287,60**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2014						**55586,40**
	Report du Solde					18574,26
janv.-15	Dotation 2015			4756,51		23330,77
janv.-15	K1+K2		1,123674			
janv.-15	Intérêts	0,99%		183,89		23514,66
oct.-15	Rénovation armoire electrique Réservoir chemin de la doutre 1500m3				5403,03	18111,63
	Solde Electromécanique					**18111,63**
	Report du Solde					477582,37
janv.-15	Dotation 2015			112842,71		590425,08
janv.-15	K1+K2		1,123674			
janv.-15	Intérêts	0,99%			- 4728,07	595153,15
nov.-15	Renouvellement 13 branchements Ozoir				17737,20	577415,95
	Solde Branchements hors plomb					**577415,95**
	Report du Solde					- 656857,83
janv.-15	Dotation 2015			43678,33		- 613179,50
janv.-15	K1+K2		1,123674			
janv.-15	Intérêts	0,99%		6502,89		- 606676,60
	Pas de travaux sur l'exercice 2015				-	- 606676,60
	Solde branchements plomb					- **606676,60**
	Report du Solde					216287,60
janv.-15	Dotation 2015			84275,55		300563,15
janv.-15	K1+K2		1,123674			
janv.-15	Intérêts	0,99%		2141,25		302704,40
déc.-15	Renouvellement 480 ml de canalisations				177456,08	125248,32
	Solde Canalisations					**125248,32**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2015						**114090,20**

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -

FONDS DE RENOUVELLEMENT

(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					18111,63
janv.-16	Dotation 2016			4576,79		22688,42
janv.-16	K1+K2		1,081216			
janv.-16	Intérêts	0,93%		168,44		22856,85
mai-16	Rnvt anti intrusion Réservoir de la gare r. beaudelet 1500m3				2078,88	20777,97
oct.-16	Rnvt analyseur chlore chloration et comptage kennedy				3912,05	16865,92
	Solde Electromécanique					**16865,92**
	Report du Solde					577415,95
janv.-16	Dotation 2016			108578,95		685994,90
janv.-16	K1+K2		1,081216			
janv.-16	Intérêts	0,93%		5369,97		691364,87
sept.-16	Rnvt 3 branchements Rue Gourdon				18302,79	672362,08
sept.-16	Rnvt 13 branchements Ave Le Notre				25797,40	647064,68
	Solde Branchements hors plomb					**647064,68**
	Report du Solde					- 606676,60
janv.-16	Dotation 2016			42027,95		- 564648,66
janv.-16	K1+K2		1,081216			
janv.-16	Intérêts	0,93%			5642,09	- 570290,75
	Pas de travaux sur l'exercice 2016				-	- 570290,75
	Solde branchements plomb					**- 570290,75**
	Report du Solde					125248,32
janv.-16	Dotation 2016			81091,20		206339,52
janv.-16	K1+K2		1,081216			
janv.-16	Intérêts	0,93%		1164,81		207504,33
sept.-16	Rnvt 460 ML Canalisation DN60 Ave Le Notre				70012,87	137491,46
déc.-16	Rnvt 450 ML Canalisations DN300 Ferme Pereire				225657,60	- 88166,14
	Solde Canalisations					**- 88166,14**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2016						**5473,71**
	Report du Solde					16865,92
janv.-17	Dotation 2017			4660,70		21526,62
janv.-17	K1+K2		1,101039			
janv.-17	Intérêts	0,90%		151,79		21678,42
mai-17	Rénov telegestion eau reservoir chemin de la doutre 1300m3				464,58	21213,84
mai-17	Rénov telegestion eau reservoir de la gare r. beaudelet 1500m3				464,58	20749,26
	Solde Electromécanique					**20749,26**
	Report du Solde					647064,68
janv.-17	Dotation 2017			110569,64		757634,32
janv.-17	K1+K2		1,101039			
janv.-17	Intérêts	0,90%		5823,58		763457,90
déc.-17	Rnvt 9 branchements				13536,60	749921,30
						749921,30
	Solde Branchements hors plomb					**749921,30**
	Report du Solde					- 570290,75
janv.-17	Dotation 2017			42798,49		- 527492,26
janv.-17	K1+K2		1,101039			
janv.-17	Intérêts	0,90%			5132,62	- 532624,88
	Pas de travaux sur l'exercice 2017				-	- 532624,88
	Solde branchements plomb					**- 532624,88**
	Report du Solde					- 88166,14
janv.-17	Dotation 2017			82377,93		- 5788,22
janv.-17	K1+K2		1,101039			
janv.-17	Intérêts	0,90%			793,50	- 6581,71
nov.-17	Rnvt 450 ml canalisations dn300 ave g pereire avec report de 14 brts				221414,89	- 227796,60
	Solde Canalisations					**- 227796,60**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2017						

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -

FONDS DE RENOUVELLEMENT

(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					20749,26
janv.-18	Dotation 2018			4657,48		25406,73
janv.-18	K1+K2		1,100278			
janv.-18	Intérêts	0,89%		184,67		25591,40
déc.-18	Rnvt analyseur de chlore reservoir de la gare r. beaudelet 1500m3				3088,98	22502,42
	Solde Electromécanique					**22502,42**
	Report du Solde					749921,30
janv.-18	Dotation 2018			110493,22		860414,52
janv.-18	K1+K2		1,100278			
janv.-18	Intérêts	0,89%		6674,30		867088,82
déc.-18	Rnvt 9 branchements				31349,46	835739,36
						835739,36
	Solde Branchements hors plomb					**835739,36**
	Report du Solde					- 532624,88
janv.-18	Dotation 2018			42768,91		- 489855,97
janv.-18	K1+K2		1,100278			
janv.-18	Intérêts	0,89%			4740,36	- 494596,34
	Pas de travaux sur l'exercice 2018				-	- 494596,34
	Solde branchements plomb					- **494596,34**
	Report du Solde					- 227796,60
janv.-18	Dotation 2018			82520,85		- 145275,75
janv.-18	K1+K2		1,100278			
janv.-18	Intérêts	0,89%			2027,39	- 147303,14
déc.-18	Rnvt 220 ml canas dn50 et report de 23 brts Ave Turgot à Ozoir				104480,37	- 251783,51
déc.-18	Rnvt 140 ml canas dn150 Quartie A Franck à Ozoir				99792,78	- 351576,29
	Solde Canalisations					- **351576,29**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2018						**12069,15**
	Report du Solde					22502,42
janv.-19	Dotation 2019			4649,98		27152,41
janv.-19	K1+K2		1,098508			
janv.-19	Intérêts	0,86%		193,52		27345,93
déc.-19	Pas de travaux sur l'exercice 2019					27345,93
	Solde Electromécanique					**27345,93**
	Report du Solde					835739,36
janv.-19	Dotation 2019			110315,47		946054,83
janv.-19	K1+K2		1,098508			
janv.-19	Intérêts	0,86%		7187,36		953242,19
déc.-19	Pas de travaux sur l'exercice 2019					953242,19
						953242,19
	Solde Branchements hors plomb					**953242,19**
	Report du Solde					- 494596,34
janv.-19	Dotation 2019			42700,10		- 451896,23
janv.-19	K1+K2		1,098508			
janv.-19	Intérêts	0,86%			4253,53	- 456149,76
	Pas de travaux sur l'exercice 2019					- 456149,76
	Solde branchements plomb					- **456149,76**
	Report du Solde					- 351576,29
janv.-19	Dotation 2019			82388,10		- 269188,19
janv.-19	K1+K2		1,098508			
janv.-19	Intérêts	0,86%			3023,56	- 272211,75
déc.-19	Rnvt 170 ml canas dn100 Quartie A Franck à Ozoir				158542,62	- 430754,37
déc.-19	Rnvt 140 ml canas dn150 Quartie A Franck à Ozoir				107231,24	- 537985,61
	Solde Canalisations					- **537985,61**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2019						

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -

FONDS DE RENOUVELLEMENT

(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 36871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					27345,93
janv.-20	Dotation 2020			4718,14		32064,06
janv.-20	K1+K2		1,114608			
janv.-20	Intérêts	0,87%		237,91		32301,97
déc.-20	Pas de travaux sur l'exercice 2020					32301,97
	Solde Electromécanique					**32301,97**
	Report du Solde					953242,19
janv.-20	Dotation 2020			111932,28		1065174,47
janv.-20	K1+K2		1,114608			
janv.-20	Intérêts	0,87%		8293,21		1073467,67
déc.-20	Rnvt 16 branchements				78777,54	994690,13
						994690,13
	Solde Branchements hors plomb					**994690,13**
	Report du Solde					- 456149,76
janv.-20	Dotation 2020			43325,93		- 412823,83
janv.-20	K1+K2		1,114608			
janv.-20	Intérêts	0,87%			3968,50	- 416792,33
	Pas de travaux sur l'exercice 2020					- 416792,33
	Solde branchements plomb					**- 416792,33**
	Report du Solde					- 537985,61
janv.-20	Dotation 2020			83595,60		- 454390,01
janv.-20	K1+K2		1,114608			
janv.-20	Intérêts	0,87%			4680,47	- 459070,48
avr.-20	Rnvt 254 ml canas dn60 quartier a franck à Ozoir				20767,49	- 479837,97
avr.-20	Rnvt 57 ml canas dn100 quartier a franck à Ozoir				11253,27	- 491091,24
juin-20	Rnvt 387 ml canas dn150 quartier a franck à Ozoir				216070,56	- 707161,80
nov.-20	Rnvt 195 ml canas dn250 quartier a franck à Ozoir				97622,69	- 804784,49
	Solde Canalisations					**- 804784,49**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2020						**- 194584,72**
	Report du Solde					32301,97
janv.-21	Dotation 2021			4633,63		36955,60
janv.-21	K1+K2		1,099370			
janv.-21	Intérêts	0,76%		245,49		37201,10
déc.-21	Pas de travaux sur l'exercice 2021					37201,10
	Solde Electromécanique					**37201,10**
	Report du Solde					994690,13
janv.-21	Dotation 2021			110402,03		1105092,17
janv.-21	K1+K2		1,099370			
janv.-21	Intérêts	0,76%		7559,65		1112651,81
déc.-21	Pas de travaux sur l'exercice 2021					1112651,81
						1112651,81
	Solde Branchements hors plomb					**1112651,81**
	Report du Solde					- 416792,33
janv.-21	Dotation 2021			42733,61		- 374058,72
janv.-21	K1+K2		1,099370			
janv.-21	Intérêts	0,76%			3167,62	- 377226,34
	Pas de travaux sur l'exercice 2021					- 377226,34
	Solde branchements plomb					**- 377226,34**
	Report du Solde					- 804784,49
janv.-21	Dotation 2021			82452,75		- 722331,74
janv.-21	K1+K2		1,099370			
janv.-21	Intérêts	0,76%			6116,36	- 728448,11
avr.-21	Pas de travaux sur l'exercice 2021					- 728448,11
	Solde Canalisations					**- 728448,11**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2021						

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -

FONDS DE RENOUVELLEMENT

(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					37201,10
janv.-22	Dotation 2022			4869,75		42070,85
janv.-22	K1+K2		1,150426			
janv.-22	Intérêts	0,77%		286,45		42357,30
déc.-22	Pas de travaux sur l'exercice 2022					42357,30
	Solde Electromécanique					**42357,30**
	Report du Solde					1112651,81
janv.-22	Dotation 2022			115529,23		1228181,04
janv.-22	K1+K2		1,150426			
janv.-22	Intérêts	0,77%		8567,42		1236748,46
déc.-22	Pas de travaux sur l'exercice 2022					1236748,46
						1236748,46
	Solde Branchements hors plomb					**1236748,46**
	Report du Solde					- 377226,34
janv.-22	Dotation 2022			44718,21		- 332508,14
janv.-22	K1+K2		1,150426			
janv.-22	Intérêts	0,77%			2904,64	- 335412,78
	Pas de travaux sur l'exercice 2022					- 335412,78
	Solde branchements plomb					**- 335412,78**
	Report du Solde					- 728448,11
janv.-22	Dotation 2022			86281,95		- 642166,16
janv.-22	K1+K2		1,150426			
janv.-22	Intérêts	0,77%			5609,05	- 647775,21
nov.-22	Rnvt 65ML cana DN 50 plume vert				25835,11	- 673610,32
nov.-22	Rnvt 90ML cana DN 75 plume vert				60281,94	- 733892,26
	Solde Canalisations					**- 733892,26**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2022						**209800,73**
	Report du Solde					42357,30
janv.-23	Dotation 2023			4571,52		46928,82
janv.-23	K1+K2		1,079972			
janv.-23	Intérêts	4,22%		1787,48		48716,30
sept.-23	Rénov vannes electriques passage a niveau				2359,32	46356,98
	Solde Electromécanique					**46356,98**
	Report du Solde					1236748,46
janv.-23	Dotation 2023			108434,03		1345202,49
janv.-23	K1+K2		1,079972			
janv.-23	Intérêts	4,22%		52190,79		1397393,28
déc.-23	Rnvt 27 branchements				69172,06	1328221,22
						1328221,22
	Solde Branchements hors plomb					**1328221,22**
	Report du Solde					- 335412,78
janv.-23	Dotation 2023			41979,59		- 293433,19
janv.-23	K1+K2		1,079972			
janv.-23	Intérêts	4,22%			14154,42	- 307587,61
	Pas de travaux sur l'exercice 2023					- 307587,61
	Solde branchements plomb					**- 307587,61**
	Report du Solde					- 733892,26
janv.-23	Dotation 2023			80997,90		- 652894,36
janv.-23	K1+K2		1,079972			
janv.-23	Intérêts	4,22%			30970,25	- 683864,61
nov.-23	Rnvt 215ML cana DN 150 Albert Petit Phase 1				156680,90	- 840545,51
nov.-23	Rnvt 220ML cana DN 300 Gustave Pereire				211025,69	- 1051571,20
	Solde Canalisations					**- 1051571,20**
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2023						

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU
CONTRAT V7200 OZOIR LA FERRIERE - EAU -
FONDS DE RENOUVELLEMENT
(PERIODE 01/07/2010 au 31/12/2025)

D0= 4233,00	Electromécanique
D0= 100423,00	Branchement hors plomb
D0= 38871,00	Branchement plomb
D0= 75000,00	Canalisation
Total = 218527,00	

Euros

Date	Libellé	Taux légal	Indice K	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
	Report du Solde					46356,98
janv.-24	Dotation 2024			4746,82		51103,80
janv.-24	K1+K2		1,121385			
janv.-24	Intérêts	4,92%		2280,76		53384,57
sept.-24	Rnvt vanne et clapet distribution dn300 reservoir de la gare				9826,29	43558,28
sept.-24	Rnvt vanne dn300 avec beaudelet reservoir de la gare				32198,85	11359,43
	Solde Electromécanique					11359,43
	Report du Solde					1328221,22
janv.-24	Dotation 2024			112612,85		1440834,06
janv.-24	K1+K2		1,121385			
janv.-24	Intérêts	4,92%		65348,48		1506182,55
déc.-24	Rnvt 21 branchements				77766,64	1428415,91
						1428415,91
	Solde Branchements hors plomb					1428415,91
	Report du Solde					- 307587,61
janv.-24	Dotation 2024			43589,36		- 263998,25
janv.-24	K1+K2		1,121385			
janv.-24	Intérêts	4,92%			15133,31	- 279131,56
	Pas de travaux sur l'exercice 2024					- 279131,56
	Solde branchements plomb					- 279131,56
	Report du Solde					- 1051571,20
janv.-24	Dotation 2024			84103,88		- 967467,33
janv.-24	K1+K2		1,121385			
janv.-24	Intérêts	4,92%			51737,30	- 1019204,63
nov.-24	Rnvt 230ML cana DN 150 et 20ML DN100 Albert Petit Phase 2				153705,60	- 1172910,23
nov.-24	Rnvt 210ML cana DN 150 et 12ML DN100 Albert Petit Phase 3				145850,80	- 1318761,03
	Solde Canalisations					- 1318761,03
Solde du Fonds de Renouvellement Général au 31/12/2024						- 158117,26

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4.4. LES ENGAGEMENTS À INCIDENCE FINANCIÈRE

Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l'exécution du service public et qui, à ce titre, peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.
Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».
Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

4.4.1. FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

RÉGULARISATIONS DE TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition[1], deux cas se présentent :
Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA[2] : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux Services de l'Etat.
Le nouvel exploitant n'est pas assujetti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

BIENS DE RETOUR

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

BIENS DE REPRISE

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

AUTRES BIENS OU PRESTATIONS

[1] art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

[2] Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

CONSOMMATIONS NON FACTURÉES ET RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AU DÉLÉGATAIRE À LA FIN DU CONTRAT

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. La continuité de service est à privilégier (maintien des calendriers de facturation ou de mensualisation jusqu'à l'échéance du contrat). Il y a donc lieu de définir avec la collectivité les modalités de facturation et de recouvrement des sommes dues ainsi que les modalités de reversement des encaissements qui s'imposeront le cas échéant au nouvel exploitant : part ancien contrat en prorata temporis, reprise des soldes de mensualisation des comptes clients. L'introduction de relevés spécifiques, notamment si le contrat se termine après une facturation d'acompte, peut être une option à considérer.

4.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire ;
- ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES AUX SALARIÉS DE VEOLIA

Les salariés de Veolia bénéficient :

- des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

PROTECTION DES SALARIÉS ET DE L'EMPLOI EN FIN DE CONTRAT

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la collectivité de prévoir les mesures appropriées.
Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier la masse salariale correspondante).
Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.
Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia se tient à la disposition de la collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents[3] affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

COMPTES ENTRE EMPLOYEURS SUCCESSIFS

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat ;
- concernant les salaires et notamment les salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs, …. ;
- concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail, etc.

[3] Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

4.5. ANNEXES FINANCIÈRES

LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DU CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L 3131-5 du même Code, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2023 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L'organisation de la Société Française de Distribution des Eaux au sein de la Région Ile de France de Veolia Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l'écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l'eau est au cœur des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d'être très attentif à la quête grandissante de transparence, de proximité et d'implication des collectivités ainsi qu'à la recherche constante d'efficacité et de qualité.

L'organisation de Veolia Eau articulée autour d'une logique « gLocale » répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d'innovation, de solutions et d'investissements (« global ») ; mais aussi en s'appuyant sur 59 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l'exploitation, toujours plus ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société Française de Distribution des Eaux a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d'autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau d'études techniques, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d'une Région ou d'un Territoire par exemple).

Aujourd'hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE national, au travers d'une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats d'une part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux successifs

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

de la Région, du Territoire, du Service Local), et d'autre part les charges de niveau National (contribution des services centraux).

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Faits Marquants

Modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction Consommateurs

Veolia Eau porte d'importantes ambitions en termes de relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l'ensemble des Territoires de compétences Consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels.
Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;
- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des consommateurs.

Ces plateformes disposent de nouveaux outils informatiques qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.
Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « Consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire).
Depuis l'exercice 2020, la répartition du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu'elle soit logée au National, en Région ou en Territoire), qui était jusqu'en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée, s'effectue désormais de la manière suivante :

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des factures d'eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n en tenant compte d'éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;
- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts (mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).

Ces coûts ainsi répartis au niveau d'un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction « Consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d'eau au prorata des factures émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).

Dans les rares situations où des services d'assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs des m^3 assujettis par une facture distincte de celle de l'eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles que les contrats d'eau potable tel que décrit ci-dessus.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Dans le cas le plus fréquent, où l'eau et l'assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d'eau et d'assainissement, et des conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part conventionnelle des coûts Consommateurs en contrepartie d'un produit de même montant porté sur la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.
- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat d'assainissement en contrepartie d'un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

Enfin, le coût des plateformes intègre l'ensemble des composantes qui s'y rattachent : coûts de personnel, de loyers, de sous-traitance… Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature de cette charge au sein desdites plateformes).

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l'exercice, une estimation s'appuyant sur les données de gestion est réalisée et comptabilisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés à la fin du mois de Novembre. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés dans les comptes de l'année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite « Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d'accorder - dans certaines conditions - des dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d'eau et d'assainissement du fait de fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d'exploitation de l'année où ils sont accordés.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre les produits facturés au cours de l'exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

- les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1),
- la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. § 2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité, soit de calculs à caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2).

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

2.1. **Charges exclusivement imputables au contrat**

Ces charges comprennent :

- les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1),
- un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes,
- les charges relatives aux travaux à titre exclusif.

2.1.1. **Dépenses courantes d'exploitation**

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d'année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais « d'environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, véhicules, autres charges).

2.1.2. **Charges calculées**

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique…, il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Fonds contractuel de renouvellement
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat ;

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent [4]au délégataire que pendant cette durée.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros constants, le montant de l'investissement initial.

S'agissant des compteurs, ces derniers comprennent, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

L'étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

- pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat en vigueur l'année de réalisation de l'investissement, majoré d'une marge. Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;

- pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme d'une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant compte des conditions de financement de l'année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à 2,25% pour les investissements réalisés en 2021, 3,90% pour l'année 2022 et 5,35% pour les investissements réalisés en 2023.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, pour tous les contrats ayant pris effet à compter du 1er janvier 2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice du coût de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.1.3. **Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement**

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, comptabilisées au cours de l'exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l'émission des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu'avec un décalage dans le temps l'évolution des difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4. **Impôt sur les sociétés**

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

4

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2023 correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux entreprises soit 25%, hors contribution sociale additionnelle de 3,3%.

2.2. **Charges réparties**

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisées au sein du GIE national.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. **Principe de répartition**

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent les coûts des plateformes Consommateurs. Les modalités de répartition des autres charges indirectes n'ont en revanche pas été modifiées.

Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la fonction Consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par une société mutualisée (GIE ou autre) à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées d'abord au GIE national du niveau donné puis réparties par celui-ci via leurs contrats aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée de l'exercice des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ce critère unique de répartition est déterminé par contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d'un contrat Hors Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la différence entre le volume d'activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d'achats d'eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE national peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d'eau supportent une quote-part forfaitaire de «peines et soins» égale à 5% de ces achats d'eau, qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.
Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

2.2.2. **Prise en compte des frais centraux**

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Territoires a été facturée au GIE national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats (à l'exclusion de la part relative à l'activité « Consommateurs » répartie comme évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)
Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€. Ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux achats d'eau en gros).

2.4. **Autres informations**

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en sous-traitance, exception faite des coûts liés aux plateformes Consommateurs. Cette règle ne trouve en revanche pas à s'appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d'expertise, ne sont pas membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation – et notamment les risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale – sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Notes :

1. *La donnée « nombre de contacts » n'est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau « Territoire ».*

2. *Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.*

3. *C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.*

DÉTAIL DES BIENS RENOUVELÉS ET VALORISÉS DANS LE CADRE DU/DES COMPTE(S) DE RENOUVELLEMENT

Voir opérations inscrites au fond de renouvellement §4.3.4

AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la collectivité.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5. Donnees detaillees

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.1. LE PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

En France, l'intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d'eau. La facture type de 120m³ représente l'équivalent de la consommation d'eau d'une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de OZOIR LA FERRIERE, l'évolution du prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors assainissement) par m³ **[D102.0]** pour 120 m³, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante :

Prix : 3,00 € TTC/m³

LA FACTURE 120 M³ DE LA COMMUNE

A partir du 1/1/2025, et conformément à l'arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996, la redevance "Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau)" figurera bien dans la rubrique "Organismes publics et TVA" de la facture transmise aux usagers. Pour des facilités de comparaison pour les besoins du RAD 2024, elle a été maintenue pour cette année dans la rubrique "Production et distribution de l'eau" dans le tableau de présentation de la facture du RAD. Elle sera réintégrée dans la bonne rubrique à partir du RAD 2025.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Tarifs au 01/01/2025

Traité 720 Commune Ozoir la Ferrière (77350)

		Qté	Euro Prix Unitaire HT	Euro Montant HT	Taux TVA
Distribution de l'eau					
Abonnement					
Abonnement (part distributeur)				74.48	5.5 %
Consommation					
Consommation (part distributeur)	(m3)	120	1.3485	161.82	5.5 %
Consommation (part communale)	(m3)	120	0.2600	31.20	5.5 %
TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU				267.50	
Collecte et traitement des eaux usées					
Abonnement					
Abonnement (part communale)				17.50	10. %
Consommation					
Consommation (part distributeur)	(m3)	120	0.481	57.72	10. %
Surtaxe assainissement SIAAP - V700F	(m3)	120	0.9950	119.40	10. %
Consommation (part communale)	(m3)	120	0.4600	55.20	10. %
Redevance assainissement SIBRAV - V737F	(m3)	120	0.1000	12.00	10. %
Redevance assainissement SYAGE - V727F	(m3)	120	0.4100	49.20	
TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES				311.02	
Organismes publics					
(taxes et redevances)					
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau)	(m3)	120	0.1001	12.01	5.5 %
Soutien d'étiage (EPTB Seine Grands Lacs)	(m3)	120	0.0215	2.58	5.5 %
Redevance Voies navigables de France	(m3)	120	0.0222	2.66	5.5 %
Redevance Performance Réseau Assainissement	(m3)	120	0.0267	3.20	10. %
Redevance consommation d'eau potable (Agence de l'eau)	(m3)	120	0.4600	55.20	5.5 %
Redevance performance réseaux eau potable	(m3)	120	0.0180	2.16	5.5 %
TOTAL ORGANISMES PUBLICS				77.81	
TOTAL HT de la Facture				**656.33**	**Euro**
TOTAL TTC de la Facture				**701.65**	**Euro**
Prix TTC du m3 hors abonnement				**5.03**	**Euro**

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.2. VISION PLURIANNUELLE DES VOLUMES

5.2.1. HISTORIQUE

L'ORIGINE DE L'EAU ALIMENTANT LE SERVICE : L'USINE D'ANNET-SUR-MARNE

Synoptique de fonctionnement

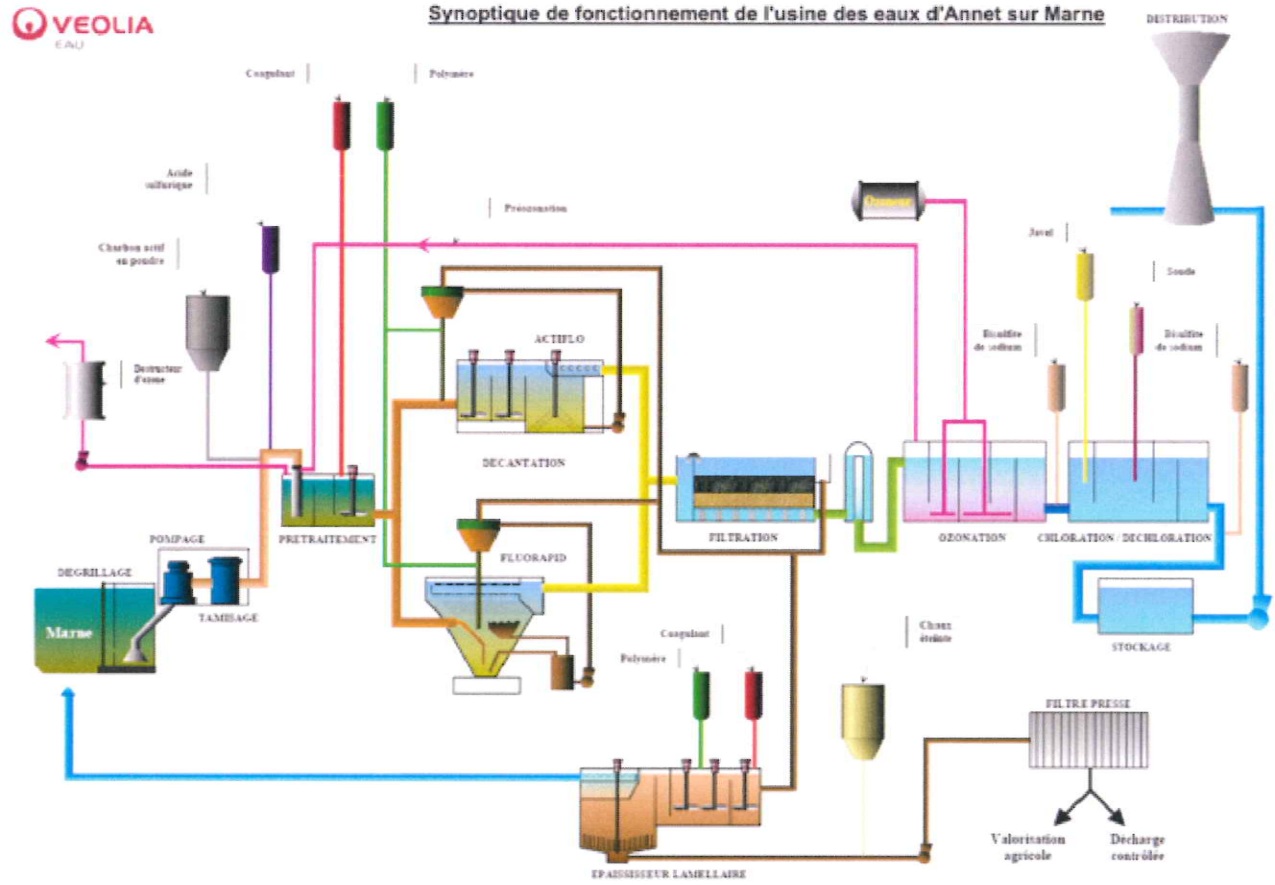

Caractéristiques générales de l'usine d'Annet-sur-Marne :

Protection des ressources	Arrêté préfectoral n°09/DAIDD/E/01 du 9 janvier 2009 Arrêté préfectoral modificatif n°09/DAIDD/E/56 du 18 septembre 2009 Arrêté préfectoral modificatif N°00/DAI/2/IC/057 du 29 février 2000 Arrêté complémentaire N°20/BC/163 du 22 octobre 2020
Surveillance des installations	Télésurveillance, vidéo surveillance et gardiennage
Capacité nominale de production	130 000 m^3/j
Capacité de stockage	12 000 m^3
Usine de production	Filière de traitement - Pompage eau brute - Dégrillage, tamisage - Prétraitement par injection de charbon actif en poudre, - Acidification par injection d'acide sulfurique - Préozonation - Coagulation - Décantation lestée sur décanteur de type Fluorapid et Actiflo - Filtration : sur filtres CAG et bicouche Sable/CAG - Ozonation

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

	- Déozonation - Chloration - Remise à l'équilibre de l'eau par injection de soude - Déchloration partielle - Refoulement Traitement des Eaux de Process - Traitement des eaux de lavage des filtres, - Traitement des eaux de recyclage des décanteurs Traitement des terres de décantation - Déshydratation par filtre presse des terres de décantation, - Mise en benne pour épandage agricole

Événement particulier : Un incendie survenu en septembre est à déplorer, réduisant pendant quelques jours la capacité de production de l'usine, l'alimentation a été garantie par la mise en place des secours via les interconnexions du Territoire.

Les travaux et études 2024 :

- Mise en service du décanteur 7 au dernier trimestre.
- Régénération des filtres et charbons
- Revamping automatismes et supervision usine en cours
- Chantier de mise en place de groupes froid sur filière ozone démarré
- Remise à niveau de l'ozoneur 1
- Mise ne place d'une climatisation et amélioration de la ventilation du local javel
- Audit sûreté

Surveillance de la rivière Marne

Dates des crues*

Périodes	Turbidité Maximale (NTU)	Turbidité Moyenne (NTU)	Débit maximal Marne (m^3/s)	Débit moyen Marne (m^3/s)
Du 3/01/2024 au 7/01/2024	208	123	359	292
Le 19/01/2024	141	57	236	219
Le 24/01/2024	82	54	229	218
Du 9 au 14/02/2024	156	99	255	241
Du 22 au 29/02/2024	279	161	431	345
Du 3 au 04/03/2024	72	67	440	433
Du 4 au 07/04/2024	262	67	348	294
Le 10/04/2024	100	80	341	337
Du 14 au 15/05/2024	222	137	220	203
Le 26/07/2024	103	77	102	99
Du 02 au 4/08/2024	148	111	219	178
Du 27 au 29/09/2024	233	163	323	259
Du 9 au 16/10/2024	350	155	449	309
Du 21 au 26/11/2024	80	66	212	184
Du 7 au 13/12/2024	197	110	284	235
Du 22 au 28/12/2024	368	147	295	255

* Crue = Turbidité moyenne journalière de l'eau de la Marne > à 50 NTU

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Année 2024

Turbidité maximale : 368 NTU le 23/12/2024
Turbidité moyenne annuelle : 37 NTU

Nombre de jours avec turbidité supérieure à 50 NTU : 63 jours

Débit de la Marne au 31/12/2024 (source hydro.eaufrance.fr):

- Débit maximum 449 m³/s
- Débit moyen 172 m³/s
- Débit minimum 44 m³/s

Pollutions : Aucune pollution de la ressource signalée en 2024

Qualité de l'eau

Ressource

	Contrôle Sanitaire		Surveillance par le Délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses Conformes	Nb total de résultats d'analyses	Nb de résultats d'analyses Conformes
Microbiologique	29	29	928	928
Physico-chimique	7833	7833	5 371	5 369

Détail des non-conformités sur la ressource : Un dépassement en COT a été constaté le 11/10/2024.
La qualité de l'eau produite est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité définies par la réglementation :

- Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur,
- Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d'actions correctives.

Production

	Contrôle Sanitaire		Surveillance par le Délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux Limites / Respect des Références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux Limites / Respect des Références
Paramètres soumis à Limite de Qualité				
Microbiologique	104	104	622	622
Physico-chimique	2 375	2 375	1 738	1 721
Paramètres soumis à Référence de Qualité				
Microbiologique	208	208	1 138	1 138
Physico-chimique	667	662	2 443	2 427
Autres paramètres analysés				
Microbiologique	0		8	
Physico-chimique	440		2 039	

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Non-conformité par rapport aux limites de qualité

Paramètres	mini	maxi	Nb NC Contrôle Sanitaire	Nb NC Contrôle Délégataire	Nb analyses Contrôle Sanitaire	Nb analyses Contrôle Délégataire	Limite de qualité et unité
Dichlorobenzamide-2,6	0,007	0,12	0	1	4	12	0.1 µg/l
Flufénacet ESA	0	0,432	0	3	4	13	0.1 µg/L
Flufénacet (Fluthiamide)	0	0,312	0	3	4	13	0.1 µg/l
Metaldéhyde	0	0,68	0	6	4	32	0.1 µg/l
Flufénacet OXA	0	0,205	0	1	4	12	0.1 µg/L
Pesticides totaux	0	1,283	0	3	4	40	0.5 µg/l

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

VOLUMES PRODUITS ET MIS EN DISTRIBUTION

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume acheté à d'autres services d'eau potable	1 136 392	1 122 262	1 106 563	1 090 482	1 115 228	2,3%
Volume vendu à d'autres services d'eau potable	21 719	5 980	18 669	17 386	13 402	-22,9%
Volume mis en distribution (m3)	**1 114 673**	**1 116 282**	**1 087 894**	**1 073 096**	**1 101 826**	**2,7%**

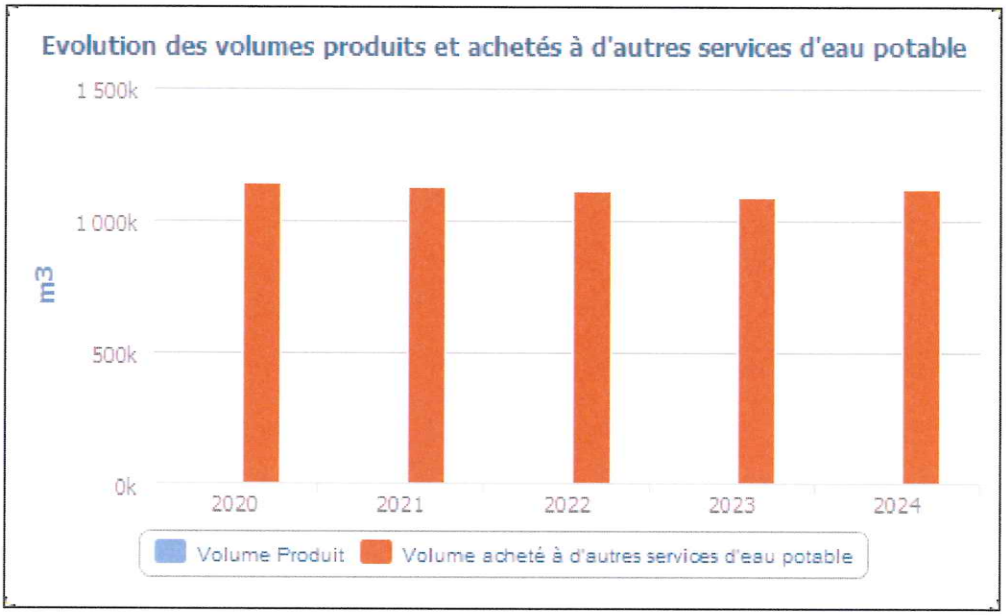

VOLUMES ACHETÉS À D'AUTRES SERVICES PAR POINT

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3)	**1 136 392**	**1 122 262**	**1 106 563**	**1 090 482**	**1 115 228**	**2,3%**
SFDE	1 136 392	1 122 262	1 106 563	1 090 482	1 115 224	2,3%
Autre(s) engagement(s) *					4	

** Retours d'eau depuis le point de comptage de vente d'eau à Férolles-Attilly au Clos de la Vigne*

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Volumes vendus

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu (m3)	**1 002 918**	**970 916**	**1 022 729**	**985 355**	**992 718**	**0,7%**
dont clients individuels	902 303	878 988	922 728	888 514	880 224	-0,9%
dont clients industriels	3 964	4 031	6 368	2 918	11 153	282,2%
dont clients collectifs	28 347	29 219	25 320	23 682	25 865	9,2%
dont volume vendu autres collectivités	21 719	5 980	18 669	17 386	13 402	-22,9%
dont bâtiments communaux	45 527	51 557	43 093	45 987	55 638	21,0%
dont appareils publics	1 058	1 141	851	1 139	736	-35,4%

Modification fin 2024 da la catégorisation des abonnés suite à la préparation de la bascule vers le nouvel environnement de gestion clientèle

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume vendu à d'autres services d'eau potable (m3)	**21 719**	**5 980**	**18 669**	**17 386**	**13 402**	**-22,9%**
SYND INTER COM ADDUC EAU CHEVRY FEROLLES					8 225	
Autre(s) engagement(s)	21 719	5 980	18 669	17 386	5 177	-70,2%

Volumes consommés

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3)	981 199	964 936	998 360	962 240	973 616	1,2%
Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3)	**981 199**	**964 936**	**998 360**	**962 240**	**973 616**	**1,2%**
Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels	366	365	365	365	366	0,3%
Volume consommateurs sans comptage (m3)	5 700	5 700	5 700	5 729	5 729	0,0%
Volume de service du réseau (m3)	3 486	3 288	3 302	3 449	3 470	0,0%
Volume consommé autorisé (m3)	**990 385**	**973 924**	**1 007 362**	**971 418**	**982 815**	**1,2%**
Volume consommé autorisé 365 jours (m3)	**990 385**	**973 924**	**1 007 362**	**971 418**	**982 815**	**1,2%**
Nombre de semaines de consommation	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,0%

Indicateurs de performance

	2020	2021	2022	2023	2024
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	**4,08**	**4,66**	**2,73**	**3,37**	**3,93**
Volume mis en distribution (m3) . . . . . A	1 114 673	1 116 282	1 087 894	1 073 096	1 101 826
Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . B	981 199	964 936	998 360	962 240	973 616
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	89 401	88 957	89 890	90 125	89 182

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

	2020	2021	2022	2023	2024
Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365	**3,80**	**4,38**	**2,45**	**3,09**	**3,65**
Volume mis en distribution (m3) . . . . . A	1 114 673	1 116 282	1 087 894	1 073 096	1 101 826
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . B	990 385	973 924	1 007 362	971 418	982 815
Longueur de canalisation de distribution (ml) L	89 401	88 957	89 890	90 125	89 182

Année	Rdt (%)	Objectif Rdt Grenelle2(%)	ILP (m^3/j/km)	ILVNC (m^3/j/km)	ILC (m^3/j/km)
2024	89,3	71,10	3,65	3,93	30,52

Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l'Agence de l'Eau, le rendement de réseau 2024 étant supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n'est pas nécessaire d'établir un plan d'actions spécifique. Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises en œuvre en 2024.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.3. INDICE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE

A L'ÉCHELLE DU SERVICE

	2020	2021	2022	2023	2024
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

PAR POINT DE POINT DE PRODUCTION

Pas de point de production sur le périmètre

PAR POINT D'ACHAT

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource pour chaque achat à un autre service d'eau potable	2020	2021	2022	2023	2024
SFDE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.4. Qualité de l'eau

Historique du contrôle officiel

	2020	2021	2022	2023	2024
Paramètres microbiologiques					
Taux de conformité microbiologique	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Nombre de prélèvements conformes	36	38	38	36	38
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	36	38	38	36	38
Paramètres physico–chimique					
Taux de conformité physico-chimique	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**
Nombre de prélèvements conformes	6	6	6	6	6
Nombre de prélèvements non conformes	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements	6	6	6	6	6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Intensité du programme d'analyse

	Contrôle sanitaire	Surveillance par le délégataire	Analyses supplémentaires
Microbiologique	228	594	24
Physico-chimique	632	396	16

Non-Conformités par rapport aux limites de qualité

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Non-Conformités par rapport aux références de qualité

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Bactéries Coliformes	0	6	0	3	38	99	0 n/100ml
Turbidité	0	4,71	0	1	38	99	2 NFU

Le métabolite du chlorothalonil, R471811, a changé de statut en début d'année 2024, il a été déclaré non pertinent par l'autorité sanitaire. A ce titre, il n'est donc plus considéré comme une limite de qualité mais

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

comme une valeur indicative. Dans les tableaux précédents, sa conformité a été évaluée par rapport au seuil de 0,9 µg/L (valeur indicative) pour l'ensemble de l'année.

Non-Conformités par rapport aux limites de qualité

Limite de qualité	Contrôle Sanitaire		Surveillance du Délégataire		Contrôle sanitaire et surveillance du délégataire	
	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes	Nb PLV total	Nb PLV conformes
Microbiologique	38	38	99	99	137	137
Physico-chimie	6	6	0	0	6	6

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Non-Conformités pour les paramètres soumis à une valeur indicative

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Non-Conformités pour les paramètres soumis à une valeur de vigilance

Paramètre	Mini	Maxi	Nb de non-conformités Contrôle Sanitaire	Nb de non-conformités Surveillance Délégataire	Nb d'analyses Contrôle Sanitaire	Nb d'analyses Surveillance Délégataire	Valeur du seuil et unité
Tous les résultats sont conformes							

Qualité de l'eau produite et distribuée

	Taux de conformité Contrôle Sanitaire	Taux de conformité Surveillance du Délégataire	Taux de conformité Contrôle Sanitaire et Surveillance du Délégataire
Microbiologique	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Physico-chimie	100,0 %	%	100,0 %

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Conformité des paramètres analytiques

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Le tableau suivant présente en détail les résultats d'analyses et leur conformité en distinguant les paramètres soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité[5] :

	Contrôle sanitaire		Surveillance par le délégataire	
	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références	Nb total de résultats d'analyses	Conformité aux limites / Respect des Références
Paramètres soumis à Limite de Qualité				
Microbiologique	76	76	198	198
Physico-chimique	30	30		
Paramètres soumis à Référence de Qualité				
Microbiologique	152	152	396	393
Physico-chimique	420	420	396	395

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Le Détail des résultats d'analyse est présenté dans le tableau ci-après

ZD - ROISSY/OZOIR

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Bact et spores sulfito-rédu	0		0	137	n/100ml	= 0
Bact Revivifiables à 22°C 68h	0		35	137	n/ml	
Bact Revivifiables à 36°C 44h	0		14	137	n/ml	
Bactéries Coliformes	0		6	137	n/100ml	= 0
E.Coli /100ml	0		0	137	n/100ml	= 0
Entérocoques fécaux	0		0	137	n/100ml	= 0
pH à température de l'eau	7.4	7.643	7.8	37	Unité pH	[6,5 - 9]
pH mesuré au labo	7.5	7.724	7.95	38	Unité pH	[6,5 - 9]
Aspect (0 = RAS, 1 sinon)	0		0	38	Qualitatif	
Couleur apr. filtration simple	0	0	0	38	mg/l Pt	<= 15
Couleur (0=RAS 1 sinon)	0		0	38	Qualitatif	
Odeur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	38	Qualitatif	
Saveur (0=RAS, 1 sinon)	0		0	38	Qualitatif	
Turbidité	0	0.145	4.71	137	NFU	<= 2
Température de l'eau	7	14.275	23.8	137	°C	<= 25
Fer total	0	1.553	19	38	µg/l	<= 200
Conductivité à 25°C	472	558.5	650	38	µS/cm	[200 - 1200]
Ammonium	0	0.002	0.07	38	mg/l	<= 0.1
Nitrites	0	0	0	3	mg/l	<= 0.5
Aluminium total	0	0.031	0.057	38	mg/l	<= 0.2
Antimoine	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Cadmium	0	0	0	3	µg/l	<= 5

[5] Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

ZD - ROISSY/OZOIR

Paramètre	Mini	Moyen	Maxi	Nb d'analyse(s)	Unité	Norme
Chrome total	0	0	0	3	µg/l	<= 50
Cuivre	0.37	0.387	0.4	3	mg/l	<= 2
Nickel	0	0	0	3	µg/l	<= 20
Plomb	0	0	0	3	µg/l	<= 10
Benzo(a)pyrène	0	0	0	3	µg/l	<= 0.01
Benzo(11,12)fluoranthène	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Benzo(1,12)pérylène	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Benzo(3,4)fluoranthène	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Fluoranthène	0	0.002	0.005	3	µg/l	
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx	0	0	0	3	µg/l	<= 0.1
Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub	0	0.002	0.005	3	µg/l	
Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs	0	0.002	0.005	3	µg/l	
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène	0	0	0	3	µg/l	
Chlore libre	0.04	0.391	1.02	137	mg/l	
Chlore total	0.12	0.493	1.09	137	mg/l	
Bromoforme	0.55	0.657	0.8	3	µg/l	
Chloroforme	5.3	8.633	14	3	µg/l	
Dibromomonochlorométhane	3.6	4.233	4.6	3	µg/l	
Dichloromonobromométhane	3.7	5.267	6.9	3	µg/l	
Trihalométhanes totaux (4)	13.15	18.79	26.12	3	µg/l	<= 100

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.5. Energie et réactifs

Consommation d'énergie par installation

Réservoir ou château d'eau

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Réservoir de La Doutre 214RE						
Energie facturée consommée (kWh)	528	525	528	528	527	-0,2%
Réservoir de REVM Ozoir La Gare						
Energie facturée consommée (kWh)	619	493	588	478	1 170	144,8%

Autres installations eau

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Autres installations eau: Chloration Kennedy						
Energie facturée consommée (kWh)		5 172	6 331	7 047	7 433	5,5%

Consommation de réactifs

Réactifs	Quantité	Commentaires
Chlore gazeux	324	KG

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.6. Inventaire des installations et réseaux

Réservoir ou château d'eau	Capacité de stockage (m3)
Réservoir de La Doutre	1 500
Réservoir de La Gare	1 500
Capacité totale	**3 000**

Autres installations eau

Autres installations eau : Chloration Kennedy

Inventaire des réseaux

	Canalisation distribution (ml)
Longueur totale tous DN (ml)	**89 182**
DN 32 (mm)	272
DN 40 (mm)	931
DN 50 (mm)	7 770
DN 60 (mm)	20 078
DN 63 (mm)	1 051
DN 65 (mm)	734
DN 75 (mm)	2 328
DN 80 (mm)	3 165
DN 100 (mm)	9 388
DN 110 (mm)	3 374
DN 125 (mm)	1 032
DN 140 (mm)	225
DN 150 (mm)	24 039
DN 160 (mm)	3 073
DN 180 (mm)	260
DN 200 (mm)	5 635
DN 250 (mm)	1 312
DN 300 (mm)	4 510
DN indéterminé (mm)	5

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

PYRAMIDE DES COMPTEURS

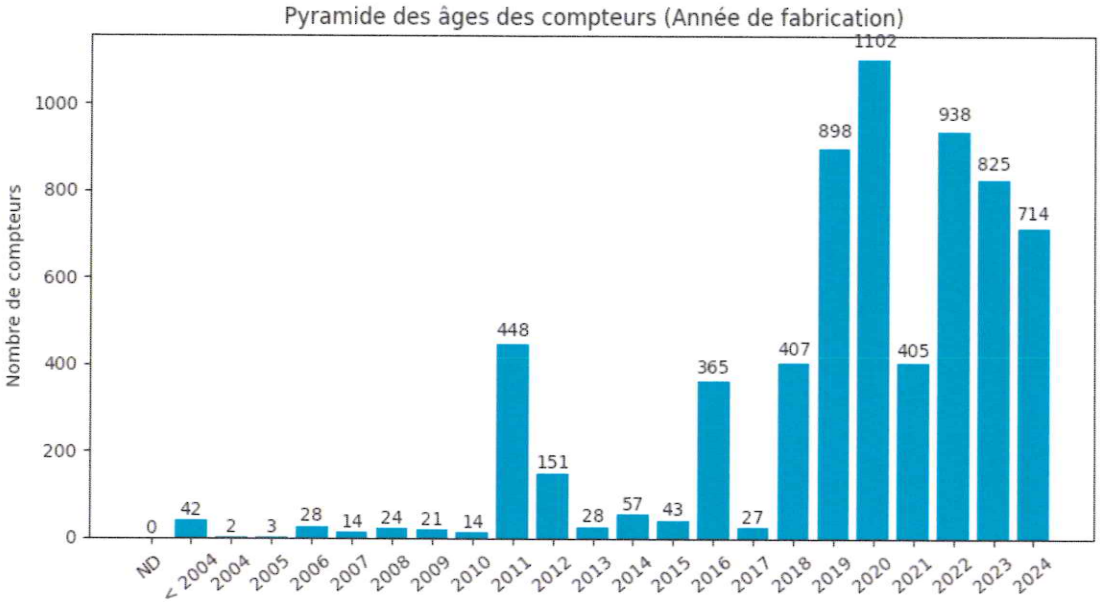

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.7. RÉSEAUX

INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau	2020	2021	2022	2023	2024
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux	118	118	118	118	118

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau		Barème	Valeur ICGPR
Code VP	**Partie A : Plan des réseaux (15 points)**		
VP.236	Existence d'un plan des réseaux	10	10
VP.237	Mise à jour annuelle du plan des réseaux	5	5
Code VP	**Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)**		
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques		Oui
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres.		95 %
VP.240	Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres		Oui
Combinaison des variables VP238, VP239 et VP240	Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)	15	15
VP.241	Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	15	13
	Total Parties A et B	**45**	**43**
Code VP	**Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)**		
VP.242	Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes	10	10
VP.243	Inventaire pompes et équipements électromécaniques	10	10
VP.244	Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux	10	10
VP.245	Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique	10	10
VP.246	Inventaire secteurs de recherche de pertes eau	10	10
VP.247	Localisation des autres interventions	10	10
VP.248	Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	10	10
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux	5	5
	Total:	**120**	**118**

La valeur de l'indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 décembre 2024 du descriptif détaillé tel qu'exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d'action visant à compléter l'inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif détaillé. Veolia se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d'action.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Inventaires des réseaux

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Canalisations						
Longueur totale du réseau (km)	126,0	125,7	126,7	127,0	126,4	-0,5%
Longueur de distribution (ml)	126 021	125 724	126 706	127 039	126 425	-0,5%
dont canalisations	89 401	88 957	89 890	90 125	89 182	-1,0%
dont branchements	36 620	36 767	36 816	36 914	37 243	0,9%
Equipements						
Nombre d'appareils publics	186	186	187	187	188	0,5%
dont poteaux d'incendie	147	147	147	147	147	0,0%
dont bouches d'incendie	39	39	40	40	40	0,0%
dont bouches d'arrosage					1	
Branchements						
Nombre de branchements	6 076	6 086	6 093	6 108	6 156	0,8%

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1	Qualification
Compteurs							
Nombre de compteurs	6 369	6 376	6 491	6 512	6 550	0,6%	Bien de reprise
dont sur abonnements en service	6 205	6 188	6 226	6 240	6 255	0,2%	
dont sur abonnements résiliés sans successeur	164	188	265	272	295	8,5%	

Renouvellement des canalisations

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	**1,04**	**0,54**	**0,50**	**0,52**	**0,55**
Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements) (ml)	89 401	88 957	89 890	90 125	89 182
Longueur renouvelée totale (ml)	1 059	0	310	439	639
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	1 059	0	155	439	439

Renouvellements des branchements

Renouvellement des branchements plomb	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre de branchements	6 076	6 086	6 093	6 108	6 156	0,8%
dont branchements plomb au 31 décembre (*)	0	0	0	0	0	0%
% de branchements plomb restant au 31 décembre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
Branchements plomb découverts pendant l'année	1	2		1	2	100,0%
Branchements plomb supprimés pendant l'année (**)	1	2	0	1	2	100,0%

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur
(**) par le Délégataire et par la Collectivité

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Renouvellements des compteurs

Renouvellement des compteurs	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre de compteurs	6 369	6 376	6 491	6 512	6 550	0,6%
Nombre de compteurs remplacés	969	569	859	777	729	-6,2%
Taux de compteurs remplacés	15,2	8,9	13,2	11,9	11,1	-6,7%

Réparation des fuites

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
Nombre de fuites sur canalisations	11	7	16	14	7	-50,0%
Nombre de fuites par km de canalisations	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-50,0%
Nombre de fuites sur branchement	5	4	14	10	6	-40,0%
Nombre de fuites pour 100 branchements	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-50,0%
Nombre de fuites sur compteur	31	40	62	39	28	-28,2%
Nombre de fuites sur équipement	0	0	0	0	0	0%
Nombre de fuites sur autre support	0	0		0	0	0%
Nombre de fuites réparées	47	51	92	63	41	-34,9%
Linéaire soumis à recherche de fuites	2 196	2 579	94 335	992	1 023	3,1%

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.8. Gestion des installations

Maintenance des installations

Lavage des réservoirs

Installation	Date	Conformité bactériologique
OZOIR Doutre (1500 m³)	26/02/2024	Conforme
OZOIR Gare (1500 m³)	07/06/2024	Conforme

Maintenance du réseau

La campagne annuelle de contrôle et d'entretien des hydrostab s'est déroulée en 2 phases. La première en juin 2024 et la seconde en novembre, pour les installations CATEC. Aucune anomalie fonctionnelle des installations n'a été relevée à l'issue de cette campagne.

Les recherches de fuites

Pas de campagne systématique de recherche de fuite initiée en 2024. Quelques recherches ponctuelles réalisées

Renouvellement des installations

Pas de renouvellement d'installation en 2024

Travaux neufs sur les installations

Pas de travaux neufs menés sur les installations du Syndicat en 2024

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Travaux neufs sur les réseaux, branchements et compteurs

Commune	Date	Adresse	Nb Branchements	Matériau / Diamètre (en mm)
OZOIR-LA-FERRIERE	22/04/2024	21 AVENUE GRIMELER	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	26/04/2024	66 AVENUE ARLUISON	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	24/05/2024	32 AVENUE GUYNEMER	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	06/08/2024	40 RUE ALBERT LEPETIT	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	02/09/2024	4 RUE LOUISE MICHEL	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	12/09/2024	38 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	18/09/2024	2 AVENUE DE LA CHESNAY	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	23/09/2024	111 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	24/09/2024	46 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	02/10/2024	5 RUE DES GLYCINES	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	09/10/2024	13 RUE FRANÇOIS COPPÉE	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	15/10/2024	36 AVENUE GUYNEMER	1	AEP
OZOIR-LA-FERRIERE	17/10/2024	49 AVENUE EDOUARD GOURDON	1	AEP

Correction apportée par rapport au document technique : suppression des branchements datant de 2023, intégrés par erreur au tableau de détail

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
093_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.9. Opérations de renouvellement, de maintenance et travaux réalisés

Renouvellement installations

Renouvellement clapet + vanne DN300 au réservoir de la Gare

Renouvellement patrimoine réseaux

Renouvellement de 439 mL DN150 rue Albert Lepetit (phases II et III) par le Délégataire (+ report de 29 branchements)
Renouvellement de 200 mL de DN300 av Gustave Pereire par le Syndicat (+ report de 9 branchements)

Renouvellement vannes réseaux

Commune	Description
OZOIR LA FERRIERE	DN300 angle Av. Henri Beaudelet et Av. Raoul Nordling par le Délégataire
OZOIR LA FERRIERE	Té 3 vannes DN300 en alimentation du réservoir de la Gare par le Délégataire

Travaux neufs délégataire installations

Pas de travaux neufs réalisés par le délégataire en 2024 sur le périmètre du Syndicat

Travaux neufs collectivité installations

Pas de travaux neufs réalisés par le Syndicat en 2024 sur ses installations

Travaux neufs délégataire réseaux

Pas de travaux neufs réalisés par le délégataire en 2024 sur le périmètre du Syndicat

Travaux neufs collectivité réseaux

Pas de travaux neufs réalisés par le Syndicat en 2024

Opérations de maintenance installations

Le détail des opérations de maintenance est présenté en annexe 6.7

Opérations de maintenance réseaux

Au n°46 avenue du Général Leclerc, remplacement de la tête de RPC cassée et branchement fermé (09/02/2024)

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Recherche de fuites

Commune	Date	Linéaire inspecté	Résultat
OZOIR-LA-FERRIERE	08/10/2024	46,53	Non
OZOIR-LA-FERRIERE	11/10/2024	119,07	Non
OZOIR-LA-FERRIERE	18/11/2024	33,64	Non
OZOIR-LA-FERRIERE	23/04/2024	108,11	Inconnu
OZOIR-LA-FERRIERE	03/05/2024	191,95	Inconnu
OZOIR-LA-FERRIERE	19/01/2024	285,86	Inconnu
OZOIR-LA-FERRIERE	17/01/2024	203,93	Inconnu
OZOIR-LA-FERRIERE	26/11/2024	33,64	Oui
TOTAL		**1 022,73**	

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

5.10. Les consommateurs de votre service

Données économiques

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux d'impayés	**1,04 %**	**1,68 %**	**1,38 %**	**0,97 %**	**2,56 %**
Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)	17 107	32 119	26 586	18 728	54 735
Montant facturé N - 1 en € TTC	1 640 684	1 917 119	1 928 595	1 924 627	2 135 852

	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social	4	9	7	10	5
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (€)	482,57	565,44	722,01	942,65	474,02
Volume vendu selon le décret (m3)	1 002 918	976 616	1 022 729	985 355	992 747

	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	52	58	71	77	106

Données consommateurs par commune

	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1
OZOIR LA FERRIERE						
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	20 500	20 383	20 726	20 921	20 887	-0,2%
Nombre d'abonnés (clients)	6 205	6 190	6 226	6 240	6 255	0,2%
Volume vendu (m3)	981 199	964 936	998 360	962 240	973 616	1,2%
Autre(s)						
Volume vendu (m3)		5 700	5 700	5 729	5 729	0,0%

Les interruptions non-programmées du service public de l'eau

	2020	2021	2022	2023	2024
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés)	**1,47**	**0,81**	**0,96**	**2,72**	**1,28**
Nombre d'interruptions de service	9	5	6	17	8
Nombre d'abonnés (clients)	6 142	6 190	6 226	6 240	6 255

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

La dématérialisation des factures

La relation consommateurs du service public d'eau ou d'assainissement associe aujourd'hui proximité et digitalisation, importance des contacts humains et simplicité des solutions numériques.
Permettre aux consommateurs de recevoir leurs factures sous format électronique est un marqueur simple et visible de la digitalisation au service des usagers.
La dématérialisation des factures d'eau contribue à la politique de développement durable des territoires, via la réduction de production de papier. C'est aussi une solution qui facilite le classement des factures et leur conservation dans l'espace personnel sécurisé en ligne, mis à la disposition des consommateurs.
Le taux de dématérialisation des factures correspond au nombre d'abonnements actifs pour lesquels la e-facture est active, divisée par le nombre d'abonnements actifs.

$$\text{Taux de e-facture sur actifs (\%)} = \frac{\text{Nombre d'abonnements actifs pour lesquels la e-facture est active}}{\text{Nombre d'abonnements actifs}}$$

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6. ANNEXES

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.1. Le synoptique du réseau

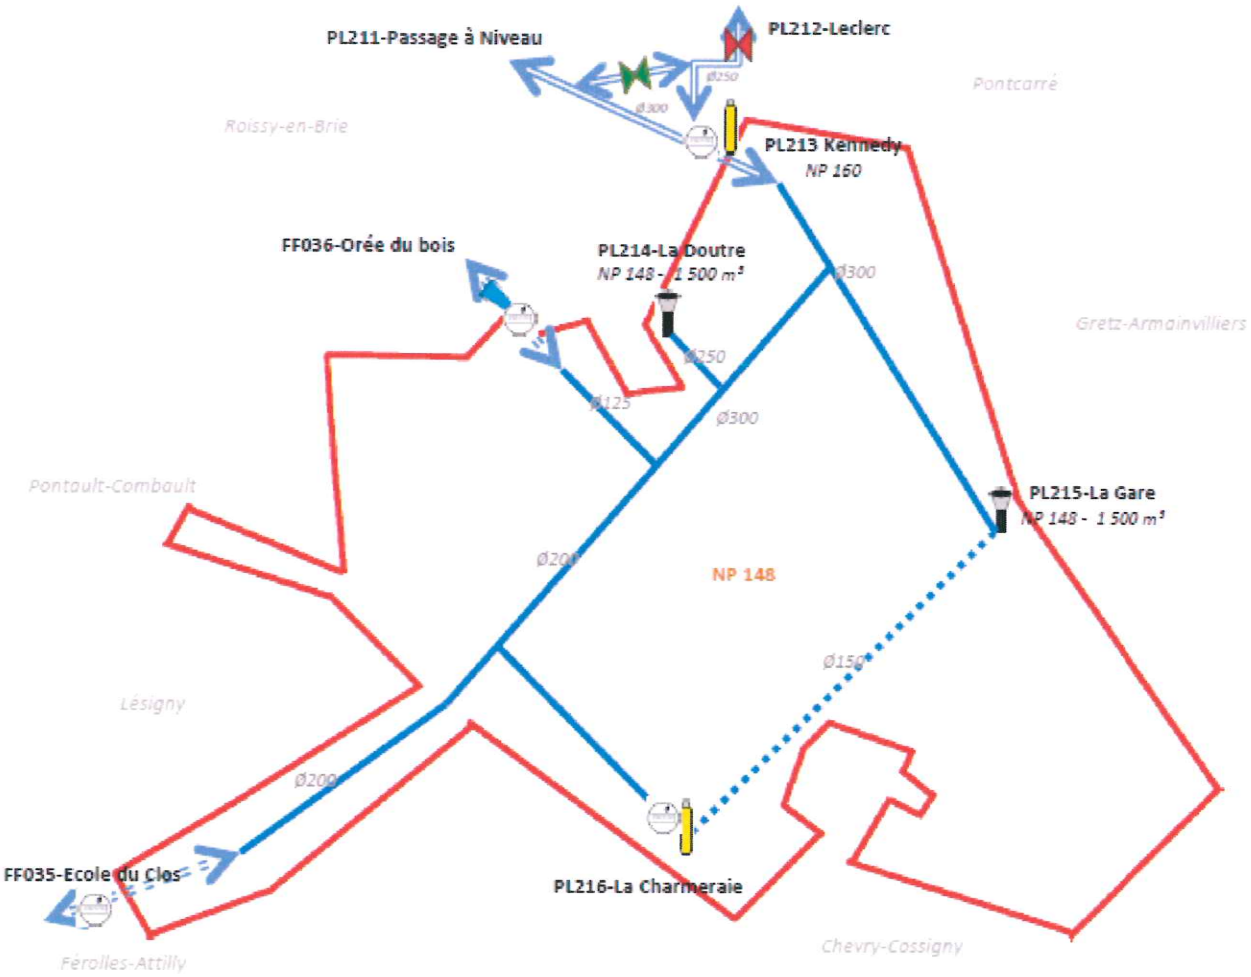

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.2. ATTESTATION D'ASSURANCE

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, Veolia a souscrit aux polices d'assurance suivantes :

- Assurance de responsabilité civile : cette assurance couvre Veolia des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement juridique, que Veolia est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui trouvent leur origine dans l'exécution de ses obligations.
- Assurance de dommages aux biens : cette assurance est souscrite par Veolia pour son propre compte. Elle a pour objet de garantir les biens affermés contre les dommages résultant de l'exploitation du service.

L'ensemble de ces attestations d'assurance est disponible sur simple demande de la Collectivité.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.3. Détail des textes réglementaires

Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service.

Commande Publique

Données essentielles à publier

Deux arrêtés publiés le 22 mars ont modifié ceux du 22 décembre 2022 relatifs respectivement aux données essentielles des marchés publics et aux données essentielles des contrats de concession. Ils ont pour objet d'étendre le régime de déclaration des données essentielles aux actes d'exécution, pris après le 1er janvier 2024, relatifs aux marchés publics notifiés et aux contrats de concession conclus avant cette date.

Dans leur version antérieure, les arrêtés du 22 décembre 2022 ne soumettaient pas au nouveau régime des données essentielles les actes d'exécutions relatifs aux contrats de la commande publique notifiés ou conclus après le 1er janvier 2024. Dès lors, ces actes d'exécution restaient soumis au régime fixé par le précédent arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique, posant par là même des difficultés pratiques et techniques.

Afin de remédier à ces difficultés, les arrêtés du 18 mars 2024 précisent que les données essentielles relatives aux actes spéciaux de sous-traitance, aux actes de sous-traitance modificatifs et aux modifications (pour les marchés publics), et aux modifications et aux données d'exécution (pour les contrats de concession) des contrats de la commande publique notifiés ou conclus avant le 1er janvier 2024 doivent être transmises et publiées dans les conditions fixées par les arrêtés du 22 décembre 2022 susmentionnés. Ces modifications entreront en vigueur le 1er mai.

- Arrêté du 18 mars 2024 ECOM2404396A modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
- Arrêté du 18 mars 2024 ECOM2404387A modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession

Seuil de dispense de publicité et mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Cette exception pour les marchés de travaux de moins de 100 000 €, instaurée par un décret en date du 28 décembre 2022, devait prendre fin au 31 décembre 2024. Le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024 proroge cette exception jusqu'au 31 décembre 2025.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Toutefois, les acheteurs bénéficiant de cette exception ont toujours l'obligation de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Simplification du droit de la commande publique

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, publié au Journal officiel du 31 décembre 2024, apporte des modifications au code de la commande publique afin notamment de simplifier l'accès des entreprises à la commande publique et d'assouplir les règles d'exécution financière des marchés publics, notamment :

- Les conditions de constitution et de modification de la composition de groupement dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue sont précisées (2142-3 du CCP) et rendues possibles sous réserve de :
  - de disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
  - de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.
- Il relève de 10 % à 20 % (3114-5 du CCP) la part minimale que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux, des marchés de partenariat et des contrats de concession. Il abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus par certains acheteurs avec une petite ou moyenne entreprise (2191-33 du CCP). Enfin, il intègre les mesures réglementaires d'application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s'agissant de la possibilité pour une entité adjudicatrice de rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l'Union européenne).

Services publics locaux

Modifications de principales instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales au 1er janvier 2025

Les instructions budgétaires et comptables M4 et M57 ont été modifiées à compter du 1er janvier 2025 en particulier pour tenir compte de la réforme des redevances des Agences de l'eau par un arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux et arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs. Les modifications portent en particulier sur la création de nouveaux comptes de redevances eau et assainissement

Etablissement des budgets verts locaux

Conformément à l'article 191 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, les collectivités doivent présenter un état annexé au compte administratif ou au compte financier unique intitulé "Impact du budget pour la transition écologique" pour les budgets principaux et les budgets annexes soumis aux instructions budgétaire et comptables M57 et M4 pour les collectivités et leurs groupements de plus de 3 500 habitants. Le décret du 16 juillet 2024 pris en application de l'article 191 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Ainsi, à partir de l'exercice 2024 la contribution aux objectifs de transition écologique doit être présentée pour certaines dépenses comme par exemple les réseaux de voirie, installations de voirie. Dès l'exercice 2025, la contribution aux objectifs de transition écologique doit être présentée pour toutes les dépenses réelles d'investissement (sauf annuités d'emprunt à l'exception de celles liées à la part investissements des marchés de partenariat).

Les objectifs de transition écologique correspondent aux 6 axes suivants : atténuation du changement climatique ; adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ; gestion des ressources en eau ; transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ; prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ; préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Service public de l'eau potable

Réforme des redevances des agences de l'eau

Cette réforme structurante a été adoptée dans la loi de finances de l'année 2024. Elle est effective à compter de l'année 2025 pour l'entrée en vigueur des douzièmes programmes des agences de l'eau (2025 - 2030). Plusieurs textes d'application ont été publiés en 2024 pour préciser ses modalités et son calendrier d'application.

Cette réforme supprime certaines redevances existantes : pollution non-domestique et modernisation des réseaux de collecte (usage domestique et non-domestique). De même, cette réforme acte la fin de la prime pour performance épuratoire et le doublement possible de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau pour cause de maîtrise insuffisante des pertes en eau sur le réseau d'eau (doublement dit 'Grenelle', encadré par un décret de janvier 2012).

Dans le même temps, ces différentes suppressions s'accompagnent de nouvelles redevances :

- une redevance pour consommation d'eau potable dont devront s'acquitter les abonnés au service ;
- deux redevances auxquelles seront assujetties directement les autorités organisatrices des services publics d'eau et d'assainissement portant sur la performance des services.

Ces deux dernières redevances seront modulées au regard d'un certain nombre de critères de performance des services, à savoir :

- pour les services d'eau : le niveau des pertes en eau et la gestion du patrimoine ;
- pour les services d'assainissement : la conformité en équipement et en performance ainsi que l'effectivité de l'autosurveillance du système d'assainissement (réseau de collecte et stations d'épuration) et l'efficacité du système d'assainissement.

Les services, en tant qu'autorité organisatrice peuvent dès l'année 2025, et après délibération en 2024, reporter la contrepartie de ces deux redevances, assises sur la performance, sur une ligne spécifique de la facture des abonnés au service à travers un mécanisme de contre-valeur. Pour l'année 2025, cette contre-valeur correspond au taux fixé par l'agence de l'eau multiplié par le coefficient de modulation par défaut de l'année 2025 (0,2 pour l'eau, 0,3 pour l'assainissement).

Les modulations sur performance indiquées plus haut deviendront pleinement effectives en 2026, sur la base des performances constatées au terme de l'année 2024.

Le décret 2024-787 du 9 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024), lui-même modifié par le décret 2025-66 du 24 janvier 2025 (JO du 25 janvier 2025), portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau précise les dispositions essentielles de la réforme. Ce décret est complété par cinq arrêtés, à savoir :

- L'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 10 juillet 2024) modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;
- L'arrêté du 5 juillet 2024 (JO du 9 juillet 2024), lui-même modifié par l'arrêté du 20 décembre 2024 (JO du 26 décembre 2024), relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ;
- L'arrêté du 5 juillet (JO du 7 juillet 2024) relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;

- L'arrêté du 2 octobre 2024 (JO du 30 octobre 2024) modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées) ;
- L'arrêté du du 23 décembre 2024 (JO du 26 décembre 2024) est venu modifier et mettre à jour l'arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particulières de versement des redevances pour pollution d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement pour le rendre compatible avec le nouveau cadre réglementaire encadrant désormais les redevances.

A noter qu'une instruction dédiée aux préfets, en date du 4 décembre 2024, est venue préciser les points essentiels de cette réforme des redevances sur lesquels les services de l'Etat et des collectivités locales se devaient de se mobilier.

Enfin, cette réforme structurante des redevances s'accompagne d'une refonte des indicateurs de performance du Système d'Information des Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA) qui était supposée aboutir durant l'année 2024.

Transposition de la directive européenne 2020/2184 et qualité des eaux destinées à la consommation humaine

La directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 actualise celle de 1998. Elle "revalorise l'eau du robinet". Cette directive a été transposée en droit français à la toute fin de l'année 2022 à travers une ordonnance, deux décrets et une quinzaine d'arrêtés.

Ces textes législatifs et réglementaires ont été complétés par une note d'information de la Direction Générale de la Santé (DGS) aux ARS (note d'information N° DGS/EA4/2023/61 du 14 avril 2023, publiée le 28 avril 2023). Cette note d'information réaffirme les points fondamentaux du cadre réglementaire promulgué fin décembre 2022 et pour partie effectif depuis le 1er janvier 2023. Notamment :

- Elle renforce, dès le 1er janvier 2023, les normes de qualité exigées pour l'eau potable sur de nouveaux polluants, avec une obligation de résultats sur sept nouveaux paramètres qui couvrent différentes familles de substances (sous-produits de désinfection, perturbateurs endocriniens, l'uranium) et notamment la somme de 20 substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS') à laquelle est associée une limite de qualité de 0,1 microgramme/L ;
- Elle confirme que la vérification permanente de la qualité de l'eau relève de la responsabilité du service public d'eau, au travers la mise en œuvre d'un plan de surveillance conforme aux exigences de qualité en vigueur et aux vulnérabilités identifiées. Le contrôle sanitaire officiel opéré par les ARS présente un caractère strictement ponctuel et en aucun cas permanent. Ainsi, sur les sept nouveaux paramètres mentionnés plus haut, le contrôle sanitaire réalisé par les ARS sera opérationnel au plus tard le 1er janvier 2026 ;
- Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) élaborés sous la responsabilité de la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE). Cette approche passe par une meilleure maîtrise du patrimoine des services d'eau et la compréhension de leur vulnérabilité, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité du plan de surveillance mentionné plus haut.

Ce nouvel enjeu de gestion préventive des risques et les dispositions qui s'y rattachent ont été rappelés dans un courrier du Directeur Général de la Santé, daté du 30 janvier 2024 adressé à l'Association des Maires de France, à Intercommunalités de France, à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et à la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E). Ce courrier réaffirme les

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

échéances de juillet 2027 puis de janvier 2029 pour que les services d'eau élaborent, mettent en œuvre, évaluent et mettent à jour leur PGSSE, d'abord sur la ressource en eau puis sur la production et la distribution (seconde échéance citée).

Ce rappel survient alors que les sujets des substances alkyl perfluorées (famille de substances communément nommées 'PFAS'), des métabolites de pesticide ou la présence de chlorure de vinyle monomère (instruction de la DGS aux ARS du 29 avril 2020 concernant les mesures correctives que les services doivent mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu et, ce, sans attendre l'échéance du PGSSE "système de distribution" de janvier 2029), ont jalonné l'année 2024 : sur le plan législatif, réglementaire, institutionnel et, voire même, médiatique.

- ***PFAS (et autres paramètres nouvellement réglementés)***

Sur le plan réglementaire, l'instruction DGS/EA4/2024/30 du 12 mars 2024 (BO Santé du 29 mars 2024), est venue préciser les modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés perfluorés (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cette instruction de la DGS à destination des ARS et des Préfets précise les recommandations de gestion des situations locales de non conformités pour les PFAS dans les EDCH en réaffirmant l'obligation d'une information transparente des populations concernées (conformément à l'article R1321-30 du Code de la Santé Publique). Elle rappelle les incertitudes scientifiques concernant cette famille de substances et dresse l'état d'avancement des expertises sanitaires en cours, dont la campagne exploratoire de l'Anses sur les PFAS dans les eaux brutes et les eaux distribuées. Pour les PFAS, cette campagne exploratoire porte sur 34 composés, incluant les 20 composés dont la somme est soumise à une une limite de qualité depuis le 1er janvier 2023 et des PFAS à chaîne dite "courte", aujourd'hui non réglementés en France, dont l'acide trifluoroacétique (communément nommé TFA).

Sur le plan européen, une communication de la Commission (C/2024/4910) publiée au JOUE du 7 août 2024 est venue préciser les lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine.

- ***Métabolites de pesticides***

L'année 2024 a été marquée par la publication de trois avis de l'Anses :

- Dans deux avis publiés début mai 2024, l'Anses a confirmé le caractère pertinent du métabolite R417888 du chlorothalonil et a classé comme non-pertinent le métabolite R411811 du même chlorothalonil. Le métabolite R471811 se trouve dès lors affecté d'une norme sanitaire, considérée comme une valeur indicative, de 0,9 µg/L (et non plus une limite de qualité de 0,1 µg/L comme c'est encore le cas pour le métabolite R417888). A noter que la précédente campagne exploratoire menée par l'Anses, sous l'égide de la DGS, sur les polluants émergents susceptibles d'être présents dans les ressources en eau et les EDCH et publiée en avril 2023 avait montré la détection très fréquente du métabolite Chlorothalonil R471811 dans les eaux brutes et distribuées.
- Dans un avis publié début août 2024, l'Anses fixe les valeurs sanitaires maximales de la desphényl-chloridazone et de la méthyldesphényl-chloridazone, deux métabolites de la chloridazone confirmés comme pertinents dans deux avis de 2023 de l'Anses. Ces valeurs sanitaires maximales sont respectivement de 11 µg/L et 110 µg/L. S'agissant de deux métabolites pertinents, ils sont tous deux soumis à une limite de qualité de 0,1 µg/L qui fixe la conformité de l'eau à atteindre, le cas échéant, après une période dérogatoire de trois ans, renouvelable une fois.

Fin novembre 2024, la publication d'un rapport mené par trois inspections ministérielles (IGEDD, CGAAER et IGAS) sur la gestion des aires d'alimentation des captages a dressé un constat sévère sur la fréquence de détection des pesticides et de leurs métabolites dans les ressources en eau en proposant différentes dispositions pour la reconquête de leur qualité dont l'harmonisation européenne du classement de la pertinence / non-pertinence des métabolites de pesticide. Cette disposition a été initiée en 2024 par la Commission avec l'appui scientifique de l'OMS dont les travaux sont attendus en 2025.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- ***Matériaux en contact avec l'eau***

Trois décisions et trois règlements européens publiés au Journal Officiel de l'Union Européenne du 23 avril 2024 sont venus compléter la réglementation relative aux matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Ces six textes découlent de la révision de la directive 2020/1184 de décembre 2020 relative aux eaux destinées à la consommation humaine et qui harmonise le cadre européen sur ce sujet.

Ces dispositions s'appliqueront à partir du 31 décembre 2026. En attendant, les dispositions françaises continuent à s'appliquer. Un texte réglementaire viendra préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions en France.

- ***Microplastiques dans les eaux destinées à la consommation humaine***

Par une décision déléguée du 11 mars 2024, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne du 21 mai 2024, la Commission européenne a défini la méthodologie à suivre pour mesurer les microplastiques dans l'eau destinée à la consommation humaine. Cette décision déléguée répond à une disposition de la directive 2020/2184 relative aux eaux destinées à la consommation humaine publiée en décembre 2020. L'objectif est d'inscrire ensuite ces substances sur la liste de vigilance qui comprend les substances ou composés préoccupants pour les citoyens ou les milieux scientifiques. Pour mémoire, à date, cette liste de vigilance supposée s'étendre comprend le bêta-œstradiol et le nonylphénol.

Repérage de l'amiante avant travaux

L'arrêté du 4 juin 2024 (JO du 30 juin 2024) est venu préciser les modalités de réalisation du repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers. Cet arrêté qui couvre les enrobés routiers et les réseaux entrera pleinement en application le 1er juillet 2026 afin de permettre au préalable la mise en œuvre des formations des opérateurs en charge de réaliser ces opérations de repérage, selon la norme norme NF X 46-102 de novembre 2020.

Les dispositions de cet arrêté précisent que le donneur d'ordre des travaux est tenu d'adresser au propriétaire de l'ouvrage une copie du rapport de repérage afin que ce dernier puisse mettre à jour le dossier de traçabilité.

Cet arrêté précise également les conditions d'exemption de ce repérage : situation d'urgence ou lorsque les informations provenant des documents de traçabilité sont antérieurement connues.

Travaux à proximité des réseaux

Plusieurs fois refondue au gré des retours d'expérience, la réglementation "anti-endommagement", qui encadre depuis 2012 les travaux effectués à proximité des réseaux à risque aériens et enterrés, connaît une série d'ajustements à compter du 1er janvier 2025. A noter que le décret du 2024-1022 du 13 novembre 2024 (JO du 15 novembre 2024) et l'arrêté du 23 décembre 2024 (JO du 29/12/24) sont venus renforcer la sécurité des interventions sur les réseaux en modifiant certaines dispositions contenues dans plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution des travaux à proximité des réseaux, notamment en matière de déclaration, d'entretien et de contrôle des infrastructures.

Par une décision du 30 janvier 2024 (BO du 17 février 2024), le fascicule 2 du guide d'application de la réglementation anti-endommagement intitulé « guide technique des travaux » mentionné à l'article R. 554-29 du code de l'environnement a vu ses annexes complétées de nouvelles fiches techniques.

L'arrêté du 7 mai 2024 (JO du 22 mai 2024) est venu fixer, pour l'année 2024, le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des réseaux enterrés, du «Guichet Unique» administré par l'Ineris. Ce téléservice

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur endommagement lors de travaux.

Trois arrêtés en date du 5 juillet 2024 ont été publiés au JO du 7 juillet 2024 :

- un premier arrêté précise les normes définissant les modalités recommandées pour l'exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l'exécution d'opérations non électriques dans l'environnement d'ouvrages et d'installations électriques sous tension ;
- un second arrêté porte sur les conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail ;
- le troisième arrêté porte spécifiquement sur la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains.

Gestion quantitative et partage de la ressource en eau

Dans la continuité du Plan Eau adopté fin mars 2023, plusieurs instructions et arrêtés sont venus préciser durant l'année 2024 les modalités de gestion quantitative et de partage de la ressource en eau.

- L'instruction du 18 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau a été publiée le 8 janvier 2024.

Cette instruction précise les modalités de gestion quantitative de la ressource en eau. En particulier, elle encadre l'étude des volumes prélevables à l'étiage, qui constituent la base de toute démarche de retour à l'équilibre hydrique, en rappelant la nécessité de définir une stratégie d'études des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin. Elle détaille la nécessaire articulation entre les différents outils de gestion de la ressource en eau (SAGE, PTGE,, etc.) pour atteindre le retour à l'équilibre.

- L'instruction interministérielle du 1er juillet 2024 (BO du 9 juillet 2024) précise les actions du Plan Eau, parmi les 53 mesures de ce plan, qui doivent être mises en œuvre dans les territoires sous l'impulsion des préfets. Aussi l''objet de cette instruction est de détailler, pour certaines mesures, quelles actions sont attendues et à quelle échelle.
- L'arrêté du 3 juillet 2024 (JO du 6 juillet 2024) modifie l'arrêté du 30 juin 2023 concernant les mesures de restriction à mettre en œuvre en période de sécheresse dans les ICPE.
  Dans un souci de simplification, il modifie le site internet sur lequel l'exploitant transmet ses consommations d'eau lors des épisodes de sécheresse. Il précise que les réductions doivent être appliquées sur les prélèvements dans les ressources qui sont concernées par la sécheresse. Il apporte également des modifications concernant la déduction d'un volume de « sécurité » du volume de référence auquel l'exploitant doit appliquer des réductions de sa consommation d'eau en cas de sécheresse.
- Le décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024 (JO du 4 décembre 2024) révise les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage). Créé par la loi sur l'eau de 1992, cet outil de planification essentiel à la gestion locale de l'eau est adapté par ce décret pour répondre aux nouveaux enjeux, notamment du changement climatique et aux épisodes de rareté de la ressource en eau. Ce décret vise à accélérer l'élaboration des SAGE en resserrant, notamment, les liens entre le SAGE et les documents d'urbanisme et les trajectoires des prélèvements sur un territoire.

D'autre part, le Plan Eau présenté fin mars 2023 comporte cinq mesures visant à faciliter le recours aux eaux non-conventionnelles (ENC - incluant les eaux usées traitées, mais également les eaux de pluie, les eaux grises, les eaux d'exhaure, etc.) et à contribuer ainsi aux économies de prélèvement d'eau sur un territoire. Ce plan a pour objectif de développer 1000 projets opérationnels d'ici à 2027.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

En 2024, de nouveaux textes réglementaires, complétant ceux publiés en 2023, ont été publiés pour faciliter le recours aux ENC tout en encadrant les risques inhérents à ces pratiques :

- **Le décret 2024-33 du 24 janvier 2024** (JO du 25 janvier 2024) puis **le décret 2024 - 769 du 8 juillet 2024** (JO du 9 juillet 2024) fixent les modalités de recours aux ENC dans les entreprises du secteur alimentaire. Ce dernier décret est accompagné d'un arrêté daté du 8 juillet 2024 (JO du 9 juillet 2024) qui précise les niveaux de garantie sanitaire à atteindre en fonction des usages prévus ;
- **Le décret 2024-796 et l'arrêté du 12 juillet 2024** (JO du 13 juillet 2024) encadrent les conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (EICH) pour des usages domestiques. Ces deux textes ont été complétés et précisés par la note d'information DGS/EA4/2024/147 du 23 octobre 2024 (BO Santé du 31 octobre 2024) à destination des ARS et des préfets.

Protection et surveillance des masses d'eau

Un avis publié au JO du 6 octobre 2024 est venu préciser les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2023. Cet avis liste les méthodes analytiques, et les normes associées, des couples « élément de qualité biologique - méthode » à appliquer ainsi que leur date d'entrée en vigueur.

Transition énergétique & environnementale

Autorisation environnementale

Promulguée en octobre 2023, la loi Industrie verte vise à accélérer la réindustrialisation du pays, dans le respect de l'environnement. Afin de traduire cette ambition, deux décrets ont été pris en application de cette loi pour accélérer la libération de foncier industriel et l'implantation de nouvelles usines, notamment via la réduction des délais d'examen des demandes d'autorisation environnementale. Une instruction ministérielle est venue compléter ultérieurement le dispositif mis en place.

Le décret n° 2024-704 du 5 juillet 2024 permet tout d'abord la mise en œuvre des accélérations de certaines procédures d'urbanisme ou environnementales pour des projets industriels stratégiques. Plus précisément :

- Il définit la liste des secteurs des technologies favorables au développement durable pour lesquels les projets industriels sont rendus explicitement éligibles à la procédure de déclaration de projet prévue par l'article L.300-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, parmi ces secteurs, est mentionné celui des technologies de décarbonations du bâtiment, celui des technologies de production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone ou encore celui du recyclage des déchets de matériaux.
- Il détaille les informations à fournir pour se voir reconnaître de manière anticipée la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L.411-2 du code de l'environnement, pour des projets industriels visés par une déclaration d'utilité publique, identifiés par décret comme projet d'intérêt national majeur (PINM) ou faisant l'objet d'une déclaration de projet au sens du code de l'urbanisme.
- Enfin, le décret précise que le préfet sera l'autorité compétente pour autoriser les travaux, installations, constructions et aménagement d'un projet industriel qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (article R* 422-2 i) du code de l'urbanisme).

Ensuite, **le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024** permet, à travers des dispositions clés, de réduire les délais d'implantation industrielle et de favoriser la libération de fonciers industriels. Plus précisément :

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

- Il accélère l'examen des demandes d'autorisation environnementale. En application du nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la Loi Industrie Verte, la phase d'enquête publique est, sauf exception, remplacée par une procédure de consultation du public parallélisée menée sous le contrôle du commissaire enquêteur. Cette consultation est désormais réalisée en parallèle de la phase d'examen de la demande par les services de l'Etat durant une période de 3 mois (portée à 4 mois lorsque l'avis de l'autorité environnementale est requis), là où ces deux étapes étaient précédemment conduites de manière successive sur une durée de 7 à 8 mois. D'autres délais de procédure sont par ailleurs raccourcis. A titre d'exemple, le pétitionnaire ne disposera plus que de 5 jours pour formuler des observations sur les remarques et propositions du public, contre les 15 jours prévus dans le cadre actuel de l'enquête publique.
  Ces dispositions sont entrées en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
- Il améliore la gestion des cessations d'activité ICPE. Tout d'abord, le texte précise les conditions permettant à un exploitant, dont la cessation d'activité a été notifiée avant le 1er juin 2022, de bénéficier de la nouvelle procédure de cessation d'activité introduite par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (« Loi ASAP »). Le décret apporte également des précisions substantielles quant au contenu du mémoire de réhabilitation que l'exploitant est tenu de transmettre au Préfet. A ce titre, le traitement des sources de pollutions et des pollutions concentrées est rendu obligatoire (sauf dérogation encadrée), là où cette pratique relevait jusqu'ici de la simple recommandation issue de la Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués de 2017. Le décret modifie en outre l'ensemble des articles du code de l'environnement relatifs à la procédure de tiers demandeur afin, entre autres, de faciliter sa substitution à l'exploitant pour la mise en sécurité du site (en plus de sa réhabilitation). Le texte prévoit aussi le renforcement des exigences de garanties financières à constituer pour le tiers demandeur et ouvre la possibilité aux collectivités d'être leur propre assureur lorsqu'elles interviennent en tant que tiers demandeur.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 2024.

ICPE

Face à l'importance de la sinistralité dans les installations de gestion des déchets, le ministère de la Transition écologique a renforcé les prescriptions en matière de prévention des incendies en prenant une succession d'arrêtés fin 2023 (pour les installations soumises au régime de l'enregistrement et les installations soumises à autorisation) et début 2024 (pour les installations soumises à déclaration).

Ainsi, l'arrêté du 8 janvier 2024 (TREP2330764A), qui modifie les prescriptions applicables aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration, s'inscrit dans cette volonté de réforme.

En premier lieu, le nouveau texte modifie :

- l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;
- l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial).

Au sein de ces arrêtés, il introduit des exigences, applicables à compter du 1er janvier 2025, en ce qui concerne le stockage des déchets d'équipements électriques et électroniques. A ce titre, il prévoit que ces déchets susceptibles de contenir des batteries au lithium doivent être séparés des autres déchets

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutention.

En second lieu, il modifie :

- l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ;
- l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°s 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées ;
- l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718.

Les modifications consistent à introduire de nouvelles exigences qui seront mises en place progressivement (certains entreront en vigueur en juillet 2024, d'autres en janvier 2025, et les dernières en janvier 2026). Parmi les exigences à mettre en œuvre le plus tôt possible, on notera l'obligation pour l'exploitant de réaliser et tenir à jour un plan de défense contre l'incendie dont le texte fixe le contenu minimum. De même, il doit organiser un exercice de défense contre l'incendie, lequel doit être renouvelé au moins tous les trois ans.

Notons qu'un arrêté du 4 juin 2024 (TREP2412145A) a ultérieurement corrigé certaines incohérences et erreurs rédactionnelles introduites par les textes de fin 2023 et début 2024.
Enfin, l'instruction ministérielle du 3 décembre 2024 (TCEP2421014) a défini les actions nationales 2025 de l'inspection des installations classées, qui sont au nombre de cinq : libération du foncier industriel, maîtrise des risques accidentels, installations de combustion, lutte contre le trafic de déchets et plan d'action interministériel « PFAS ».

Encadrement des émissions chimiques

Dans une communication publiée au journal officiel de l'Union Européenne le 26 avril 2024, la Commission européenne est venue préciser les critères et les principes directeurs de la notion "d'utilisations essentielles" d'une substance chimique. Ces critères permettent d'évaluer s'il est justifié, d'un point de vue sociétal, d'utiliser les substances les plus nocives. Dans les cas où l'utilisation est nécessaire pour la santé et/ou la sécurité et/ou si elle est essentielle au fonctionnement de la société, et s'il n'existe pas de solutions de remplacement acceptables, une substance chimique peut continuer à être utilisée à cette fin pendant un certain temps, précise ainsi l'exécutif européen.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.4. Listes d'interventions

Liste des fuites sur canalisations

Commune	Date	Adresse	Diamètre	Commentaires
OZOIR LA FERRIERE	17/01/2024	1 RUE DE FEROLLES	60	FUITE CANALISATION
OZOIR LA FERRIERE	01/03/2024	102 AVENUE DU GENERAL LECLERC	250	FUITE CANALISATION
OZOIR LA FERRIERE	12/08/2024	1 AVENUE KLEBER	60	COUPE 2M + 2 GIBAULT
OZOIR LA FERRIERE	03/08/2024	1 COURS RENÉ BARET	100	FUITE CANALISATION
OZOIR LA FERRIERE	12/07/2024	1 RUE KLEBER	60	FUITE CANALISATION
OZOIR LA FERRIERE	03/12/2024	68 RESIDENCE VINCENNES	50	FUITE CANALISATION
OZOIR LA FERRIERE	30/09/2024	12 AVENUE DE SULLY	60	FUITE CANALISATION

Liste des fuites sur équipements

Pas de fuite sur équipement survenue en 2024

Liste des fuites sur branchements

Commune	Date	Adresse	Diamètre
OZOIR LA FERRIERE	11/03/2024	18BIS RUE DE LA FONTAINE	32
OZOIR LA FERRIERE	22/04/2024	6 RUE MILLET	60
OZOIR LA FERRIERE	26/04/2024	71 ROUTE DE ROISSY	
OZOIR LA FERRIERE	07/06/2024	32 RUE GUYNEMER	60
OZOIR LA FERRIERE	16/07/2024	8 RUE FELIX EBOUE	50
OZOIR LA FERRIERE	27/08/2024	30 RUE DE LA CONCORDE	

Liste des arrêts d'eau non programmés

Commune	Date intervention	Type d'intervention	Linéaire coupé en m	Durée en mn
OZOIR LA FERRIERE	17/01/2024	Fuite conduite	300	450
OZOIR LA FERRIERE	01/03/2024	Fuite conduite	600	360
OZOIR LA FERRIERE	11/03/2024	Fuite branchement	150	540
OZOIR LA FERRIERE	26/04/2024	Fuite branchement	500	420
OZOIR LA FERRIERE	30/07/2024	Intervention sur appareil de réseau	0	539
OZOIR LA FERRIERE	03/08/2024	Fuite conduite	300	690
OZOIR LA FERRIERE	30/09/2024	Fuite conduite	200	420
OZOIR LA FERRIERE	07/10/2024	Coupure d'eau faite en urgence suite à accrochage par un tiers	200	300

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Liste des arrêts d'eau programmés

Commune	Date d'intervention	Type d'intervention	Linéaire coupé (en m)	Durée (en mn)
OZOIR LA FERRIERE	11/03/2024	Raccordement	1200	480
OZOIR LA FERRIERE	22/04/2024	Fuite branchement	150	510
OZOIR LA FERRIERE	02/05/2024	Intervention sur appareil de réseau	750	510
OZOIR LA FERRIERE	30/05/2024	Fuite branchement	150	480
OZOIR LA FERRIERE	24/07/2024	Raccordement	400	480
OZOIR LA FERRIERE	02/08/2024	Raccordement	570	510
OZOIR LA FERRIERE	12/08/2024	Fuite conduite	500	510
OZOIR LA FERRIERE	27/08/2024	Fuite branchement	300	450
OZOIR LA FERRIERE	11/09/2024	Raccordement	300	510
OZOIR LA FERRIERE	08/10/2024	Raccordement	200	480
OZOIR LA FERRIERE	10/10/2024	Fuite branchement	200	480
OZOIR LA FERRIERE	26/11/2024	Raccordement	100	450
OZOIR LA FERRIERE	27/11/2024	Raccordement	500	510
OZOIR LA FERRIERE	03/12/2024	Fuite conduite	60	510

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.5. CERTIFICATS ISO

afaq
AFNOR CERTIFICATION

Certificat
Certificate

N° 2015/69288.12

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER AND PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 50001 : 2018

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

Adresse	N° SIREN
21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS	572025526

Liste complémentaire des sites certifiés en annexe / *Complementary list of certified locations on appendix*

(L'ensemble des activités de l'entreprise sur le(s) site(s) donné(s) est couvert par la certification)
(The scope of certification covers all activities carried out on the above-mentioned location(s))

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day) **2024-11-11** Jusqu'au *until* **2027-11-10**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme.
The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.
Accréditation COFRAC n°4-0001. Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr
COFRAC accreditation n°4-0001. Management Systems Certification. Scope available on www.cofrac.fr
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark.* CERTI F 1461.5 12/2020

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Certificat

Certificate

N° 2015/69287.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

**PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.**

***DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.***

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / *List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-10** Jusqu'au *Until* **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001. Certification de Systèmes de Management. Portée disponible sur www.cofrac.fr. *COFRAC accreditation n° 4-0001. Management Systems Certification. Scope available on www.cofrac.fr.*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark.* - CERTI F 0996.fr.IST.2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

SYNDICAT MIXTE POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'OUEST BRIARD – Commune d'Ozoir-la-Ferrière - 2024 Page 116

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Certificat

Certificate

N° 2015/69286.11

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE & D'EAU DE PROCESS.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES. ACCUEIL ET SERVICE AUX CONSOMMATEURS.

DRINKING WATER & PROCESS WATER PRODUCTION AND DISTRIBUTION.
WASTEWATER COLLECTION AND TREATMENT. CUSTOMER SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

21 RUE LA BOETIE FR-75008 PARIS

Liste des sites certifiés en annexe(s) / *List of certified locations on appendix(ces)*

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour) *This certificate is valid from (year/month/day)* **2024-11-10** Jusqu'au *Until* **2027-11-09**

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur probatoire.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probationary value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme. *The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.* Accréditation COFRAC n° 4-0001, Certification de Systèmes de Management, Portée disponible sur www.cofrac.fr. *COFRAC accreditation n° 4-0001, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr*
AFAQ est une marque déposée. *AFAQ is a registered trademark* - CERTI-F 0996.9.07.2020

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

SYNDICAT MIXTE POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'OUEST BRIARD – Commune d'Ozoir-la-Ferrière - 2024 Page 117

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.6. GLOSSAIRE

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné au délégataire pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif).

Abonnés non domestiques :

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de service.

Capacité de production :

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 20 heures chacune (unité : m^3/jour).

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des moyens de prévention des pollutions, en s'intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et l'amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 22000 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée par le délégataire.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l'énergie. Ce système traduit l'engagement de Veolia à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d'une amélioration continue.

Certification ISO 45001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc..). Il est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au nombre d'abonnements.

Consommation individuelle unitaire :

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m^3/client/an).

Consommation globale unitaire :

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients (unité : m^3/consommateur/an).

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai [D 151.0] :

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s'engage le service pour ouvrir un branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007)

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l'accès de 6,5 millions de personnes à l'eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services d'assainissement dans les pays émergents).

Eau souterraine influencée :

Eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU.

HACCP :

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d'identification et de hiérarchisation des risques développée à l'origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes d'alimentation en eau potable.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

- 0 % : aucune action ;
- 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;
- 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ;
- 50 % : dossier déposé en préfecture ;
- 60 % : arrêté préfectoral ;
- 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ;
- 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

En cas d'achat d'eau à d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable [P103.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

- le niveau de connaissance du réseau et des branchements,
- et l'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement collectif.

L'échelle est de 0 à 100 points pour les services n'exerçant pas la mission de distribution.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : *http://services.eaufrance.fr/*

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :

L'indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m^3/km/jour.

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :

L'indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. L'indice est exprimé en m^3/km/jour.

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] :

Il s'agit de la population totale (avec 'double compte') desservie par le service, estimée par défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Parties prenantes :

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d'eau ou d'assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics …

Prélèvement :

Un prélèvement correspond à l'opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d'une part le volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services publics d'eau potable et, d'autre part le volume produit augmenté des volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007)
La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la valeur dépend de la densité de l'habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012–97 du 27 janvier 2012. Cette définition réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après :
Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85)

Avec :

- Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ;
- ILC : Indice Linéaire de Consommation (m^3/j/km) qui traduit la densité de l'habitat et la taille du service ;
- A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d'une part, par une ressource en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d'autre part, par des prélèvements supérieurs à 2 Mm^3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la ressource en eau).

Réseau de desserte :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression l'eau potable issue des unités de potabilisation jusqu'aux points de raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d'arrosage, de nettoyage…) et jusqu'aux points de livraison d'eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d'équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements.

Réseau de distribution :

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de branchements.

Résultat d'analyse :

On appelle résultat d'analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement effectué, il y a plusieurs résultats d'analyse (1 résultat par paramètre).

Taux d'impayés [P154.0] :

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007)

Taux d'occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :

Nombre de coupures d'eau, par millier d'abonnés, survenues au cours de l'année pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24h à l'avance.
Les coupures de l'alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte.
Les coupures chez l'abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en compte.

Taux de mensualisation :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour un règlement mensuel par prélèvement bancaire.

Taux de prélèvement :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour un règlement des factures par prélèvement bancaire.

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :
Ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique
Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements aux fins d'analyses microbiologiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes.

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/j : pourcentage des prélèvements aux fins d'analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :
ceux réalisés par l'ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
et le cas échéant ceux réalisés par l'opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/j : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques effectués dans l'année et parmi ceux-ci nombre de prélèvements non conformes.

Taux de mutation (demandes d'abonnement) :

Nombre de demandes d'abonnement (mouvement de consommateurs) rapporté au nombre total de consommateurs, exprimé en pour cent.

Taux de réclamations [P155.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix.

Volume acheté en gros (ou acheté à d'autres services d'eau potable) :

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé.

Volume comptabilisé :

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n'inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation.

Volume consommé autorisé :

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.

Volume de service du réseau :

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution.

Volume mis en distribution :

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté).

Volume produit :

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. Le volume de service de l'unité de production n'est pas compté dans le volume produit.

Volume vendu en gros (ou vendu à d'autres services d'eau potable) :

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume exporté.

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

6.7. AUTRES ANNEXES

LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Libellé Installation	Libellé Intervention	Date d'achèvement	Commentaires
Chloration + DEM Achat Kennedy	1M-Contrôle Analyseur de chlore	10/06/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	1M-Contrôle Analyseur de chlore	5/07/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	1M-Contrôle Analyseur de chlore	6/08/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/12/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Changement bouteille 1	2/07/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Changement bouteille 2	26/09/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Changement de bouteille	10/05/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Changer thermostat radiateur	22/11/2024	Remplacement du thermostat
Chloration + DEM Achat Kennedy	Défaut alarme intrusion	12/03/2024	Défaut capteur AP (capot centrale) essai de reboot, non concluant. nécessité d'une intervention commune avec Capitaine, prise de contact faite. À poursuivre
Chloration + DEM Achat Kennedy	Défaut alarme intrusion	13/11/2024	Rétablissement de l'alarme, après reconfiguration
Chloration + DEM Achat Kennedy	Défaut batterie	15/11/2024	Réinitialisation Sofrel effacement défaut
Chloration + DEM Achat Kennedy	Défaut Transmission	31/05/2024	Réinstallation logiciel et ré-adressage IP
Chloration + DEM Achat Kennedy	Étalonnage analyseur	18/11/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	28/08/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	4/10/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	26/12/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	31/12/2024	Relevé mensuel des index - Achat-Vente
Chloration + DEM Achat Kennedy	Remplacement bouteille chlore 1	18/12/2024	
Chloration + DEM Achat Kennedy	Transfert Alert vers Lerne	22/02/2024	Changement du numéro d'identification du poste dans le Sofrel
Chloration Charmeraie	1M-Contrôle Analyseur de chlore	10/06/2024	
Chloration Charmeraie	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/07/2024	
Chloration Charmeraie	1M-Contrôle Analyseur de chlore	6/08/2024	
Chloration Charmeraie	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/12/2024	
Chloration Charmeraie	Changement serrures des 2 portes	11/06/2024	Mise en place de deux cylindres européens
Chloration Charmeraie	Chloration	30/05/2024	
Chloration Charmeraie	Réception livraison bouteilles Chlore	3/10/2024	
Chloration Charmeraie	Remise en eau de l'installation	4/11/2024	
Chloration Charmeraie	Remise en service de la chloration (suite)	5/11/2024	
DEM Achat Kennedy + Chloration	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/01/2024	
DEM Achat-Vente Clos de la Vigne - Ozoir-Férolles	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	28/08/2024	

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Libellé Installation	Libellé Intervention	Date d'achèvement	Commentaires
DEM Achat-Vente Clos de la Vigne - Ozoir-Férolles	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	30/09/2024	
DEM Achat-Vente Clos de la Vigne - Ozoir-Férolles	Tester fonctionnement LS	14/08/2024	
DEM Achat-Vente L'Orée du Bois - Ozoir-Roissy	Récupérer la configuration	4/10/2024	Téléchargement de la configuration
DEM Achat-Vente L'Orée du Bois - Ozoir-Roissy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	28/08/2024	
DEM Achat-Vente L'Orée du Bois - Ozoir-Roissy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	3/10/2024	
DEM Achat-Vente L'Orée du Bois - Ozoir-Roissy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	26/12/2024	
DEM Achat-Vente L'Orée du Bois - Ozoir-Roissy	Relevé mensuel des index - Achat-Vente	31/12/2024	Relevé mensuel des index - Achat-Vente
Réservoir de La Doutre	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/01/2024	
Réservoir de La Doutre	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/04/2024	
Réservoir de La Doutre	1M-Contrôle Analyseur de chlore	10/06/2024	
Réservoir de La Doutre	1M-Contrôle Analyseur de chlore	3/07/2024	
Réservoir de La Doutre	1M-Contrôle Analyseur de chlore	6/08/2024	
Réservoir de La Doutre	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/12/2024	
Réservoir de La Doutre	Défaut Liaison VPN	29/04/2024	Redémarrage du routeur
Réservoir de La Doutre	Défaut tension	21/02/2024	Plus d'alimentation, suite à 7ne intervention EDF sans être avisé. vérif de la vanne électrique afin qu'elle reste ouverte. remise sous tension vers 14h
Réservoir de La Doutre	Enlever les traces de coulure de goudron sur paroi bâtiment intérieur	11/07/2024	
Réservoir de La Doutre	Entretien analyseur	11/06/2024	
Réservoir de La Doutre	Entretien espace vert	2/07/2024	
Réservoir de La Doutre	Étudier solution pour stopper ruissellement produit étanchéité tombant du haut	10/06/2024	
Réservoir de La Doutre	Nettoyage des locaux	3/04/2024	
Réservoir de La Doutre	Pilote manu réservoir	5/06/2024	
Réservoir de La Doutre	Pose entonnoir pour canaliser coulure goudron	28/08/2024	
Réservoir de La Doutre	Remplacement des ampoules par des LED	4/04/2024	
Réservoir de La Gare	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/01/2024	
Réservoir de La Gare	1M-Contrôle Analyseur de chlore	15/03/2024	
Réservoir de La Gare	1M-Contrôle Analyseur de chlore	10/06/2024	
Réservoir de La Gare	1M-Contrôle Analyseur de chlore	4/07/2024	
Réservoir de La Gare	1M-Contrôle Analyseur de chlore	6/08/2024	
Réservoir de La Gare	1M-Contrôle Analyseur de chlore	2/12/2024	
Réservoir de La Gare	Changer interrupteur éclairage intérieur	14/05/2024	
Réservoir de La Gare	Contrôle préventif poire niveau bas avant lavage cuve	4/06/2024	Contrôle préventif poire de niveau suite au lavage réservoir
Réservoir de La Gare	Contrôle préventif sonde niveau haut avant lavage cuve	4/06/2024	Suite au lavage réservoir contrôle préventif de la sonde de niveau
Réservoir de La Gare	Défaut alarme intrusion	12/03/2024	Rdv avec Capitaine pour reboot centrale alarme, dû à l'échange de la batterie
Réservoir de La Gare	Défaut Liaison / VPN	29/04/2024	Redémarrage du routeur
Réservoir de La Gare	Dysfonctionnement analyseur	29/01/2024	
Réservoir de La Gare	Entretien analyseur CL2	19/04/2024	
Réservoir de La Gare	Entretien espace vert	18/07/2024	
Réservoir de La Gare	Nettoyage des locaux	3/04/2024	
Réservoir de La Gare	OUVERTURE ORANGE	26/09/2024	
Sectorisation Ozoir - Clos de la Vigne	Capteur Cyble à renouveler	29/08/2024	Échange capteur cible pour des non remontées d'index

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2

Libellé Installation	Libellé Intervention	Date d'achèvement	Commentaires
Sectorisation Ozoir - Clos de la Vigne	Changement IP Frontal pour intégration Lerne et Panorama	13/03/2024	Changement IP Frontal pour intégration Lerne et Panorama
Sectorisation Ozoir - Clos de la Vigne	Index ne remonte pas dans Lerne	4/10/2024	Programmation du compteur et du débitmètre
Sectorisation Ozoir - Clos de la Vigne	Intégrer la sectorisation dans Lerne	19/07/2024	Intégrer la sectorisation dans Lerne
Sectorisation Ozoir - Clos de la Vigne	Tester fonctionnement LS	14/08/2024	

REÇU EN PREFECTURE
le 19/12/2025
Application agréée E-legalite.com
99_DE-077-217703503-20251217-DELIB_640_2
